

MM-CL-09 - Retele apa si apa uzata: Sighețu Marmatiei, Vadu Izei, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti

BENEFICIAR: SC VITAL SA BAIA MARE

**ANTREPRENOR: ASOCIEREA EUSKADI SRL – AMI SA –
ORIZONT SIGHEȚU MARMĂȚIEI SRL**

SUBANTREPRENORI APROBAȚI:

- **SEBI MARC SRL SIGHEȚU MARMATIEI**
- **NORD TOP CONSTRUCT SRL SIGHEȚU MARMATIEI**
- **URS CONSTRUCT ALBA SRL**



CL-09

UAT SIGHETU MARMATIEI & UAT REMETI

SUBCONTRACTANT: SEBI MARC S.R.L.



Stadiul actual

Sighetu Marmatiei


Strada	Diametru	Total executat	Lungime cf. ctr.	Progres fizic la data prezentei (%)
Reabilitare retea apa str.Solovan	110	727	727	100%
Extindere retea apa str.Solovan	110	84	84	100%
Reabilitare retea canalizare str. Solovan	315	322	447	72%
Reabilitare retea canalizare str. Solovan	160	184	600	30.66%
Extindere de canalizare str.Faget	250	341	1463	23.30%
Extindere de canalizare str.Faget	160	54	840	6.42%
Extindere de canalizare str.Mocanitei	250	596	668	89.22%
Extindere de canalizare str.Mocanitei	160	264	390	67.70%

Remeti
Fara progres


Imagini representative Amplasament - Sighetu Marmatiei

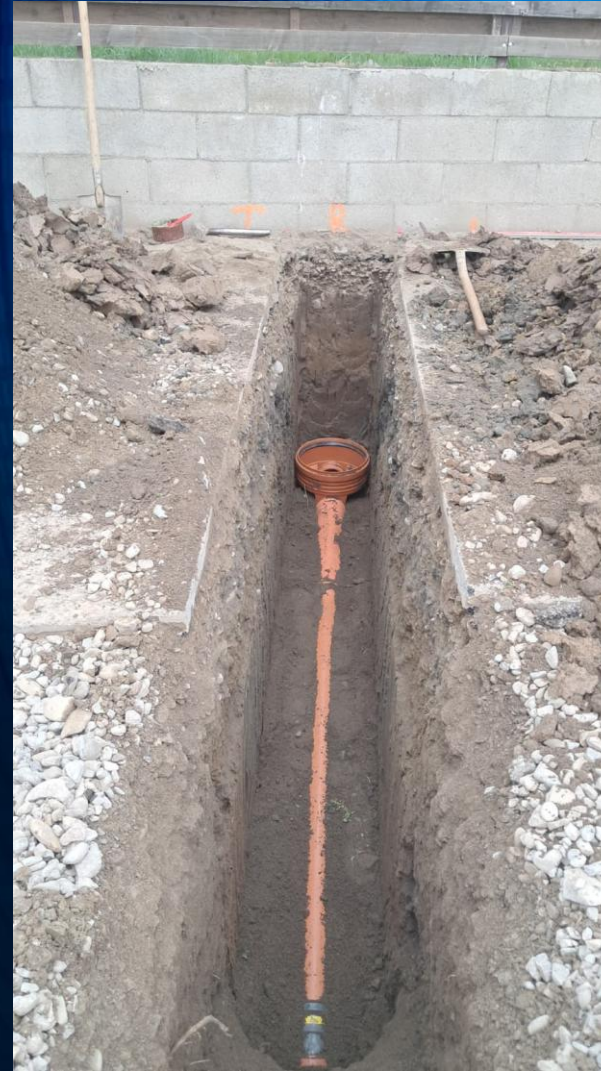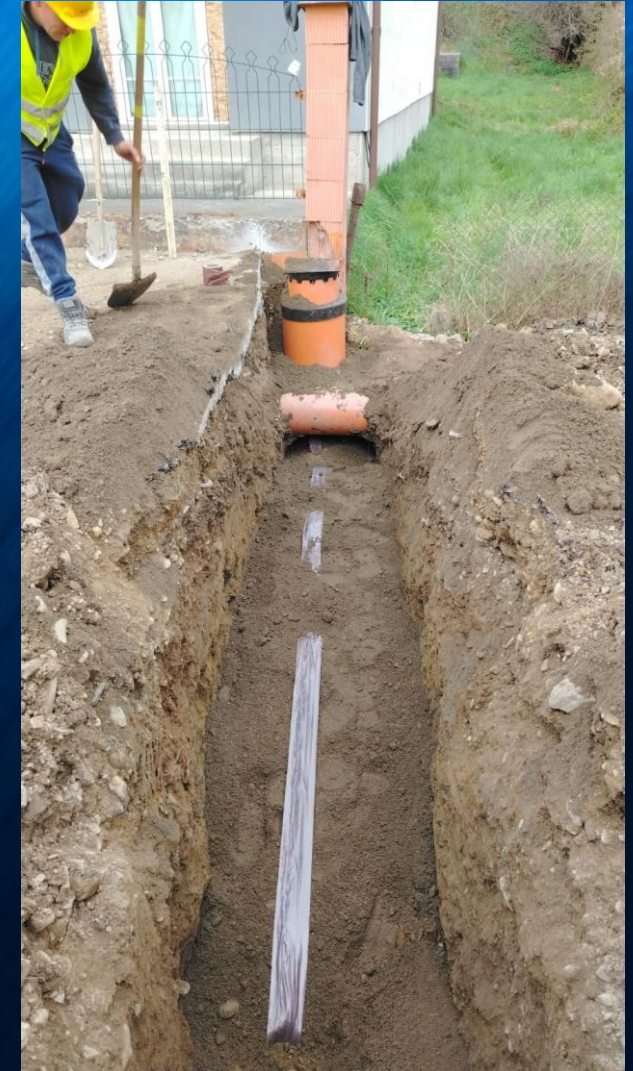

Imagini representative Amplasament - Sighetu Marmatiei

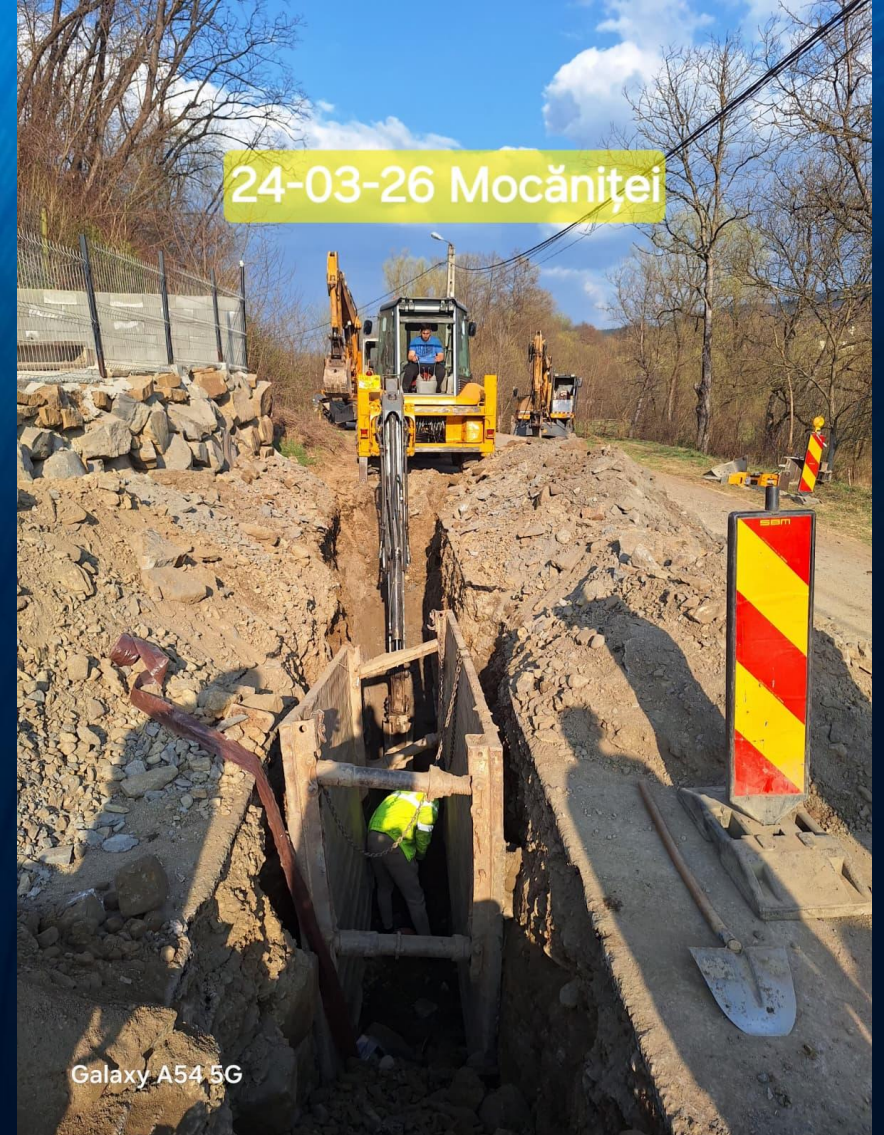

Scala 1:10.0

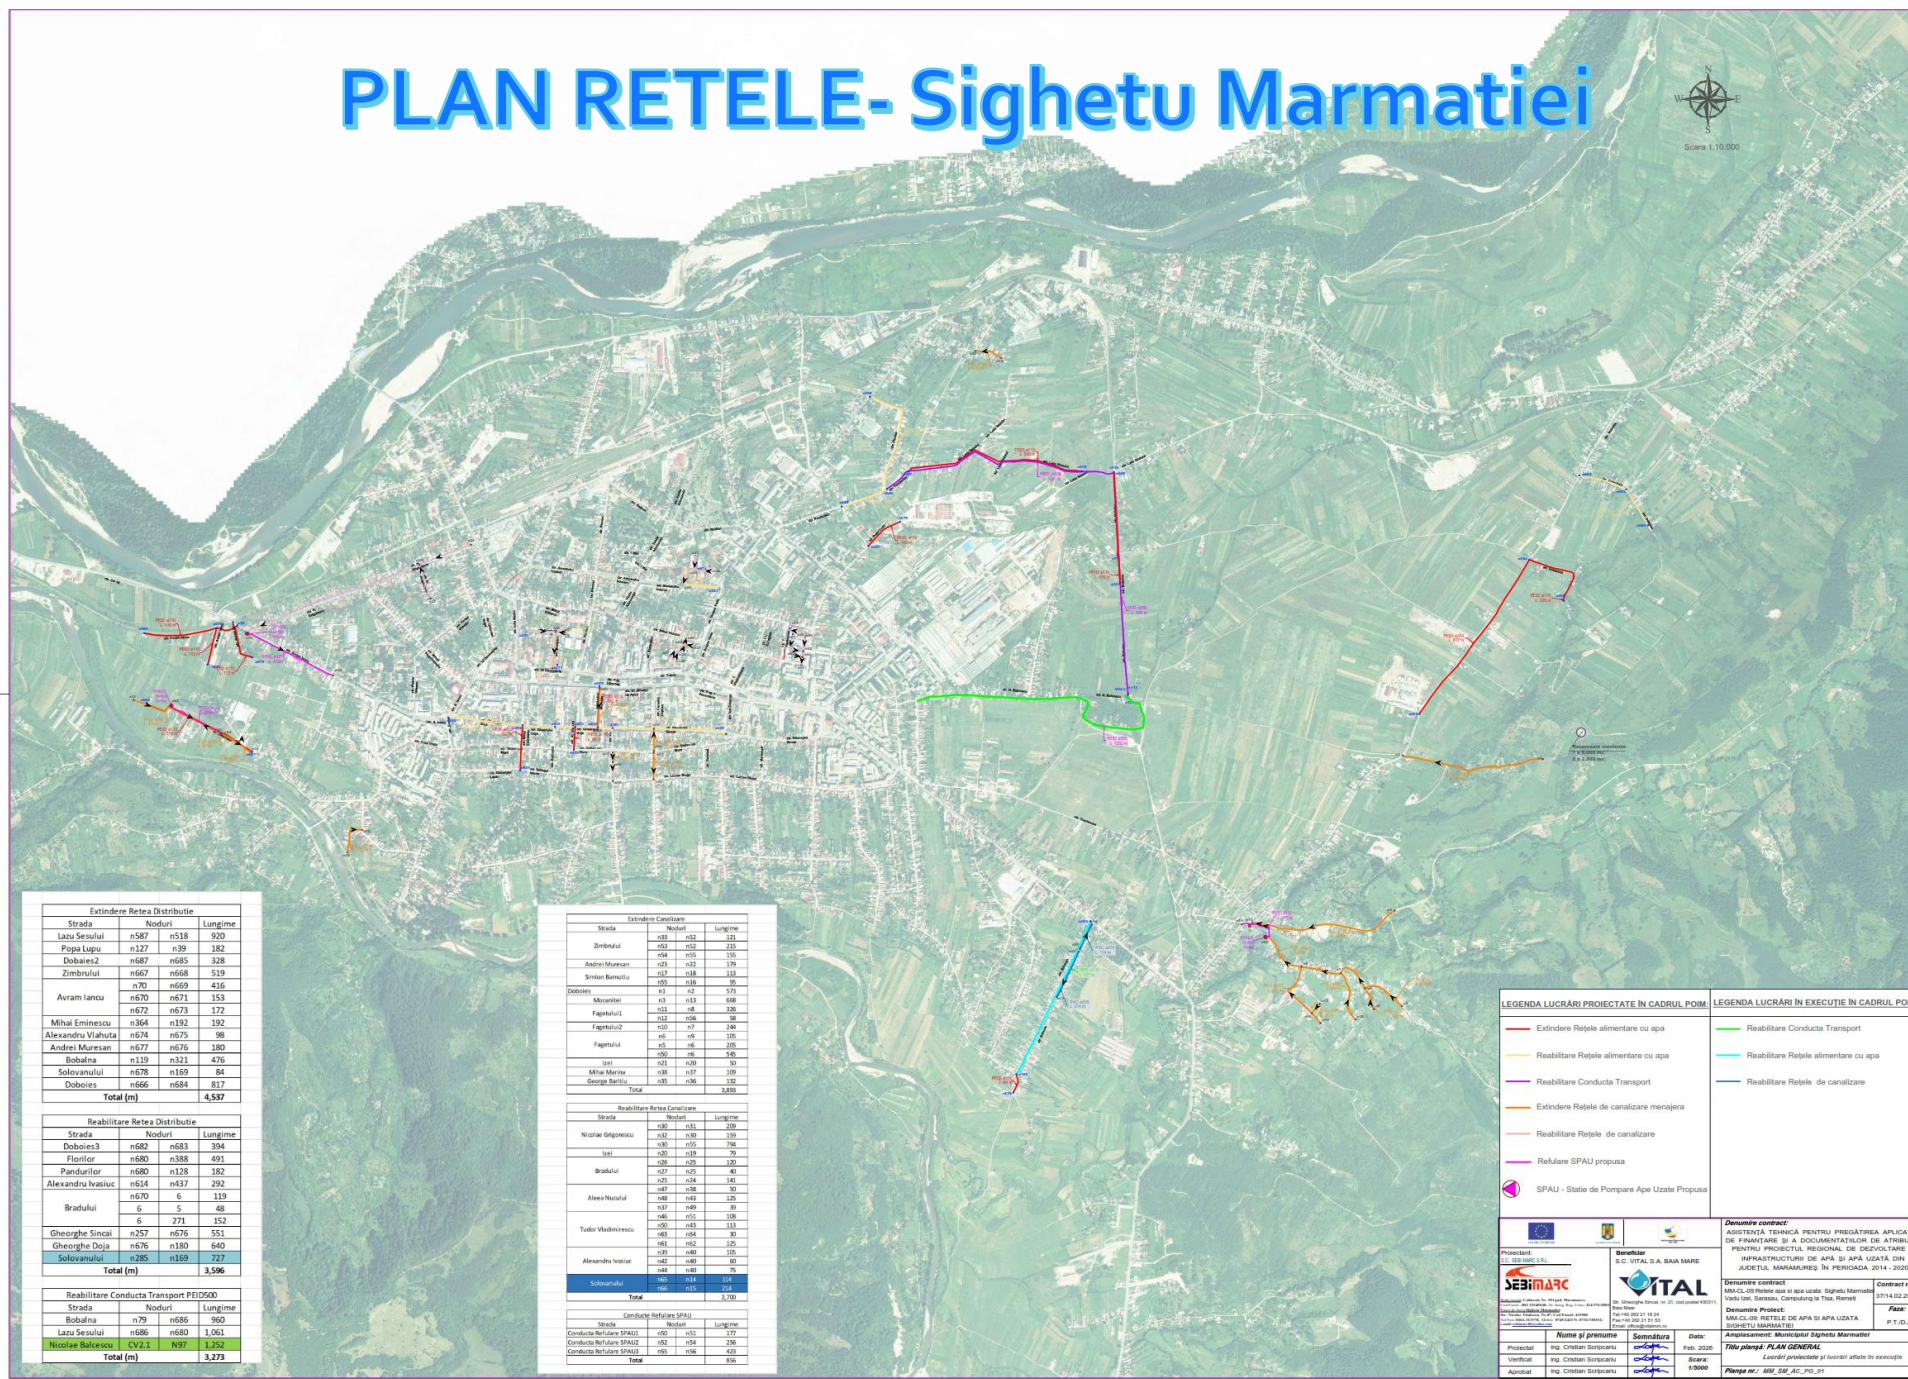




CL-09

UAT VADU IZEI & UAT SARASAU
SUBCONTRACTANT: NORD TOP CONSTRUCT S.R.L.

Scurt sumar asupra statusului actual:

- Execuția lucrărilor de apă și canalizare continuă pe **tronsoane restrânse**, în zone unde situația din teren și corelarea cu documentația existentă permit desfășurarea lucrărilor în condiții de predictibilitate tehnică și operațională.
- **Persistă un număr semnificativ de note de constatare** transmise către supervisor și rămase fără răspuns, aspect care blochează deschiderea unor noi fronturi de lucru sau continuarea celor existente. Divergențele principale vizează solicitarea ca antreprenorul să elaboreze documentații complete de reproiectare/adaptare pentru sectoarele afectate de neconformități și obstacole identificate în teren.
- **A fost demarată execuția căminelor de vane** pentru strazile aflate în lucru, urmând ca de săptămâna viitoare acestea să fie montate pe poziție și ulterior echipate, în vederea pregătirii etapelor de probe de presiune și punere în funcțiune.
- Începând de săptămâna viitoare vor fi inițiate procedurile de notificare și comunicare necesare pentru **demararea lucrărilor pe încă 5 străzi**
- Se desfășoară activități de **evaluare tehnică a rețelei existente amplasate pe DJ186**, în vederea stabilirii condițiilor reale de integrare și continuare a lucrărilor.
- Se analizează soluții optime pentru continuarea execuției într-un ritm sustenabil din punct de vedere financiar, cu **obiectivul limitării acumulării lucrărilor nedecontabile** și menținerii unui echilibru rezonabil al fluxurilor de numerar, în contextul în care mobilizarea și achizițiile aferente proiectului au fost inițiate încă de la
- sfârșitul anului precedent, iar presiunea financiară asociată implementării crește constant.

Imagini reprezentative

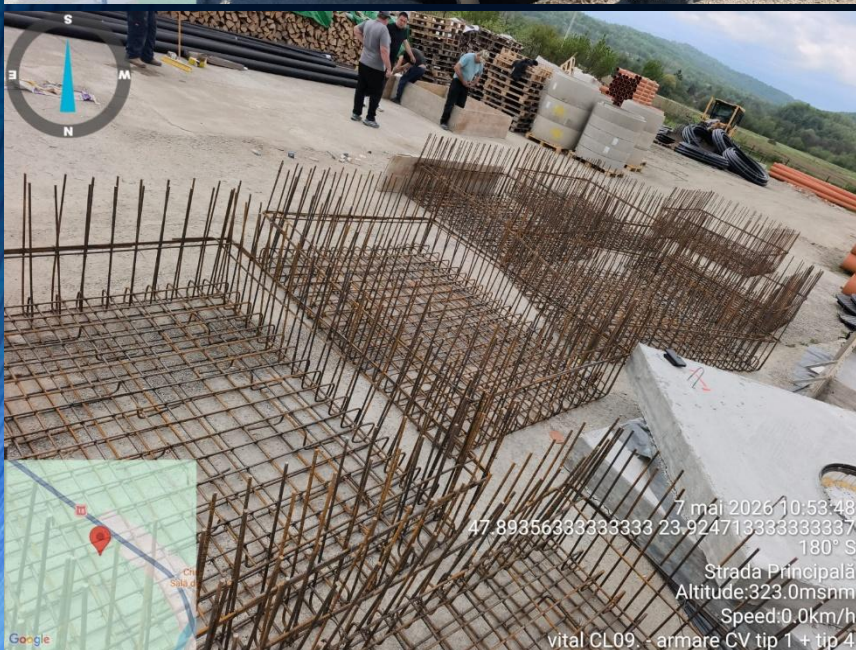

UAT Vadu Izei – la data 07.05.2026

Tronsoane in lucru: Str. Sugau (zona 1), Ulita Batrana, retea aductiune N147- SPAP1

Echipe mobilizate: 5

Retele canalizare executate: 1300 m

Retea distributie apa: 660 m

Retea transport: 700 m

Camine canalizare: 35 buc

Camine racord: 80 buc

Camine bransament: 72 buc

Stadiu actual

Vadu Izei

Strada	Diametru	Lungime cf. ctr.	Total executat	Progres fizic la data prezentei [%]
Extindere retea apa / Sugau	110	9393	24	0.3%
Extindere conducta transport	160	1589	320	20.1%
Extindere canalizare / Sugau	250	8989	30	0.3%
Extindere canalizare / Str. Batrana	250	1015	60	5.9%



CL-09

UAT CAMPULUNG LA TISA
SUBCONTRACTANT: URS CONSTRUCT

Stadiu Actual, Campulung la Tisa

Strada, RETEA CANALIZARE	Diametru	Lungime cf. ctr.	Total executat	Progres fizic la data prezentei [%]
Muncii Tr1	250	277	277	100%
Muncii Tr2	250	173	173	100%
Muncii Tr3	250	308	300	97%
Muncii Tr5	250	294	294	100%
Muncii Tr6	250	213	208	97%
Muncii Tr8	250	201	6	3%
1 mai Tr1	250	326	326	100%
1 mai Tr2	250	359	359	100%
1 mai Tr2_1	250	63	63	100%

Stadiu Actual, Campulung la Tisa

Strada,	Diametru	Lungime cf. ctr.	Total executat	Progres fizic la data prezentei [%]
Hodomb Tronson 1 (Garii Tr3)	250	200	108	52%
1 mai Tronson 2 apa	140	357	340	54%
1 mai Tronson 1 apa	140	326	160	49%
Conducta transport (Gospodarie de Apa – retea de distributie)	140	980	980	100%

Imagini reprezentative

