
Prezentare lunară nr. 13

CONTRACT DE LUCRĂRI · MM-CL-08

Rețea de apă și apă uzată: Coltău, Săcălășeni, Copalnic Mănăştur, Cicârlău, Seini, Satulung

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș

SEPTEMBRIE 2026

Beneficiar

VITAL S.A.

Antreprenor

Asocierea DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. – TOMI ALEX S.R.L.

Structura procedurii de raportare și a agendei ședințelor lunare.

Nr.	Punct analizat	Nr.	Punct analizat
1	Progres fizic și Program de Execuție	6	Situație financiară, plăți și cash-flow
2	Analiza execuției și revizuirea planurilor	7	SSM și protecția mediului
3	Resurse umane și echipamente	8	Modificări, variații și note justificative
4	Probleme de proiectare și inginerie	9	Revendicări (claims) și dispute
5	Materiale, produse și echipamente	10	Interacțiunea cu terții și avizele
		11	Suprapunerea cu alte lucrări

Cantități realizate în luna septembrie

PROGRES FIZIC CONTRACT

1,79%

progres septembrie

PROGRES TOTAL CONTRACT

19,98%

cumulat la final septembrie

VALOARE REALIZATĂ SEPT.

1.738.167,52 lei

conform progres financiar

CONDUCTE EXECUTATE

3.760 m

apă + canal + refulare

CONDUCTĂ APĂ

1.178 m

PEHD · luna septembrie

BRANȘAMENTE APĂ

370 m

conducte De 25 mm

CĂMINE VANE

17 buc.

structuri cămine

CĂMINE BRANȘAMENT

68 buc.

apă potabilă

COLECTOARE PVC

1.310 m

canalizare gravitațională

CONDUCTE RACORD

523 m

racorduri canal

CĂMINE VIZITARE

89 buc.

canalizare

CĂMINE RACORD

88 buc.

necarosabile

CONDUCTE REFULARE

1.272 m

Bârgău / refulare

PROGRES ANTERIOR

18,19%

până la 31.08.2026

PROGRES SEPTEMBRIE

1,79%

perioada raportată

PROGRES TOTAL

19,98%

cumulat la 30.09.2026

REST DE EXECUTAT

80,02%

din valoarea contractului

UAT	Progres anterior	Septembrie	Total	Valoare septembrie
Seini	25,44%	4,05%	29,49%	623.885,26 lei
Cicârlău	29,15%	1,89%	31,04%	707.780,22 lei
Coltău	3,40%	1,00%	4,40%	248.746,99 lei
Săcălășeni	21,24%	1,79%	23,04%	157.755,05 lei
Satulung	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 lei

Situație cantitativă: cantități proiectate, realizate în septembrie și realizate total.

Activitate	Cantitate proiect	Septembrie	Total realizat	% realizat
Conductă apă (m)	47.626	1.178	20.693	43,45%
Conducte branșamente apă (m)	22.077	370	7.208	32,65%
Cămine vane (buc.)	253	17	98	38,74%
Cămine branșament (buc.)	2.380	68	888	37,31%
Hidranți (buc.)	120	4	35	29,17%
Colectoare canalizare PVC (m)	44.891	1.310	18.843	41,98%
Conducte racord canalizare (m)	20.316	523	7.547	37,15%
Cămine vizitare (buc.)	1.304	89	615	47,16%
Cămine racord (buc.)	2.537	88	931	36,70%
Conducte refulare (m)	8.182	1.272	3.890	47,54%


Legenda

-  Tronson executat
-  Tronson neexecutat
-  Tronson planificat pentru execuție în perioada imediat următoare
-  Tronson afectat de impedimente / imposibil de executat la această dată




LEGENDĂ STADIU TRONSOANE

- Tronson executat
- Tronson neexecutat
- Tronson planificat pentru execuție în perioada imediat următoare
- Tronson afectat de impedimente / imposibil de executat la această dată

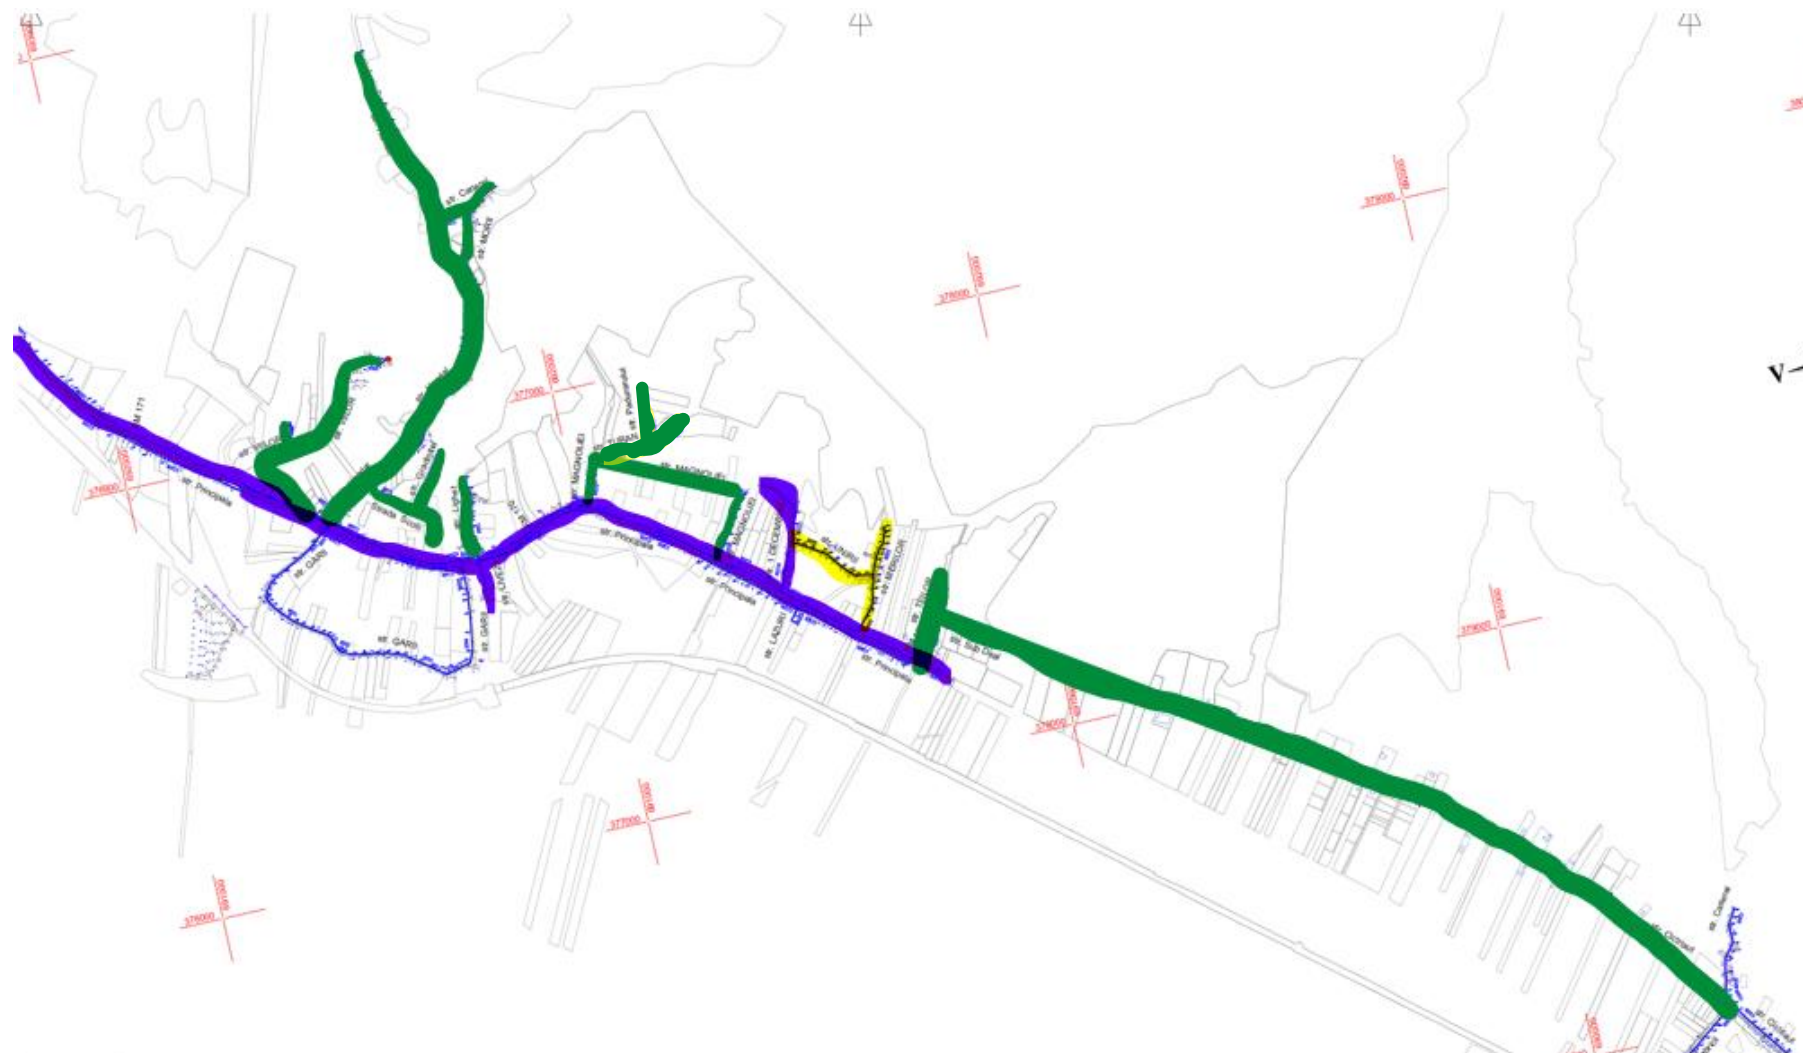



LEGENDĂ STADIU TRONSOANE


- Tronson executat
- Tronson neexecutat
- Tronson planificat pentru execuție în perioada imediat următoare
- Tronson afectat de impedimente / imposibil de executat la această dată

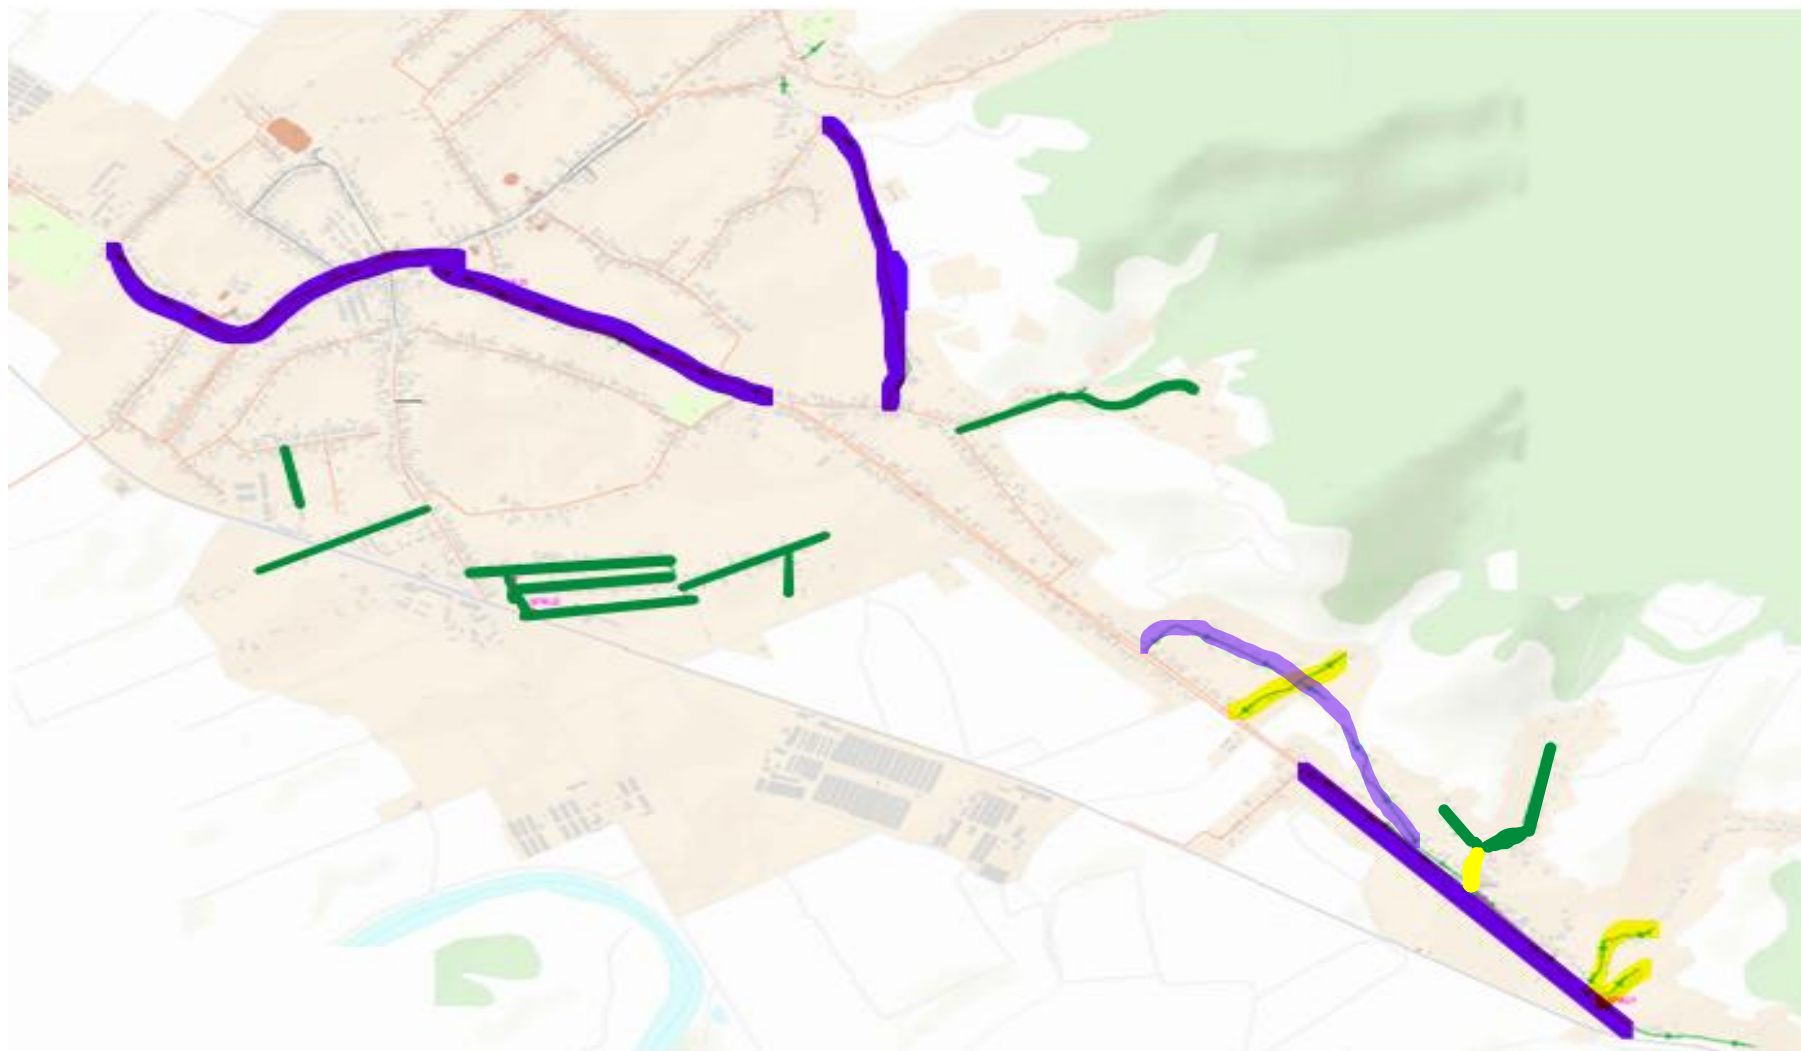

LEGENDĂ STADIU TRONSOANE


- Tronson executat
- Tronson neexecutat
- Tronson planificat pentru execuție în perioada imediat următoare
- Tronson afectat de impedimente / imposibil de executat la această dată

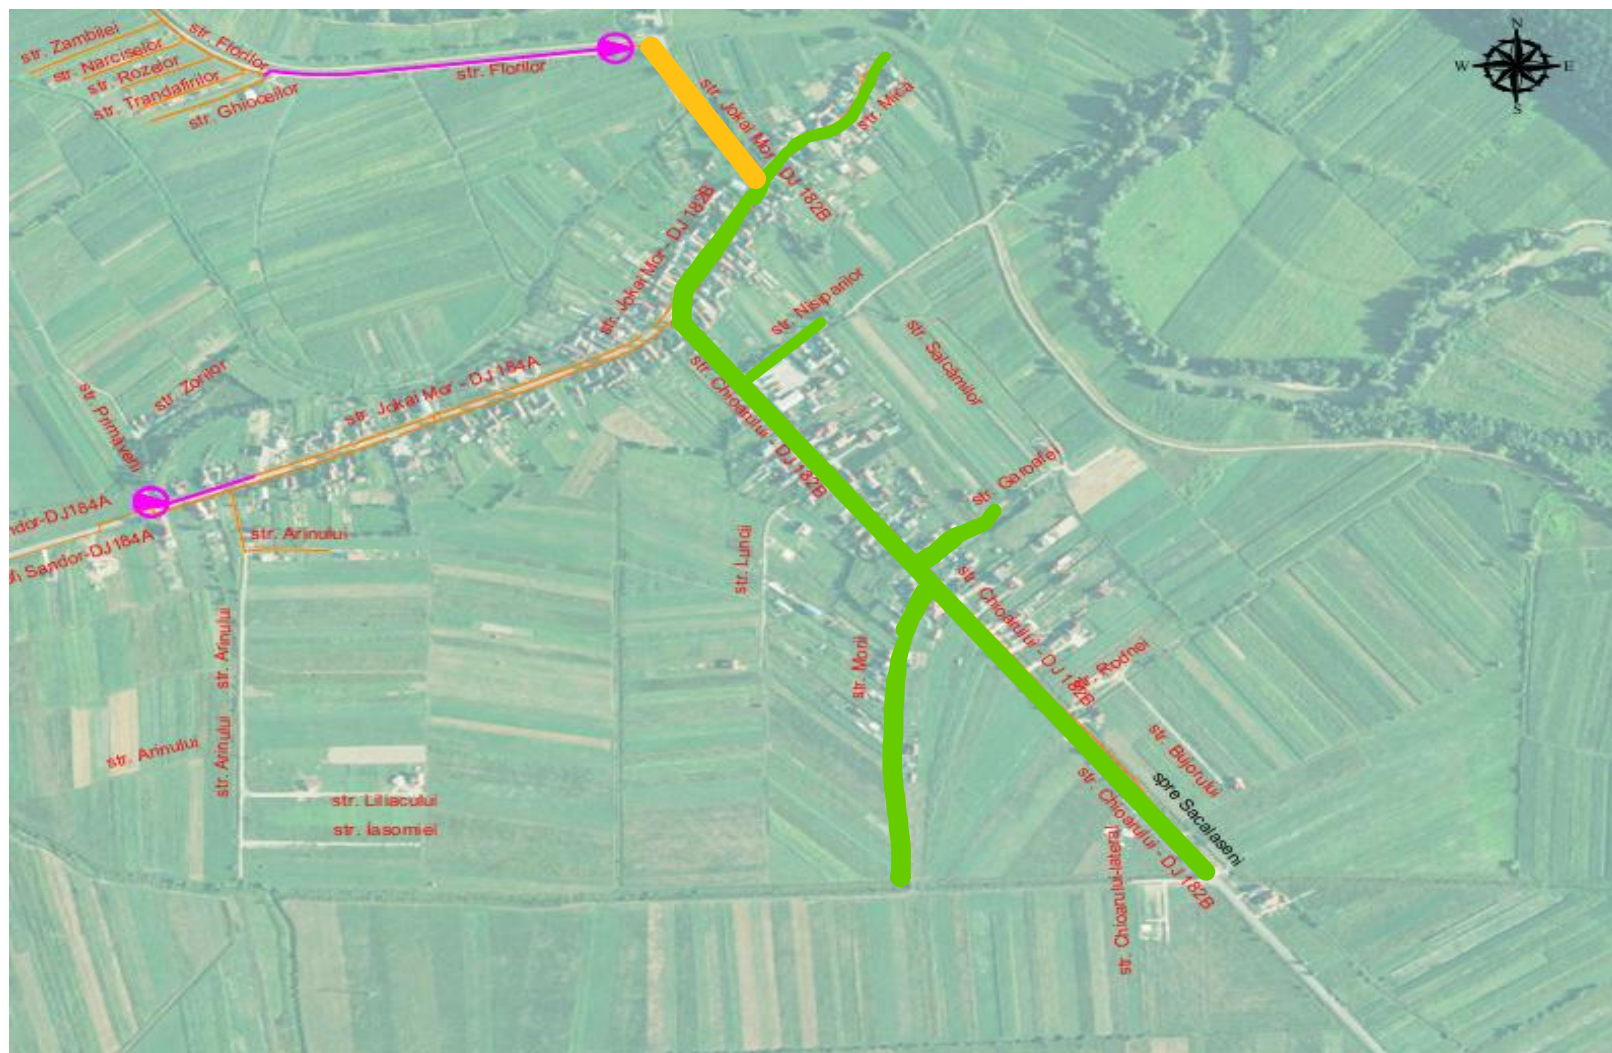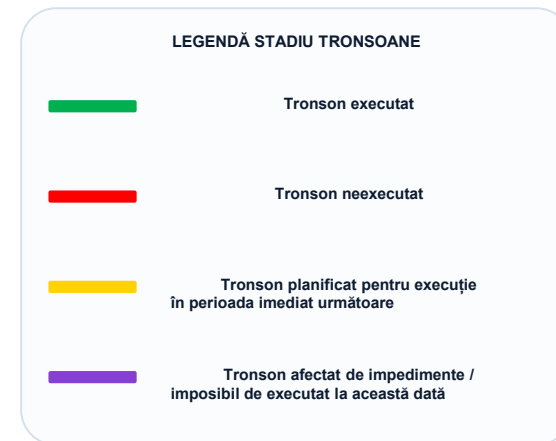

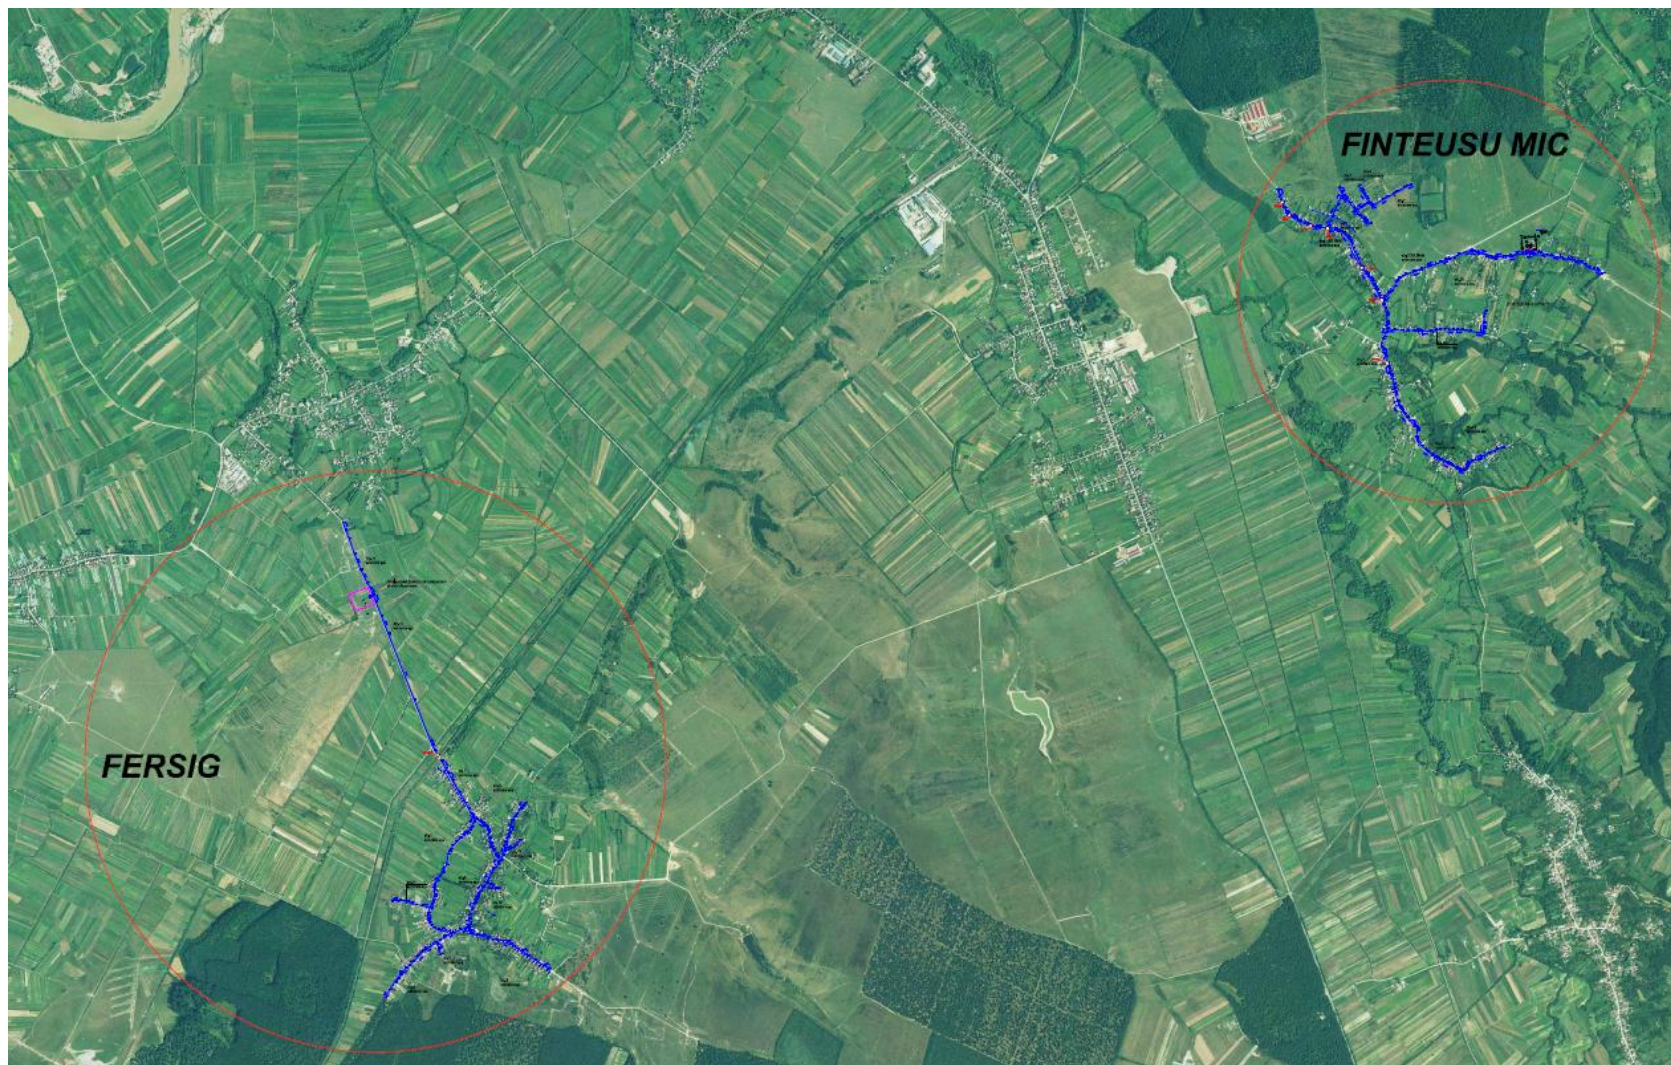


LEGENDĂ STADIU TRONSOANE

- Tronson executat
- Tronson neexecutat
- Tronson planificat pentru execuție în perioada imediat următoare
- Tronson afectat de impedimente / imposibil de executat la această dată

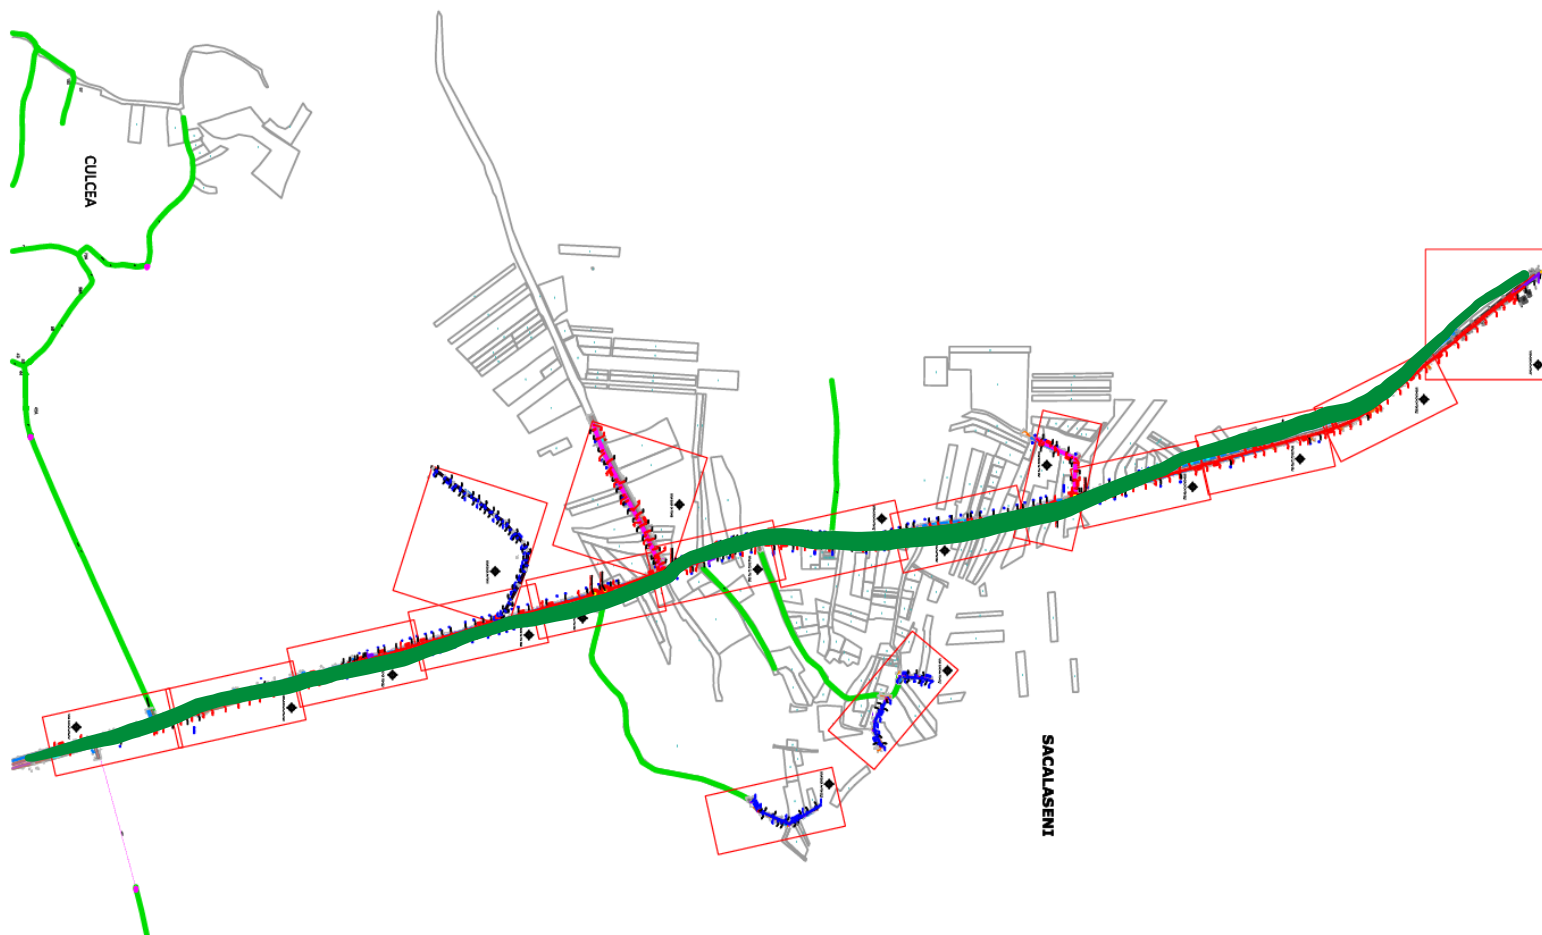

LEGENDĂ STADIU TRONSOANE




- Tronson executat
- Tronson neexecutat
- Tronson planificat pentru execuție în perioada imediat următoare
- Tronson afectat de impedimente / imposibil de executat la această dată

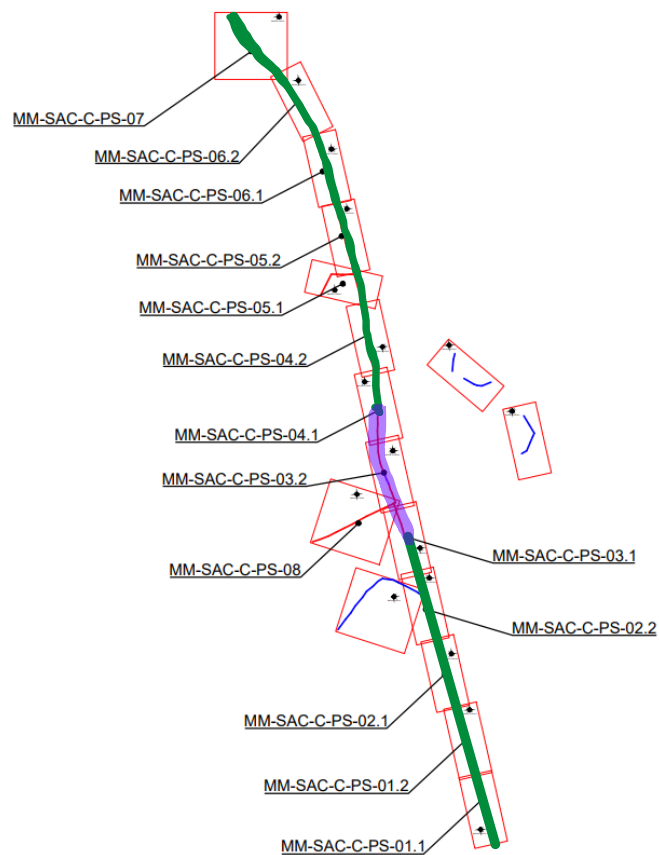


LEGENDĂ STADIU TRONSOANE

- Tronson executat**
- Tronson neexecutat**
- Tronson planificat pentru execuție în perioada imediat următoare**
- Tronson afectat de impedimente / imposibil de executat la această dată**

Trasee principale și zone de lucru

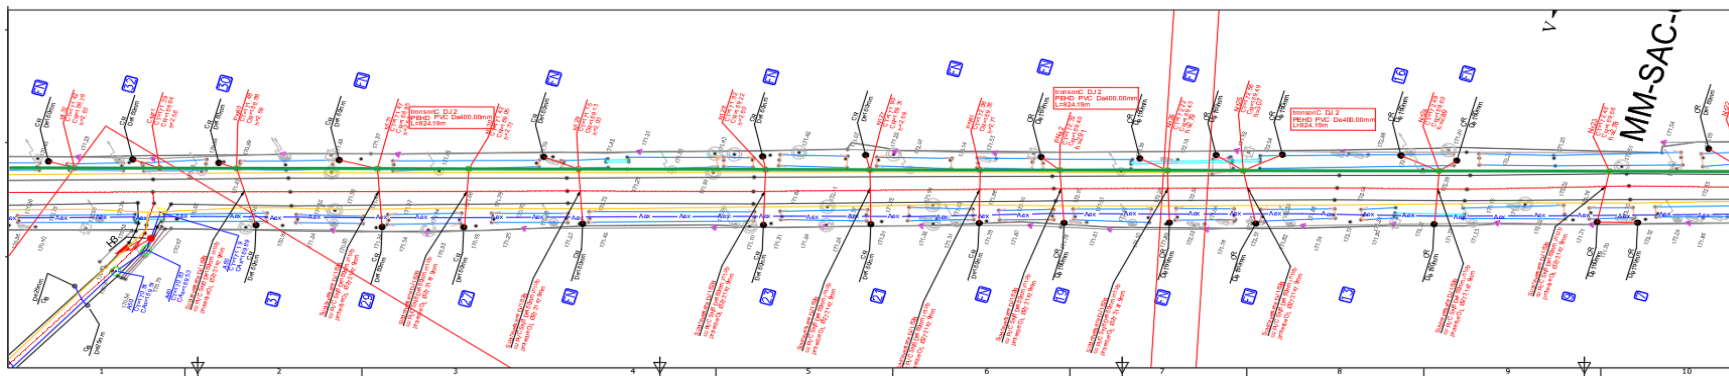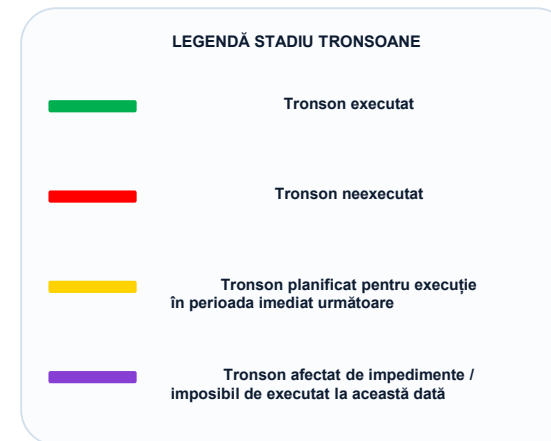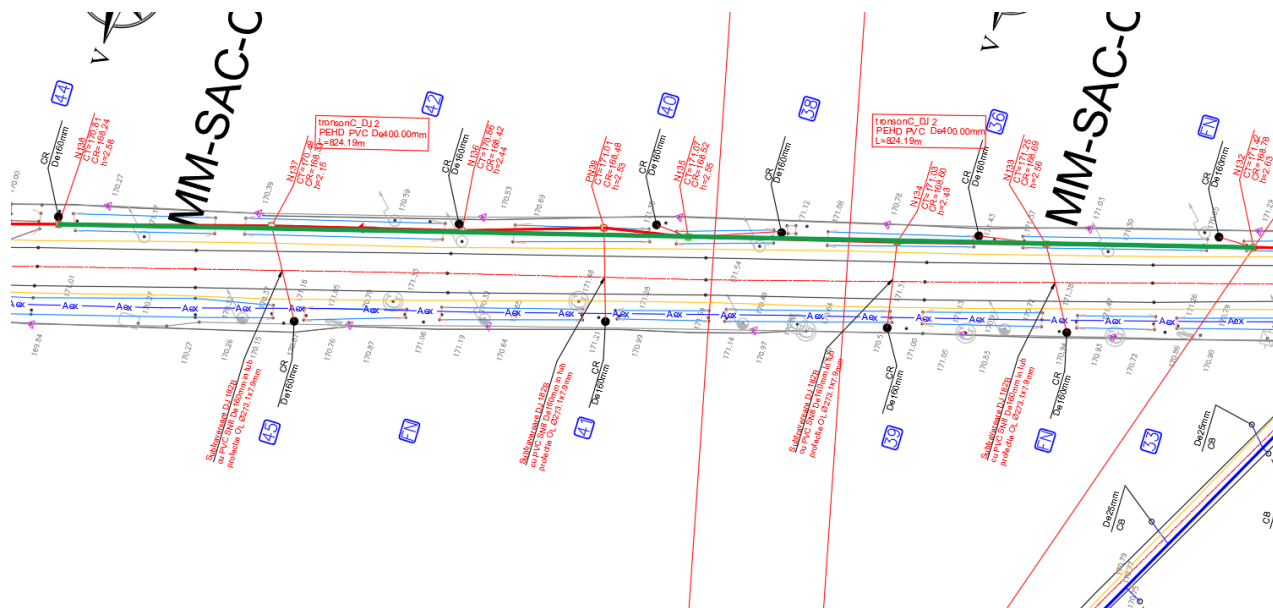

Trasee principale și zone de lucru

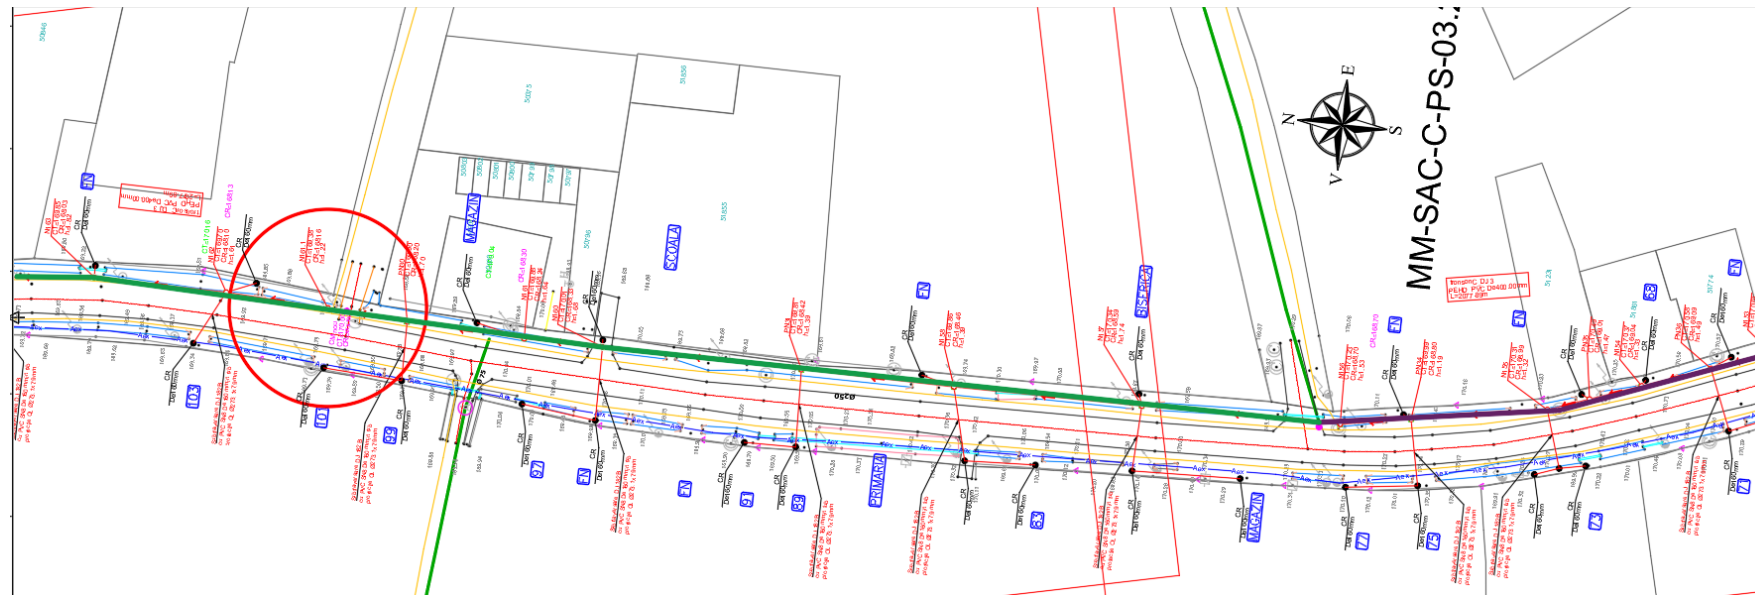

LEGENDĂ STADIU TRONSOANE

- Tronson executat
- Tronson neexecutat
- Tronson planificat pentru execuție în perioada imediat următoare
- Tronson afectat de impedimente / imposibil de executat la această dată

Cantități realizate în luna septembrie

Stradă / sector	Tip lucrare raportată în septembrie	Cantitate
Str. Someș – apă	PEHD DN110 · branșamente · cămine branșament · hidranți	160 m · 120 m · 28 buc. · 4 buc.
Str. Someș – canal	Conducte de racord DN160 · cămine racord	83 m · 29 buc.
Str. Valea Satului – canal	PVC SN8 DN250 · cămine vizitare · subtraversări	747 m · 24 buc. · 9 buc.

Documentare foto – refaceri provizorii / aducerea străzii la stare circulabilă




Refacere provizorie



Refacere provizorie

Pozare conductă canalizare, cămine și refaceri provizorii

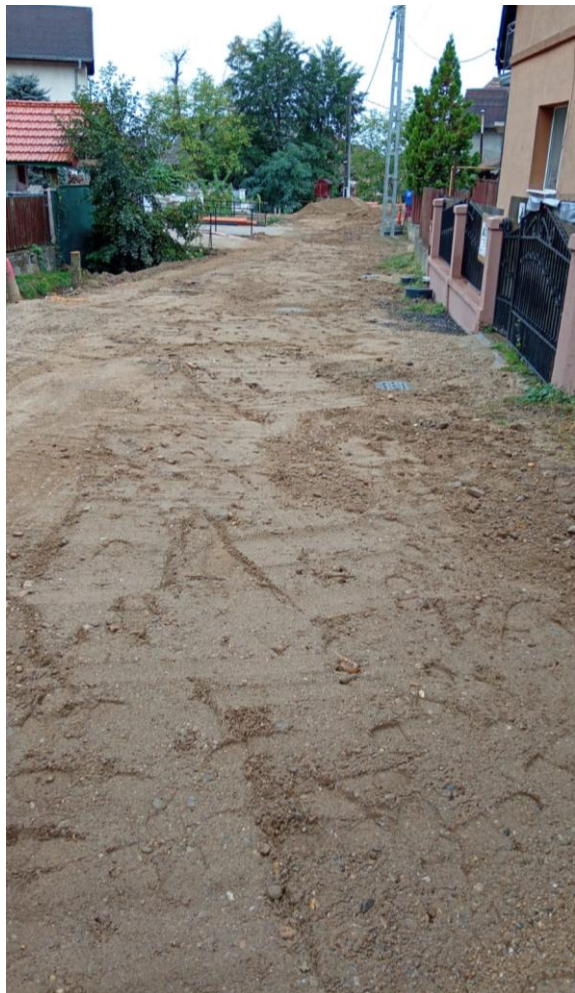

Refacere provizorie



Refacere provizorie



Pozare conductă



Pozare conductă

Cantități realizate în luna septembrie

Stradă / sector	Tip lucrare raportată în septembrie	Cantitate
Ilba – Str. Lighet	PEHD DN75 · branșamente · cămine branșament / vane	179 m · 90 m · 13 buc. / 2 buc.
Ilba – Str. Magnoliei	PEHD · cămin vane	152 m · 1 buc.
Ilba – Str. Pădurarului	PEHD · cămine vane	117 m · 2 buc.
Ilba – Str. Școlii	PEHD · cămine vane	130 m · 2 buc.
Bârgău – Refulare SP1	Conductă refulare PEHD DN200 · cămine vane	1.272 m · 4 buc.
Cicârlău – Str. Primăverii	Branșamente/racorduri canal · cămine	50 m / 60 m · 2 vane · 6 racord
Cicârlău – Str. Negruți	Branșamente apă · racorduri canal	80 m · 70 m · 17 racorduri

Pozare conductă PEHD



Magnoliei – conductă PEHD



Magnoliei – pozare conductă



Pădurarului – conductă PEHD



Pădurarului – pozare conductă

Camine de branșament și refaceri provizorii



Refacere provizorie



Montaj cămin



Montaj element cămin



Front de lucru

Conductă de refulare



Traseu refulare



Compactare



Pozare conductă



Săpătură



Pat de pozare




Pozare conductă

Refaceri provizorii și semnalizare temporară



Refacere acostament

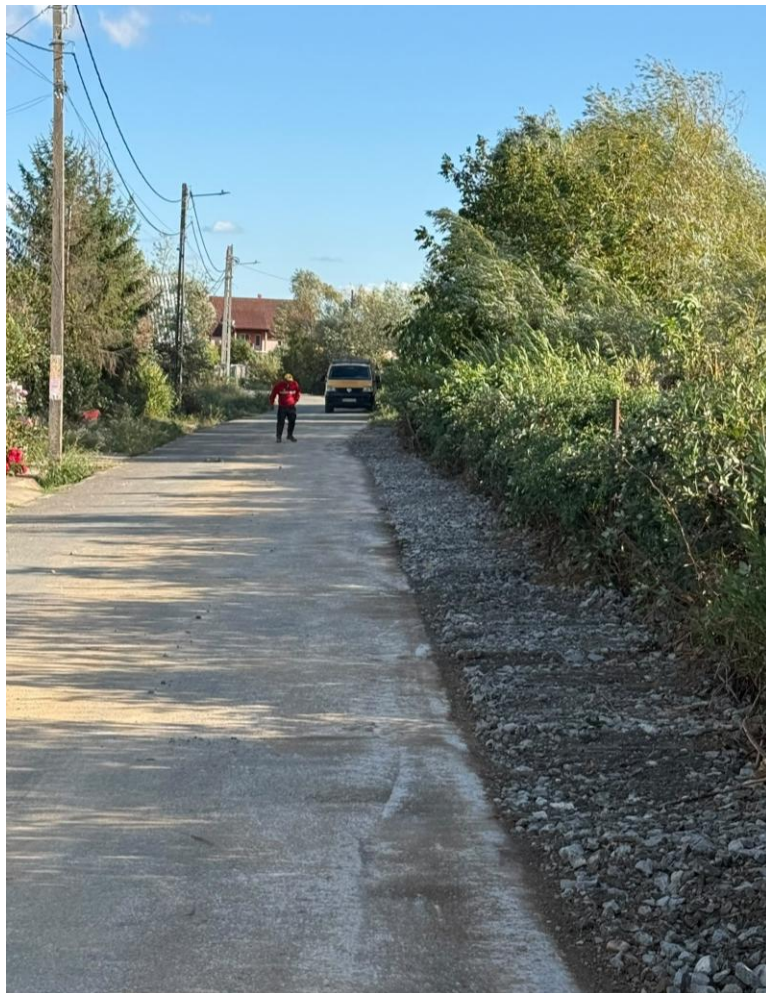

Refacere acostament



Semnalizare temporară

Cantități realizate în luna septembrie

Stradă / sector	Tip lucrare raportată în septembrie	Cantitate
Cătălina – Str. Chioarului DJ182B	PVC SN8 DN400 · racorduri DN160 · cămine PEHD DN400	318 m · 270 m · 11 vizitare · 27 racord 100 m
Săcălășeni – Str. Unirii DJ182B SPAU1	PVC SN8 DN400 · cămine vizitare / racord	140 m · 4 buc. / 5 buc.
Săcălășeni – Str. Unirii DJ182B SPAU2	PVC SN8 DN400 · racorduri DN160 · cămine racord	55 m · 40 m · 4 buc.



Refacere/compactare Săcălășeni Tronson 1



Conexiune foraj dirijat- PVC



Refacere platforma drum



Pozare conducta

Structură de raportare propusă pentru luna septembrie

Categorie	Date de prezentat în ședință
Personal de execuție	4 echipe Săcălășeni – Cătălina 3 echipe Ilba, Cicârlău, Bârgău 1 echipă Seini/Săbișa
Utilaje active	6 excavatoare, 4 buldoexcavatoare, 8 compactoare, 8 autobasculante, 1 instalație foraj, 4 dumper
Utilaje în conservare / indisponibile	
Observații	

Str. Principală Bârgău







Categorie	Stadiu / informații de raportat
Materiale utilizate în luna septembrie	Conducte PEHD/PVC, cămine, racorduri, elemente prefabricate, agregate/refaceri
Aprovizionare pentru perioada următoare	În cursul lunii următoare se va continua aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor programate, aprovizionarea fiind realizată în corelare cu ritmul de execuție a lucrărilor. Materialele care se vor aproviziona, vor fii conducte pentru rețelele de apă și canalizare, cămine de vizitare, cămine de vane, cămine de racord pentru canalizare, cămine de branșament pentru apă, nisip și materiale pentru lucrările de refaceri.

VALOARE CONTRACT

97.182.829,18 lei

valoare ofertă

VALOARE SEPTEMBRIE

1.738.167,52 lei

realizată în perioada raportată

VALOARE CUMULATĂ

19.418.349,67 lei

realizat total

PROGRES FINANCIAR TOTAL

19,98%

raportat la valoarea contractului

UAT	Valoare realizată septembrie
Seini	623.885,26 lei
Cicârlău	707.780,22 lei
Coltău	248.746,99 lei
Săcălășeni	157.755,05 lei
Satulung	0,00 lei

Tema	Situație de raportat
SSM	Nu este cazul
Mediu	Adresa RCE-MM-CL08-076 din 22.09.2026 – în curs de soluționare
Neconformități	Nu este cazul
Măsuri corective	Nu este cazul

Temă	Situație / documente
Dispoziții de șantier	Număr, obiect și stadiu de aprobare: Dispoziție de șantier nr.10 – UAT Cicârlău, UAT Seini – în aprobare la beneficiar
Variații	Lucrări suplimentare / renunțări și stadiu: Nu este cazul

Temă	Situație / documente
Revendicări	Obiect, solicitant și stadiu de analiză:Nu este cazul
Notificări	Număr, dată și termene contractuale:
Documente justificative	Documente de cost și de durată:
Dispute	Situație și acțiuni necesare:

Temă	Situație / documente
Terți și instituții	Entități implicate și corespondență:
Avize / acorduri	Valabilitate, condiții și stadiu: Acord prealabil și autorizație acces la drum DN1C – în lucru la proiectant pentru UAT Cicârlău
Predări de amplasament	Amplasament, proces-verbal și observații: Proces verbal predare-primire nr.1 din 24.09 Tronson N65-SPAU1 – către Open Trans SRL Proces verbal predare-primire nr.13 DN1C Seini-Cicârlău Proces verbal predare-primire nr.14 Cicârlău-Ilba
Deținători de utilități	Rețele existente, intervenții și coordonare: nu au participat la predarea amplasamentului reprezentanți de la SDN Baia Mare și Electrica S.A.

Temă	Situație / documente
Lucrări / investiții suprapuse	Denumire, entitate implicată și stadiu: Suprapunere cu lucrările de reabilitare drum județean DJ182B – Open Trans
Amplasamente	UAT, stradă și tronson afectat: Suprapunere pe toate tronsoanele DJ182B Săcălășeni și Cătălina - A fost predat amplasamentul pentru tronsonul SPAU 1 Săcălășeni către constructorul drumului în data de 24.09.2026.

Obiect	Lucrare	Cantitate / caracteristici
SE 1.1	Extindere conducte de transport apă potabilă	L = 2.259 m · PEID PE100 PN10 · De 160 mm
SE 1.2	Extindere rețea distribuție apă potabilă	L = 5.074 m · PEID PE100 PN10 · De 110 mm
SE 1.3	Stație de pompare apă potabilă	2A+1R · Q = 10 l/s/pompă · Hp = 30 mCA
SE 2.1	Extindere rețea canalizare	L = 12.631 m · PVC SN8 · De 250 mm
SE 2.2	Reabilitare rețea canalizare	L = 862 m · PVC SN8 · De 400 mm
SE 2.3	Stații de pompare ape uzate SPAU 1–3	Q = 5 l/s · Hp = 15 m · conducte refulare De 110 mm

Obiect	Lucrare	Cantitate / caracteristici
CIC 1.1	Extindere rețea distribuție apă – Ilba	De 75/110/160 mm · L total = 11.147 m
CIC 1.2	Extindere rețea distribuție apă – Bârgău	De 75/110 mm · L total = 2.014 m
CIC 1.3	Extindere rețea distribuție apă – Cicârlău	De 75/110/140/160 mm · L total = 13.014 m
CIC 1.4	Stație pompare apă potabilă Cicârlău	1A+1R · Q = 6,8 l/s · H = 35 m
CIC 2.1	Canalizare menajeră Cicârlău	L = 10.447 m · PVC SN8 · De 250 mm
CIC 2.2	Canalizare menajeră Bârgău	L = 2.144 m · PVC SN8 · De 250 mm
CIC 2.3–2.6	Conducte refulare și stații pompare ape uzate	Refulare De 110/200 mm · SPAU Cicârlău și Bârgău

Obiect	Lucrare	Cantitate / caracteristici
CT 1	Extindere rețea alimentare apă – Coltău	L = 894 m · PEID PE100 PN10 · De 110 mm
CT 2	Extindere rețea alimentare apă – Cătălina	L = 1.498 m · PEID PE100 PN10 · De 110 mm
CT 3–4	Reabilitare rețele canalizare menajeră	Coltău: 1.814 m · Cătălina: 2.023 m
CT 5–6	Extindere rețele canalizare menajeră	Coltău: 7.321 m · Cătălina: 3.384 m
CT 7–10	Stații pompare ape uzate și conducte refulare	SPAU-uri și refulări PEID · De 90–280 mm

Obiect	Lucrare	Cantitate / caracteristici
SAC 1.1	Extindere rețea distribuție apă – Săcălășeni	L = 887 m · PEID PE100 PN10 · De 110 mm
SAC 1.2	Monitorizare și control hidraulic	1 buc.
SAC 2.1	Extindere rețea colectare apă uzată	L = 598 m · PVC SN8 · De 250 mm
SAC 2.2	Reabilitare colector principal apă uzată	L = 3.706 m · PVC SN8 · De 400 mm
SAC 2.3–2.4	Stații pompare și conducte refulare	3 stații · L refulare = 145 m · PEID De 180 mm
SL 1.1–1.5	Gospodărie apă, conducte transport și distribuție	Rezervor 150 mc · rețele Fersig / Finteușu Mic
