

**“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
in judetul Maramures”**


CONTRACT DE LUCRARI - MM-CL-06

“RETELE DE APA SI APA UZATA BAIA MARE”

Beneficiar: **VITAL S.A**

Antreprenor: **Asocierea DIMEX-2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL**

Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L

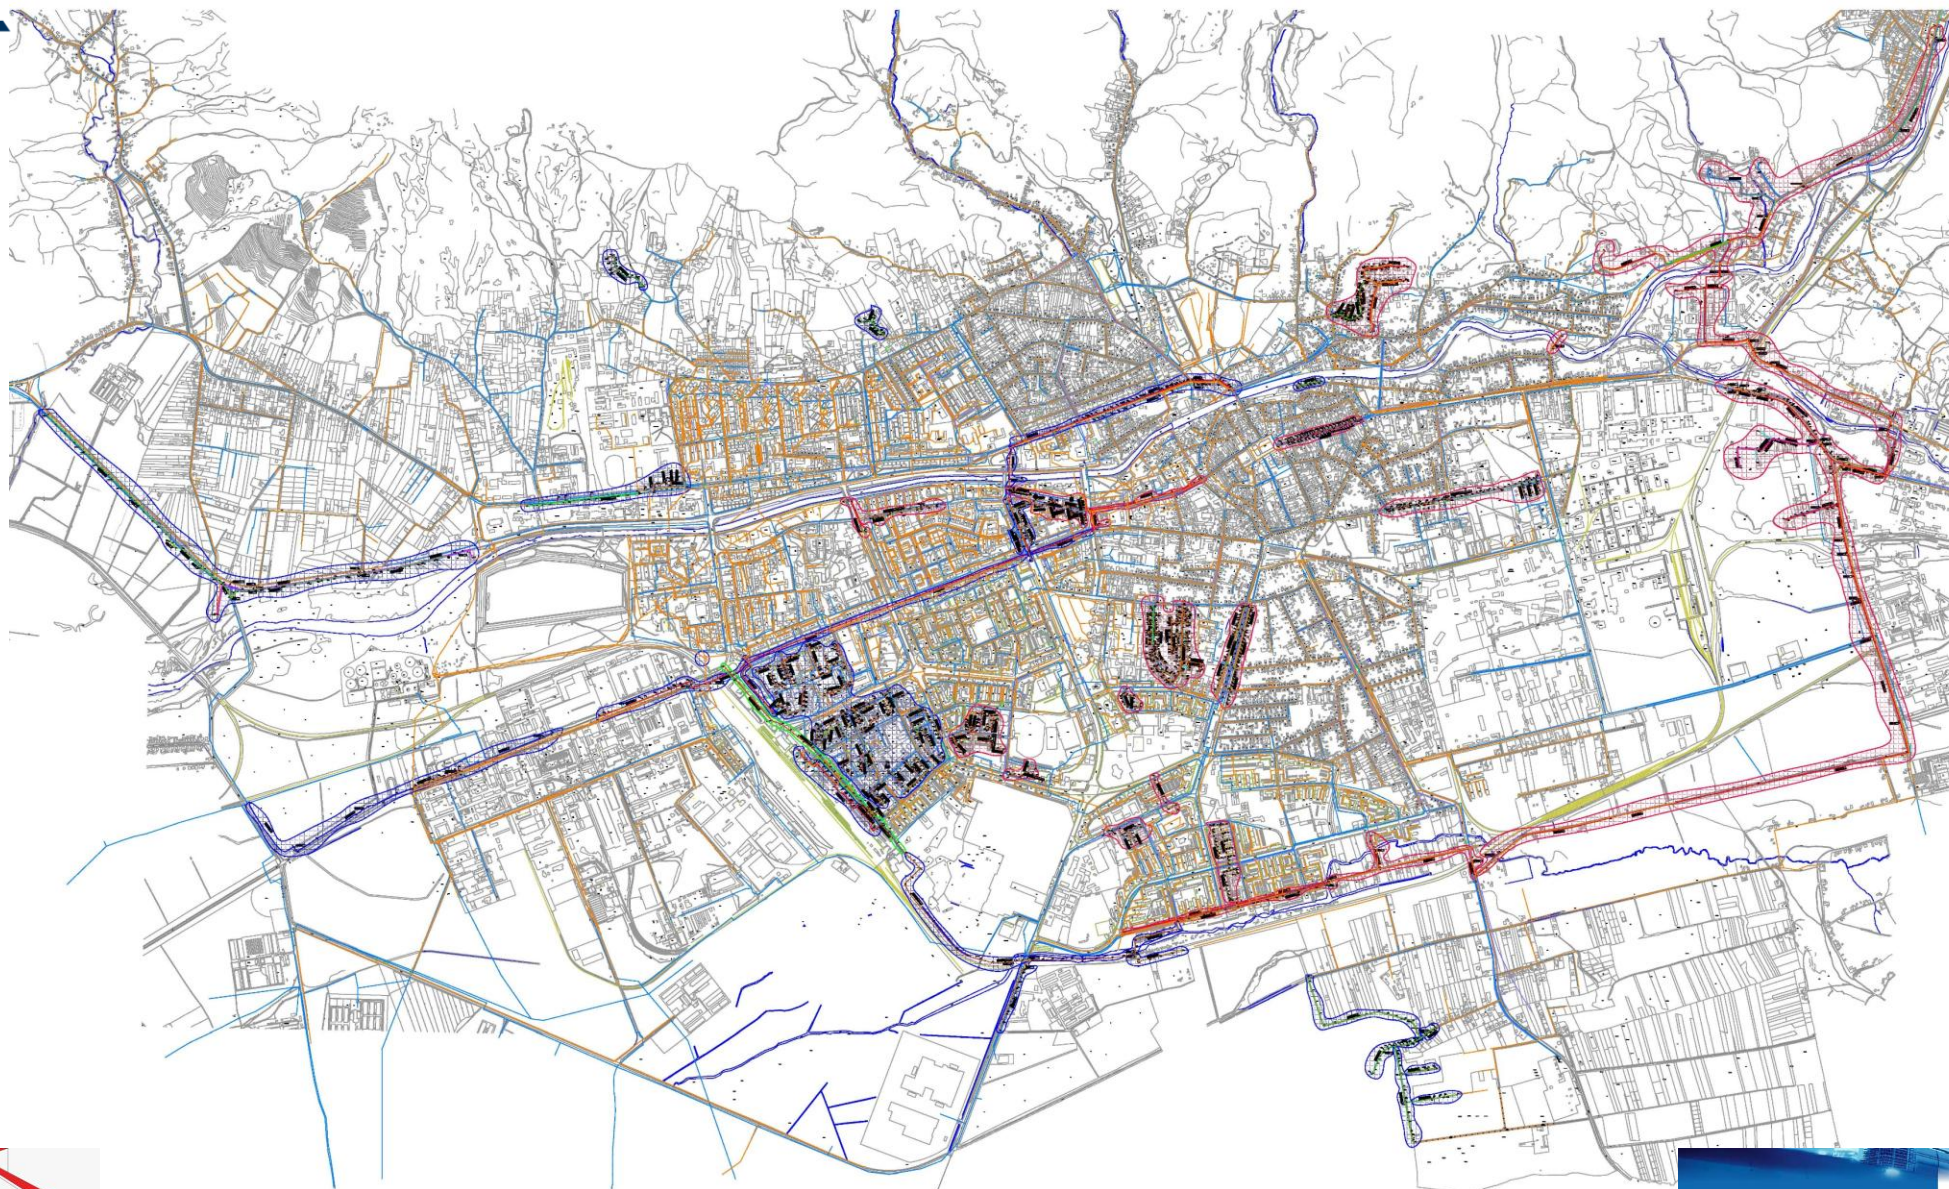

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	L = 1324 m, PEID PE100 PN10; De 1000 mm
Sub-obiect 1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	L = 13926 m, PEID PE100 PN10; De 315 mm ÷ 800 mm
Sub-obiect 1.3	Reabilitare retelei de distributie apa potabila	L = 4994 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm ÷ 400 mm
Sub-obiect 1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 1644 m, PEID PE100 PN10; De 400 mm
Sub-obiect 1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila	L = 173 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.6	Statie de pompare apa potabila	Grup pompare (2A+1R), Qgr = 10 l/s, Hp=30 m, P= 9,0 kW; Dimensiuni constructie: 5,5 x 2,4 x 2,7 m
OBIECT 2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea de canalizare	L = 5531 m, PVC SN8; De 250 mm; PAFSIN SN10000 De 500 mm
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea de canalizare	L = 16995 m, PVC SN8; De 250 mm ÷ De 400 mm; PAFSIN SN10000 De 300 mm ÷ De 800 mm
Sub-obiect 2.3	Reabilitare colector de canalizare	L = 3634 m, PAFSIN SN10000 De 300 mm, ovoid De 600/900 mm, De 760/1140 mm; clopot De 2100/1575 mm
Sub-obiect 2.4	Statie de pompare apa uzata SPAU1	1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 10,0 m, P = 1,65 kW, Lref = 490 m, PEID, De 110 mm
	Statie de pompare apa uzata SPAU2	3A+1R, Q = 21.0 l/s, Hp = 14,0 m, P = 9,0 kW, Lref = 1350 m, PEID, De 280 mm
Sub-obiect 2.5	Reabilitare Deversor	Dimensiuni: L= 20 m, l= 7 m, H= 5 m

PVPPA - 11.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
1.Str. Victoriei	MM-BM-A2-C-11	MM-BM-C1-C-03	17.03.2025 - 15.07.2025		Construrom
2.Str. Unirii	MM-BM-A2-C-12	MM-BM-C1-C-05			
3.Str. Grigore Ureche	MM-BM-A2-C-26	MM-BM-C1-C-30	17.03.2025 - 09.05.2025	09.05.2025 - 06.06.2025	Construrom
4.Str. Fructelor		MM-BM-C1-C-29	12.05.2025 - 27.06.2025		
5.Str. Colonia Topitorilor	MM-BM-A2-C-01		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
6.Str. Cerbului	MM-BM-A2-C-20 MM-BM-A2-C-21		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
7.Str. Privighetorii si Dealul Crucii	MM-BM-A2-C-25	MM-BM-C1-C25	17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
8.Str. Barbu Stefanescu Delavrancea	MM-BM-A2-C-23	MM-BM-C1-C-24	17.03.2025 - 24.06.2025		
9.Str. Rozelor		MM-BM-C1-C-23	17.03.2025 - 15.04.2025	15.04.2025 - 27.06.2025	Dimex
PVPPA - 31.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
1.Str. Garii, Aleea Jupiter, Aleea Neptun, Aleea Saturn, Aleea Uranus, Aleea Amurgului, Str. Matei Basarab, Str. Petru Rares, Str. Bogdan Voda, Str. Bucovinei	MM-BM-A2-C-18 MM-BM-A2-C-24	MM-BM-C1-C-06 MM-BM-C1-C-07 MM-BM-C1-C-08 MM-BM-C1-C-11	12.05.2025 - 22.08.2025		Construrom
2.Str. Pasunii		MM-BM-C1-C-17	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
3.Str. Rapsodiei		MM-BM-C1-C-18	07.05.2025 - 25.07.2025		Dimex
PVPPA - 30.05.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Horea		MM-BM-C1-C-26	23.06.2025-29.09.2025		Dimex
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18 MM-BM-C1-C-25	07.05.2025 - 29.08.2025	29.08.2025-01.12.2025	Dimex
Paltinisului	MM-BM-A2-C-09 MM-BM-A2-C-10	MM-BM-C1-C-13 MM-BM-C1-C-14	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
Forestierului (Sudului)	MM-BM-A2-C-06		07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
PVPPA - 13.06.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Culturii	MM-BM-A2-C-16		28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Gheorghe Sincai			28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Vasile Lucaciu		MM-BM-C1-C-27 MM-BM-C1-C-28			Dimex
PVPPA - 14.08.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Hortensiei		MM-BM-C1-C-23	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
Aleea Dobrogei		MM-BM-C1-C-10	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
PVPPA - 10.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18	12.09.2025-15.11.2025		Dimex
B-dul Republicii		MM-BM-C1-C-04	12.09.2025-15.11.2025		Dimex
PVPPA - 30.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Colector canalizare - Tronson RE-LINING (Ob. 2.3)					Dimex + Construrom
PVPPA - 29.10.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Colonia Topitorilor (tronson CV-ex - CVG1)	MM-BM-A2-C-01		16.10.2025-22.12.2025		Dimex

RETELE DE APA SI APA UZATA BAI A MARE – MM-CL-06


Operator economic,
DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL
 Prin Lider Asociere, **DIMEX-2000 COMPANY S.R.L**

Zone de lucru – Obiect 1

- **ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Postfundus**

Zone de lucru – Obiect 2

- **ZONA DE LUCRU 2.1 – CONSTRUROM SA – Str. Aleea Saturn**
- **ZONA DE LUCRU 2.2 – CONSTRUROM SA – Str. Aleea Neptun**
- **ZONA DE LUCRU 2.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Aleea Dobrogei**

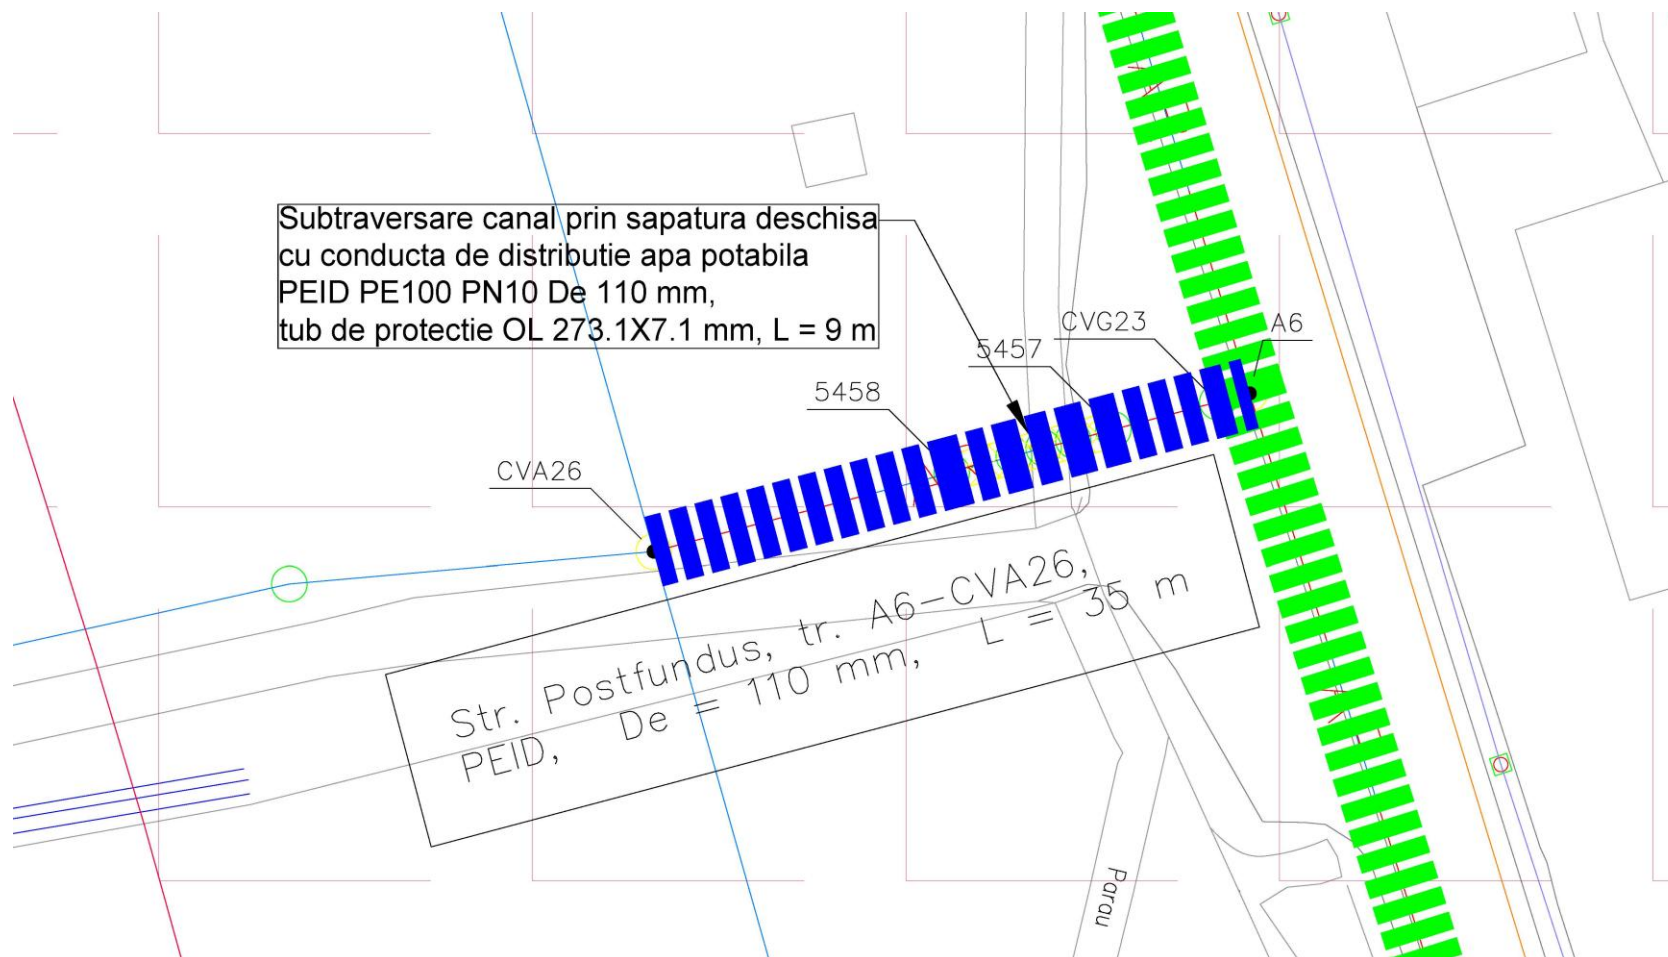


		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.3 - Reabilitarea retelei de distributie apa potabila																								
Sectiune	Str. Postfundus, tr. A6-CVA26	De 110	m	26	55			-29	212		m		0			0	#DIV/0!		buc.	2	1			1	50
Lista Nr.	D-1.3-8																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
E-1.3-1	1	1	0	100		mp		0			0	#DIV/0!		mp		0			0	#DIV/0!				



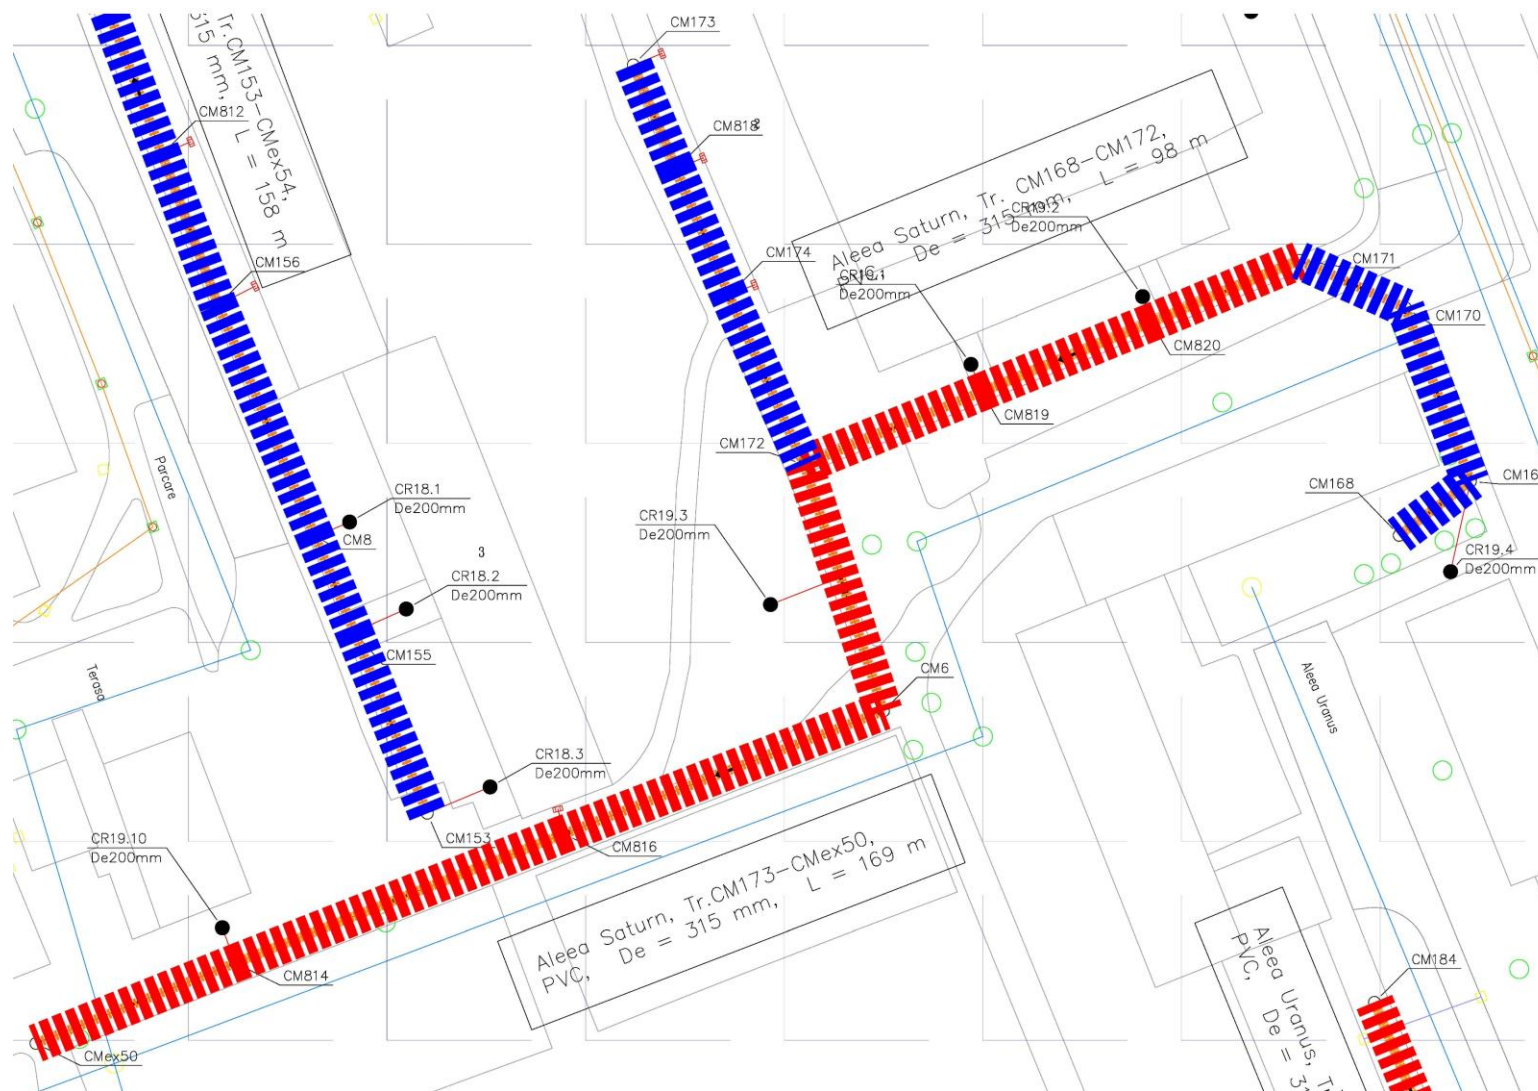


		D2 - Colectoare de canalizare																								
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																									
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																									
Sectiune	Aleea Saturn, Tr. CM168-CM172, Tr.CM173-CMex50			m		0			0	#DIV/0!	De 315	m	267	305			-38	114	De 200	m	140	6			134	4
Lista Nr.	D-2.2-5																									

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	13	14			-1	108	DN 1000	buc.	10	3			7	30			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Note constatare	Proba etanseitate	CCTV	As-built
	mp	386	0			386	0		mp	386	0			386	0				



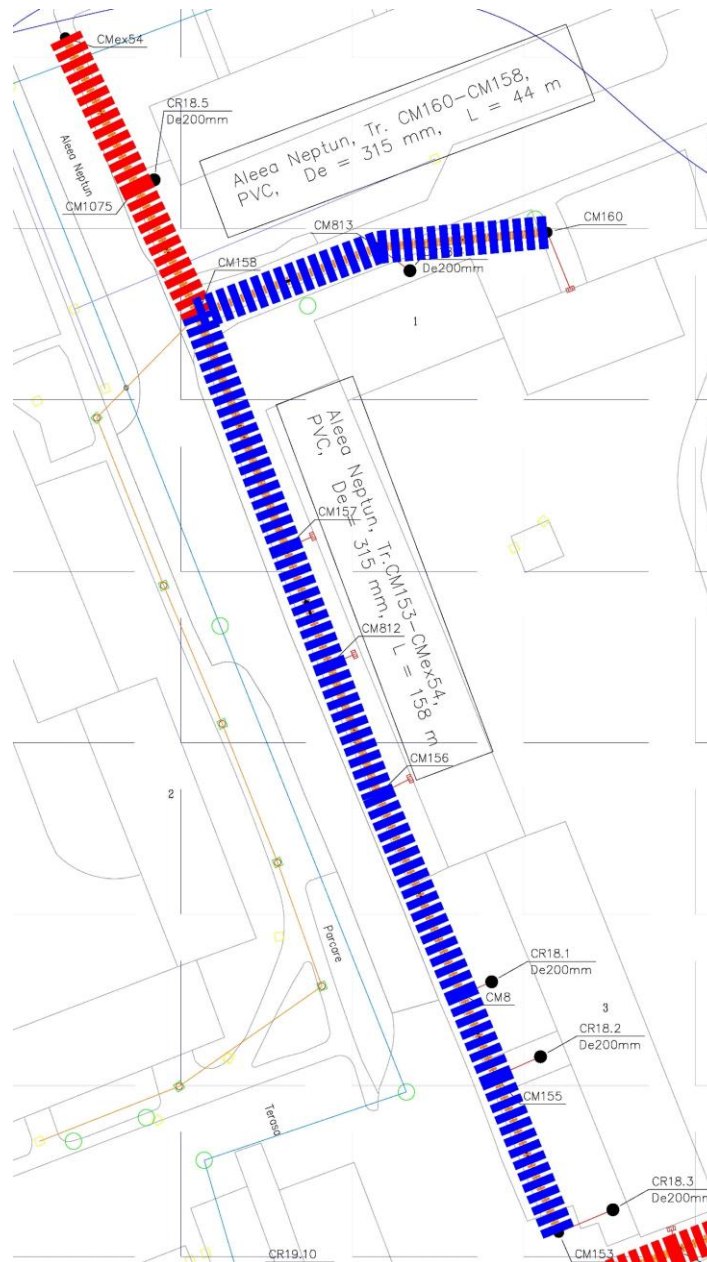

RETELE DE APA SI APA UZATA BAIAMARE – MM-CL-06

Operator economic,

DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL


Prin Lider Asociere, **DIMEX-2000 COMPANY S.R.L**

		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Aleea Neptun, Tr. CM160-CM158, Tr.CM153-CMex54		m		0			0	#DIV/0!	De 315	m	202	191			11	95	De 200	m	90	8			82	9
Lista Nr.	D-2.2-4																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	10	10			0	100	DN 1000	buc.	5	4			1	80			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba etanseitate	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	142	0			142	0		mp	142	0			142	0				




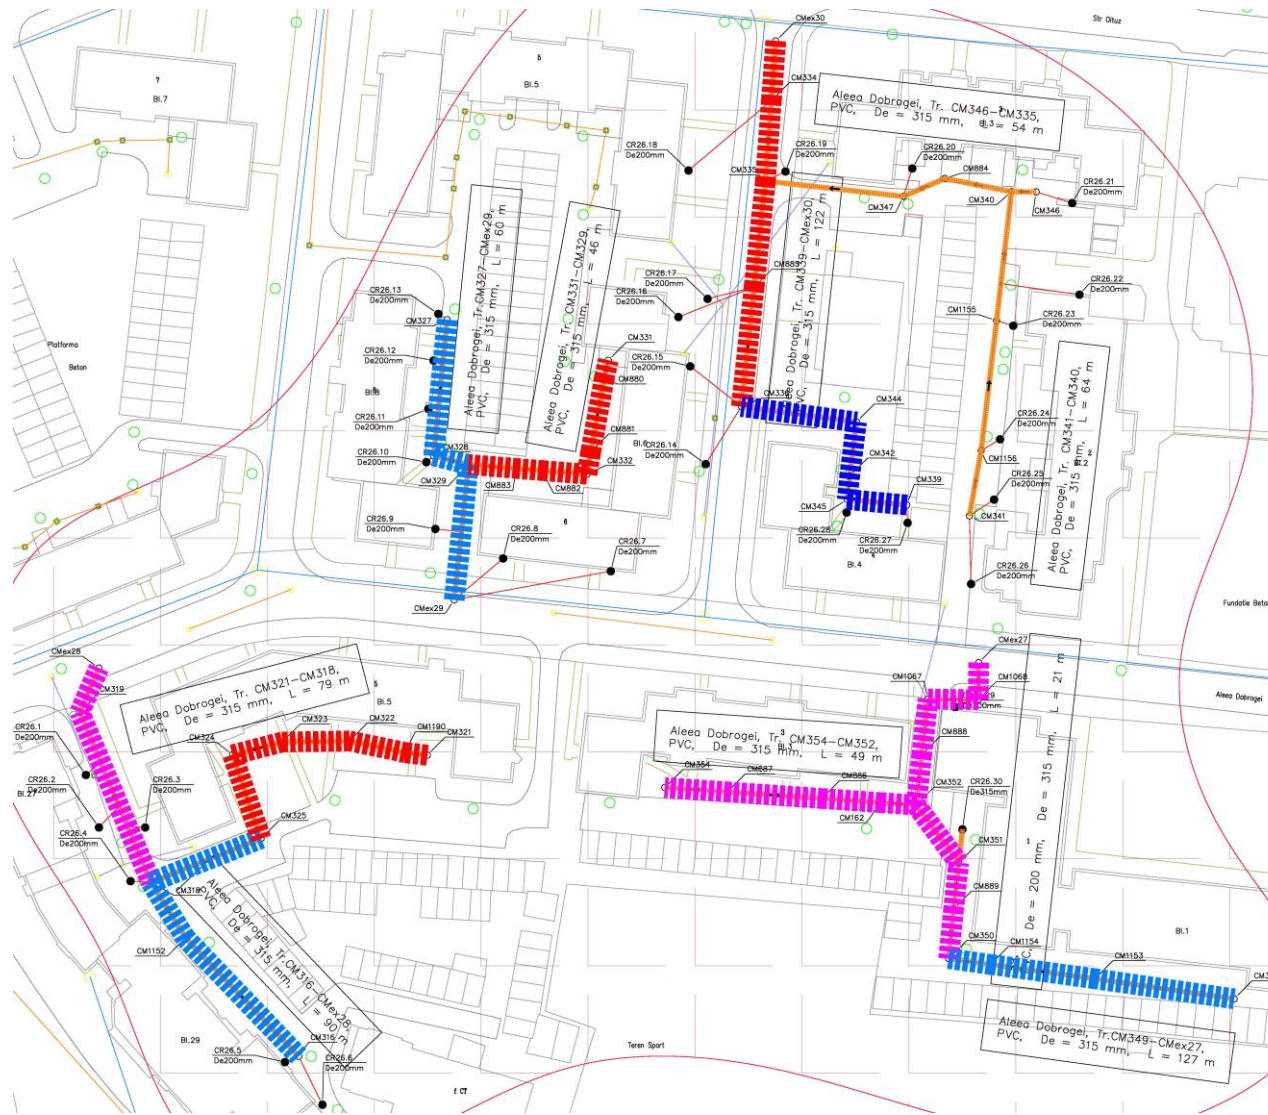

		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Aleea Dobrogei, Tr. CM321-CM318, Tr. CM331-CM329, Tr. CM339-CMex30, Tr. CM341-CM340, Tr. CM346-CM335, Tr. CM354-CM352, Tr.CM316-CMex28, Tr.CM327-CMex29, Tr.CM349-CMex27		m		0			0	#DIV/0!	De 315	m	691	338			353	49	De 200	m	300	11			289	4
Lista Nr.	D-2.2-2																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	48	26			22	54	DN 1000	buc.	30	12			18	40			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba etanseitate	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	1005	0			1005	0		mp	1005	0			1005	0				

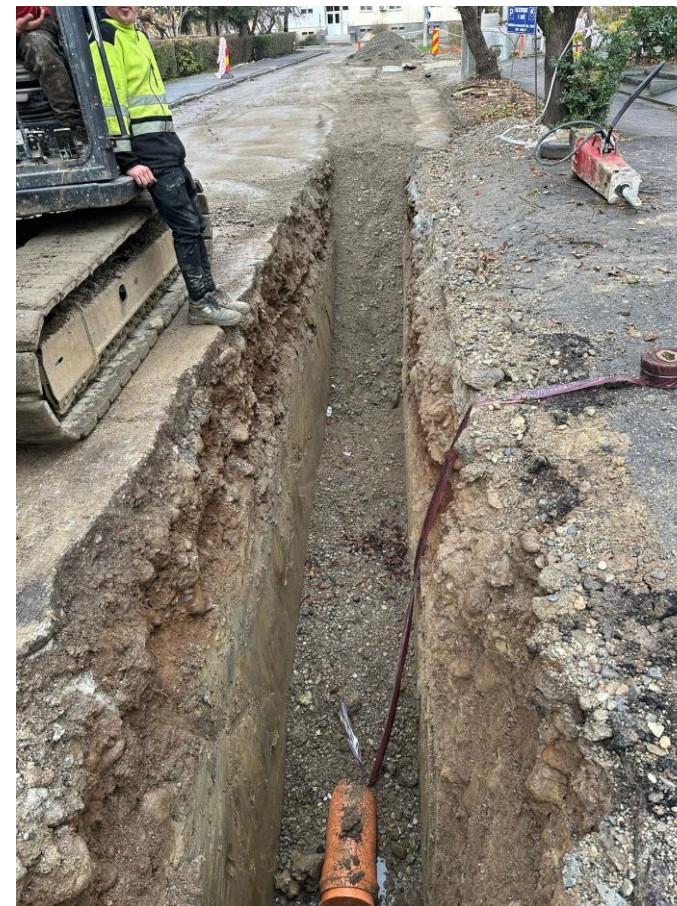

PROGRES GENERAL – MM-CL-06


DIMEX																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT	1294	9002	3536	1630	15462	74	151	41		PROIECT	2213	9123	2840	14176	593	226
EXECUTAT	0	3618	1065	60	4743	15	2	9		EXECUTAT	1265	5433	208	6906	352	73
PROCENT	0	40.2	30.1	3.7	30.7	20.3	1.3	22.0		PROCENT	57.2	59.6	7.3	48.7	59.4	32.3
CONSTRUROM																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT		5694	1520	950	8164	43	87	21		PROIECT	2588	9649	3200	15437	468	266
EXECUTAT		0	819	369	1188	5	42	8		EXECUTAT	715	2469	834	4018	153	108
PROCENT		0.0	53.9	38.8	14.6	11.6	48.3	38.1		PROCENT	27.6	25.6	26.1	26.0	32.7	40.6
TOTAL																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT	1294	14696	5056	2580	23626	117	238	62		PROIECT	4801	18772	6040	29613	1061	492
EXECUTAT	0	3618	1884	429	5931	20	44	17		EXECUTAT	1980	7902	1042	10924	505	181
PROCENT	0	24.6	37.3	16.6	25.1	17.1	18.5	27.4		PROCENT	41.2	42.1	17.3	36.9	47.6	36.8

PROGRES GENERAL PE OBIECTE – MM-CL-06

Obiect	1	Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	m	1294	0	-	0	0
Sub-Obiect	1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	m	13147	3618	0	3618	28
Sub-Obiect	1.3	Reabilitarea retelei de distributie apa potabila	m	4883	1065	650	1715	35
Sub-Obiect	1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	m	1549	-	0	0	0
Sub-Obiect	1.5	Extinderea retelei de distributie apa potabila	m	173	-	169	169	98
Sub-Obiect	1.6	Statie de pompare apa potabila	buc.	1	0	-	0	0
Obiect	2	Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	2.1	Extindere retea de canalizare	m	5393	362	311	673	12
Sub-Obiect	2.2	Reabilitare retea de canalizare	m	15864	5637	2873	8510	54
Sub-Obiect	2.3	Reabilitare colector de canalizare	m	3514	-		699	20
Sub-Obiect	2.4	Statii de pompare apa uzata si conducta de refulare						
		<i>Statii de pompare apa uzata</i>	buc.	2	0	0	0	0
		<i>Conducte de refulare</i>	m	1649	0	0	0	0
Sub-Obiect	2.5	Reabilitare deversor, B-dul Bucuresti	buc.	1	-	0	0	0


ZONE INCEPERE LUCRARI IANUARIE-FEBRUARIE 2026:

- 1. Str. George Cosbuc**
- 2. Str. Barbu Stefanescu Delavrancea**
- 3. Supratraversare rau Firiza – CVG1 – CVA2**
- 4. B-dul Bucuresti – Str. Europa, Tr. CVA34-CVG35 – extindere conducta transport apa potabila**
- 5. Str. Matei Basarab**
- 6. Str. Garii – CM607 – CM586 - reabilitare colector canalizare – profil PAFSIN ovoid De 600/900**
- 7. Str. Victoriei – subtraversare B-dul Independentei (DN1C) si rau Sasar-Bdul Unirii, tr. A12-CVA13**

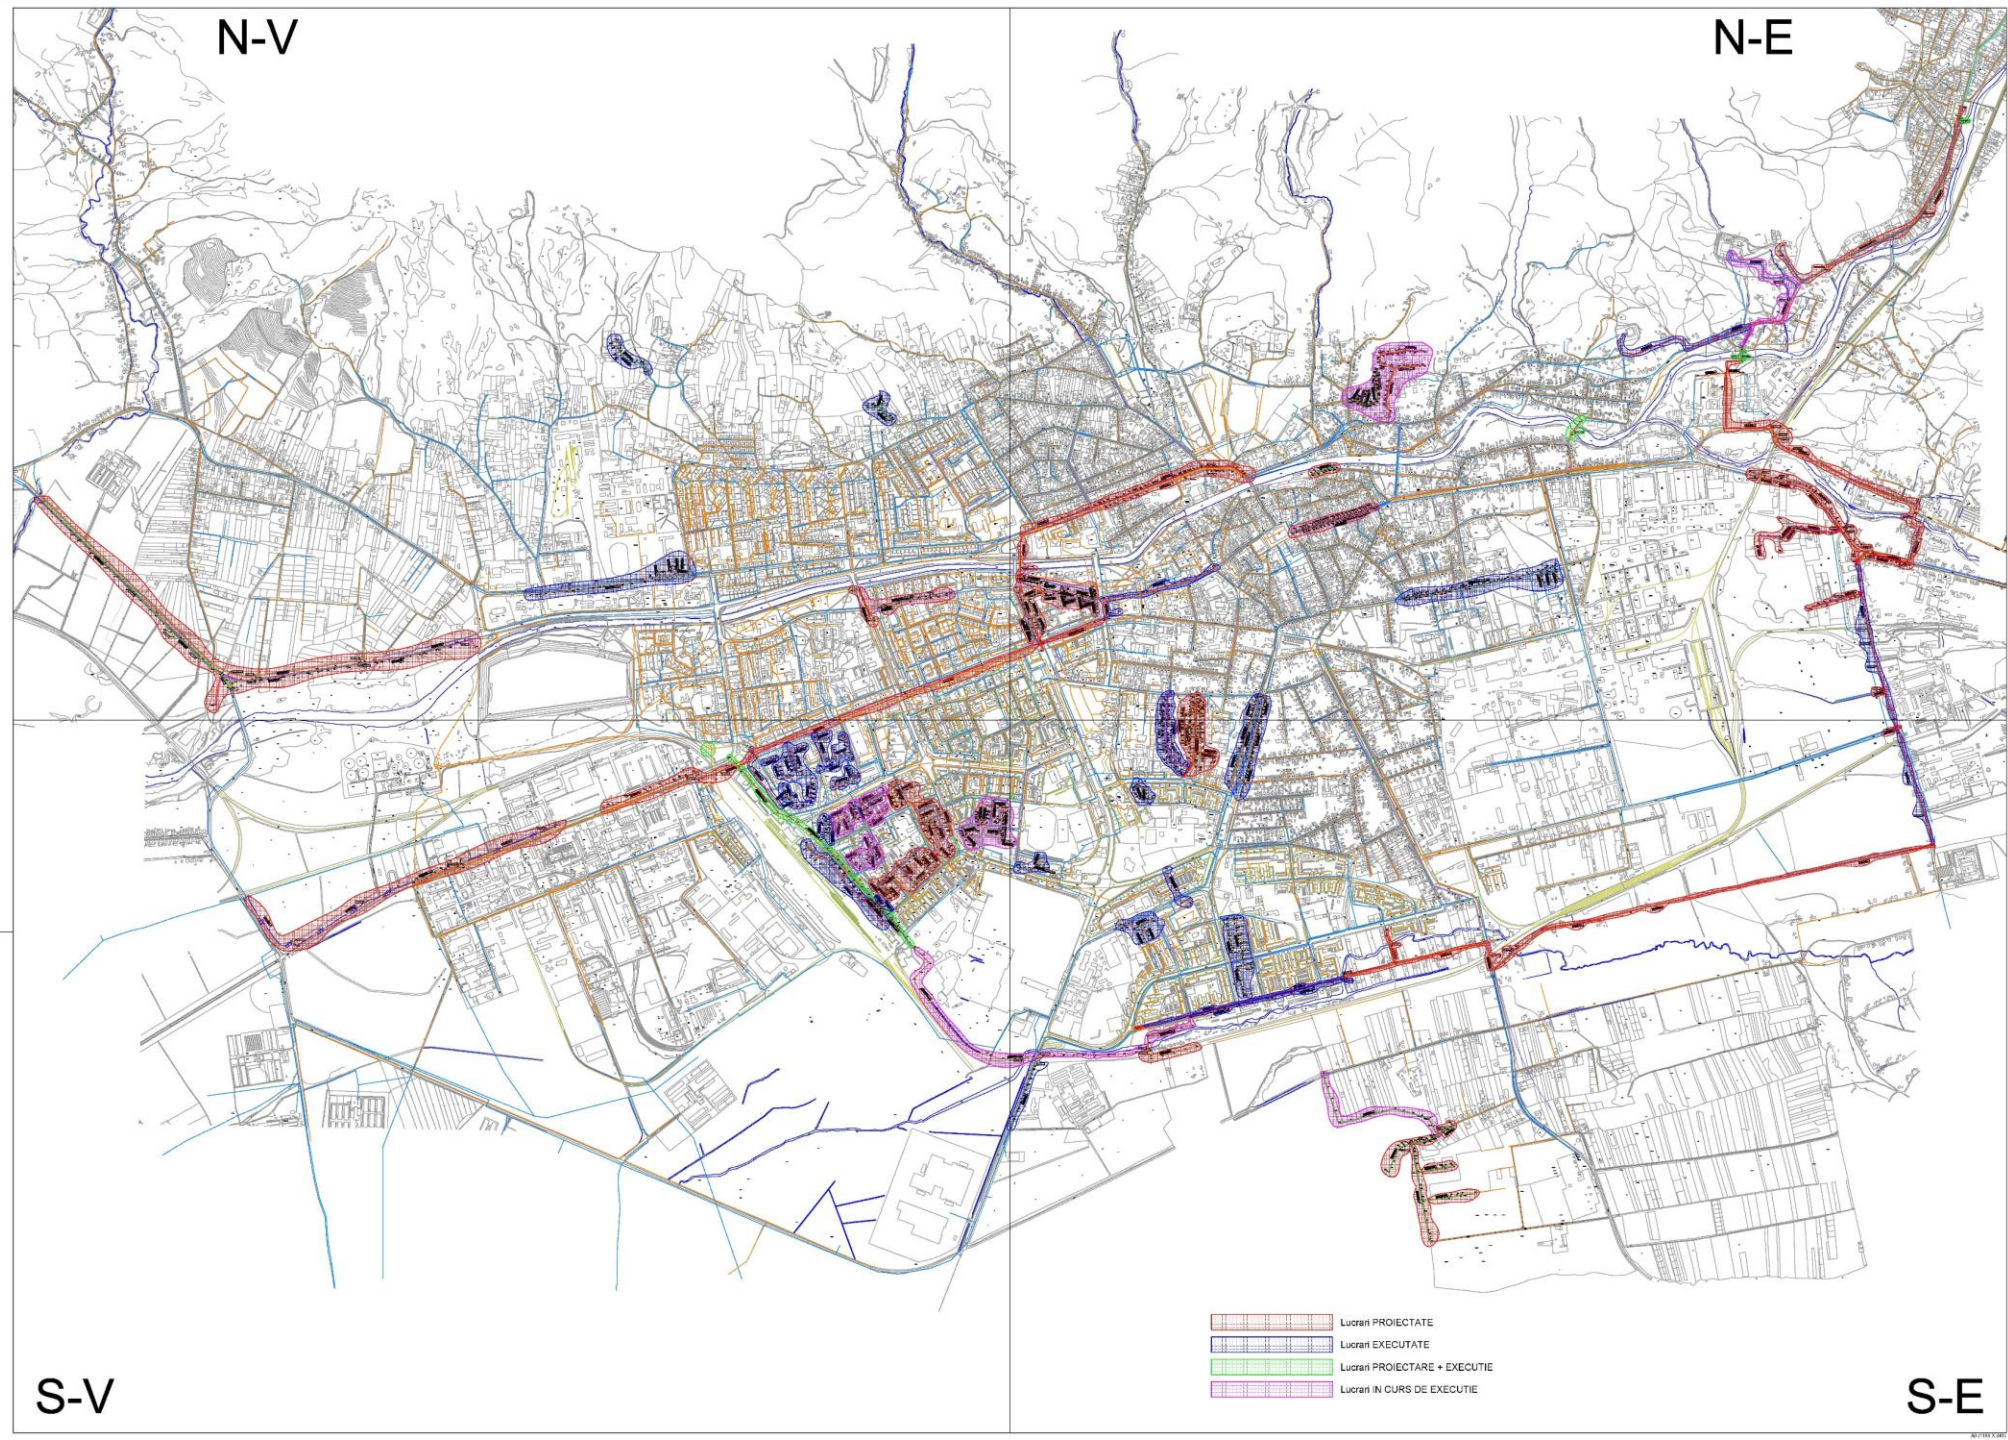


N-V

- Lucrari PROIECTATE
- Lucrari EXECUTATE
- Lucrari PROIECTARE + EXECUTIE
- Lucrari IN CURS DE EXECUTIE

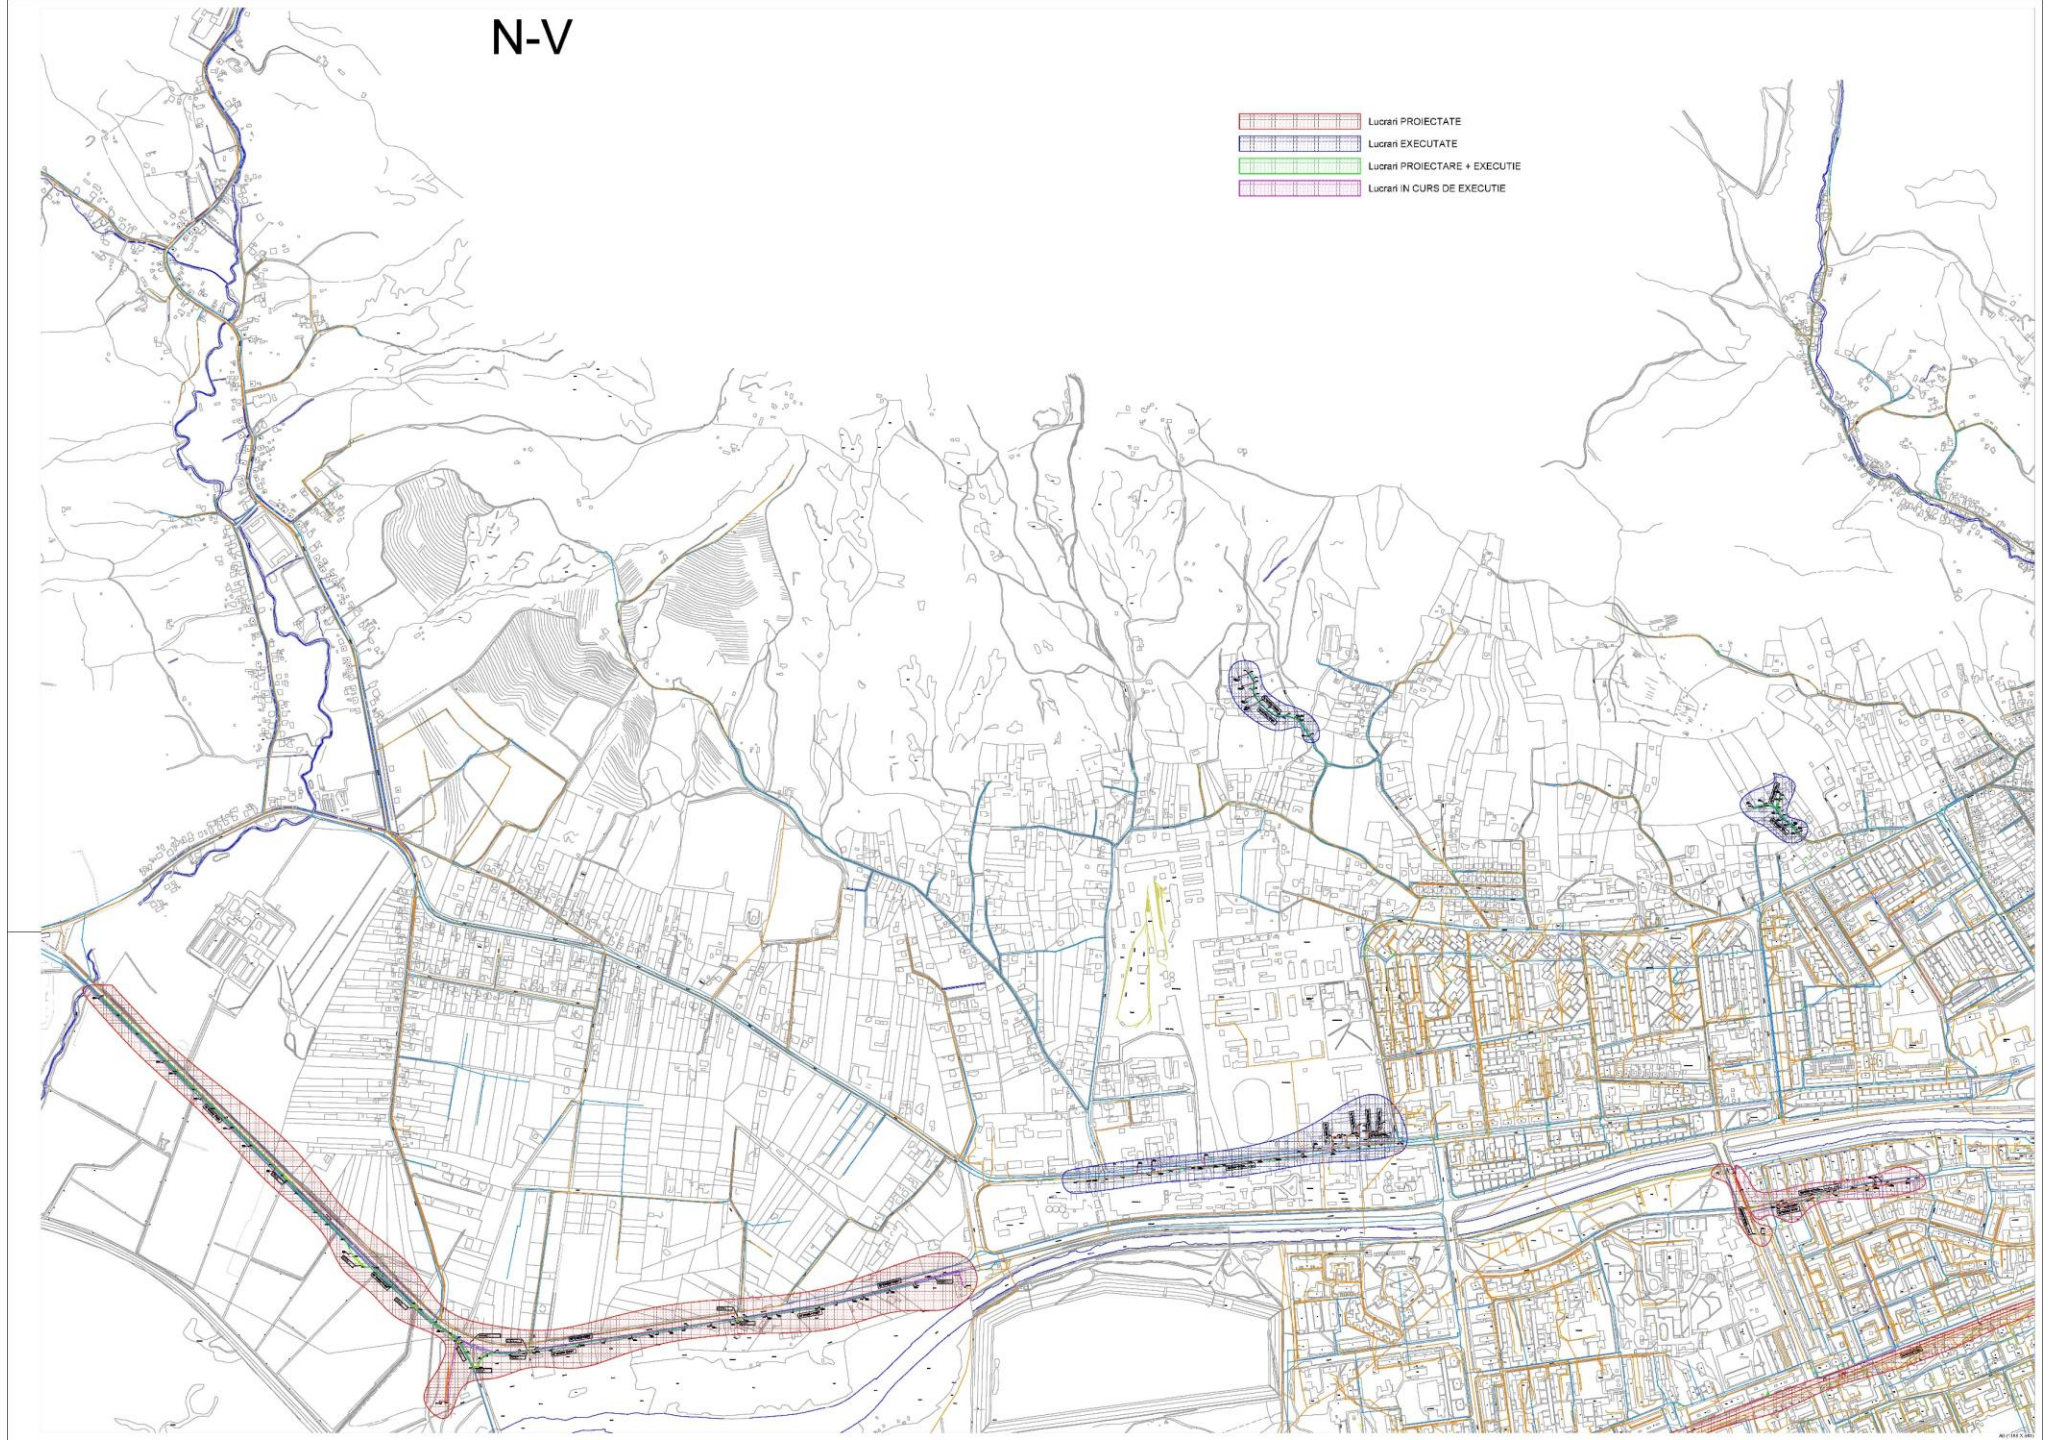

S-V

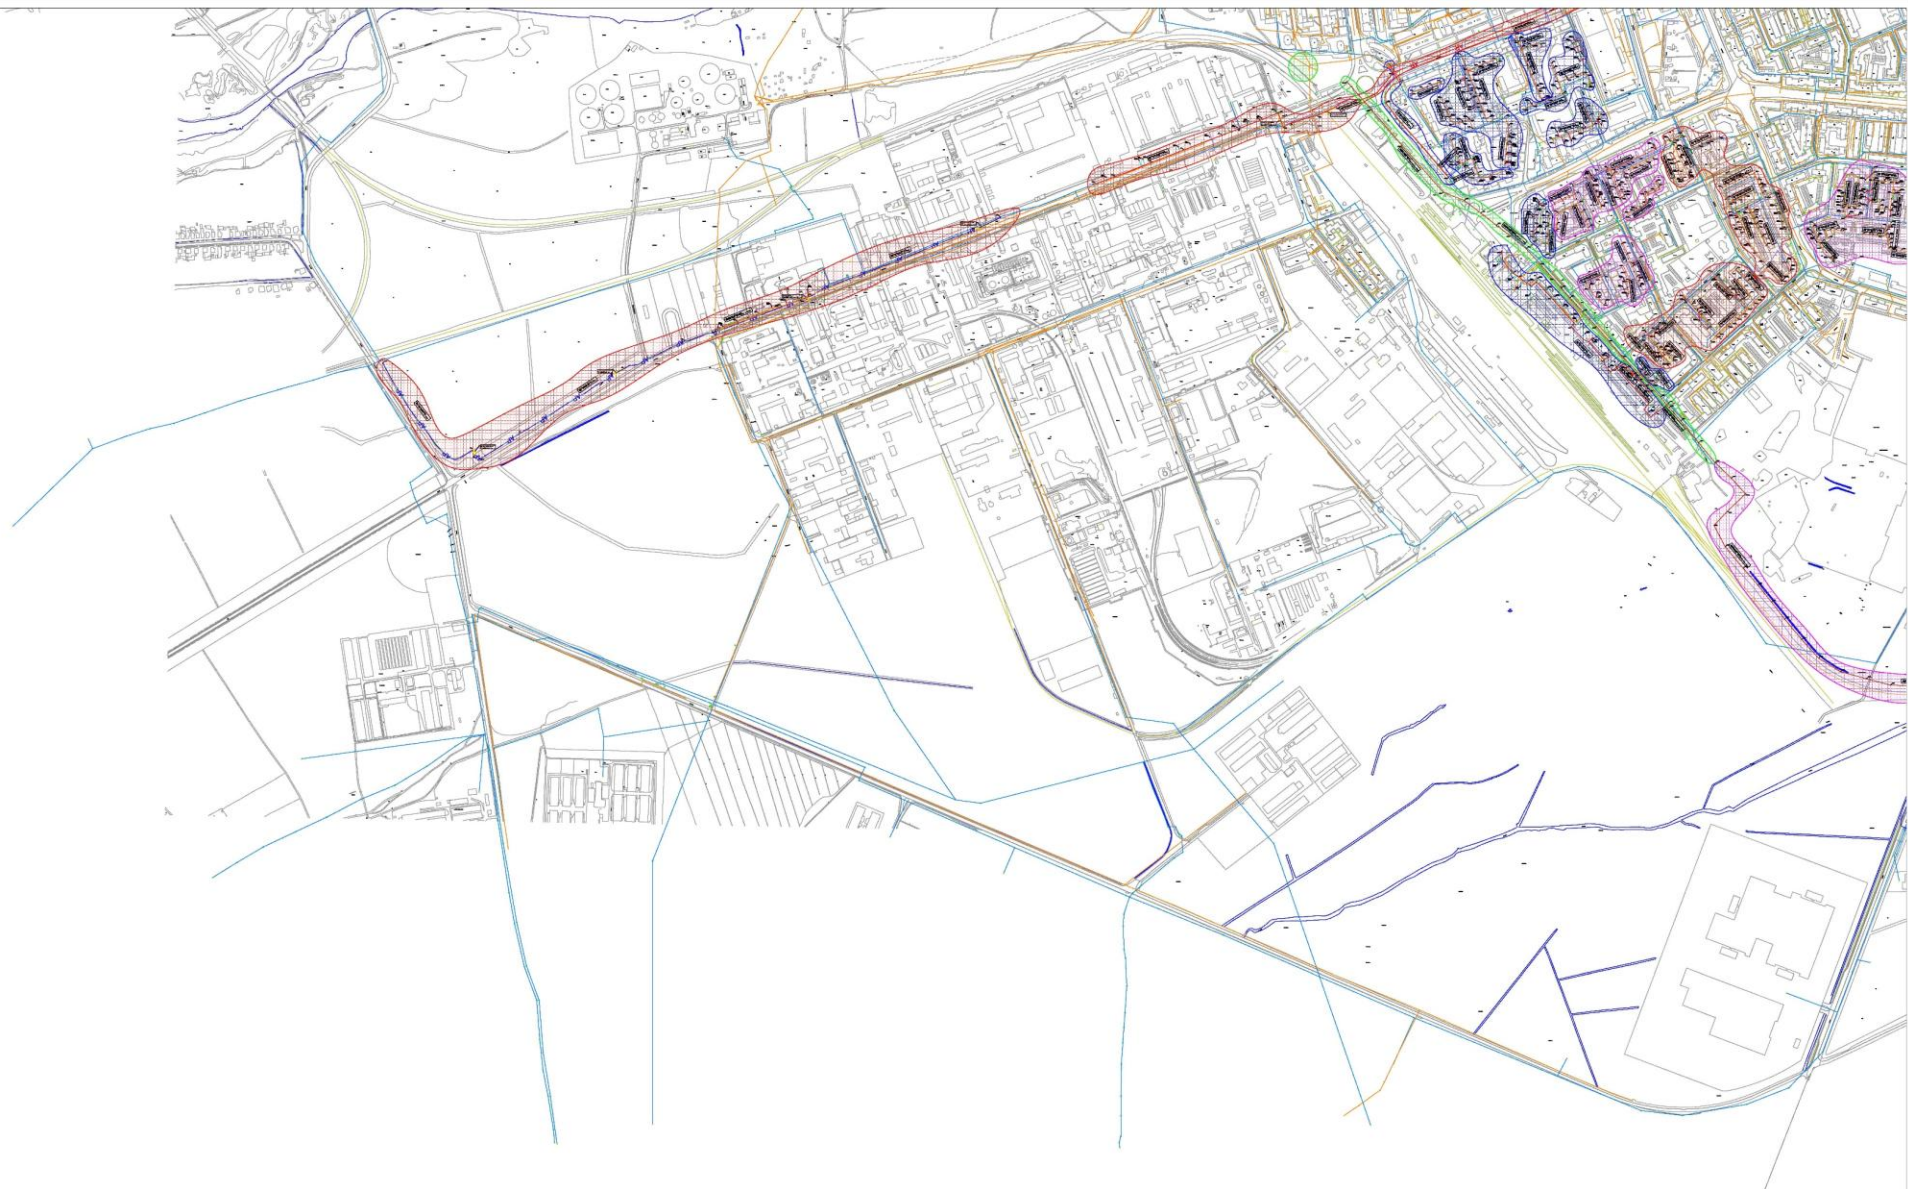

- Lucrari PROIECTATE
- Lucrari EXECUTATE
- Lucrari PROIECTARE + EXECUTIE
- Lucrari IN CURS DE EXECUTIE



S-E

- Lucrari PROIECTATE
- Lucrari EXECUTATE
- Lucrari PROIECTARE + EXECUTIE
- Lucrari IN CURS DE EXECUTIE

N-E

- Lucrari PROIECTATE
- Lucrari EXECUTATE
- Lucrari PROIECTARE + EXECUTIE
- Lucrari IN CURS DE EXECUTIE

