

MM-CL-04 - Proiectare și execuție

Sistem transport apă potabilă

Baia Mare – Satulung – Șomcuta Mare – Mireșu Mare –
Ulmeni – Remetea Chioarului

- Baia Mare, 08.10.2026




STRABAG
WORK ON PROGRESS

LEGENDA ETAPA 1

Conducta de transport propusa

Conducta pozată în luna AUGUST-SEPTEMBRIE

Tronsoane abordate în luna OCTOMBRIE

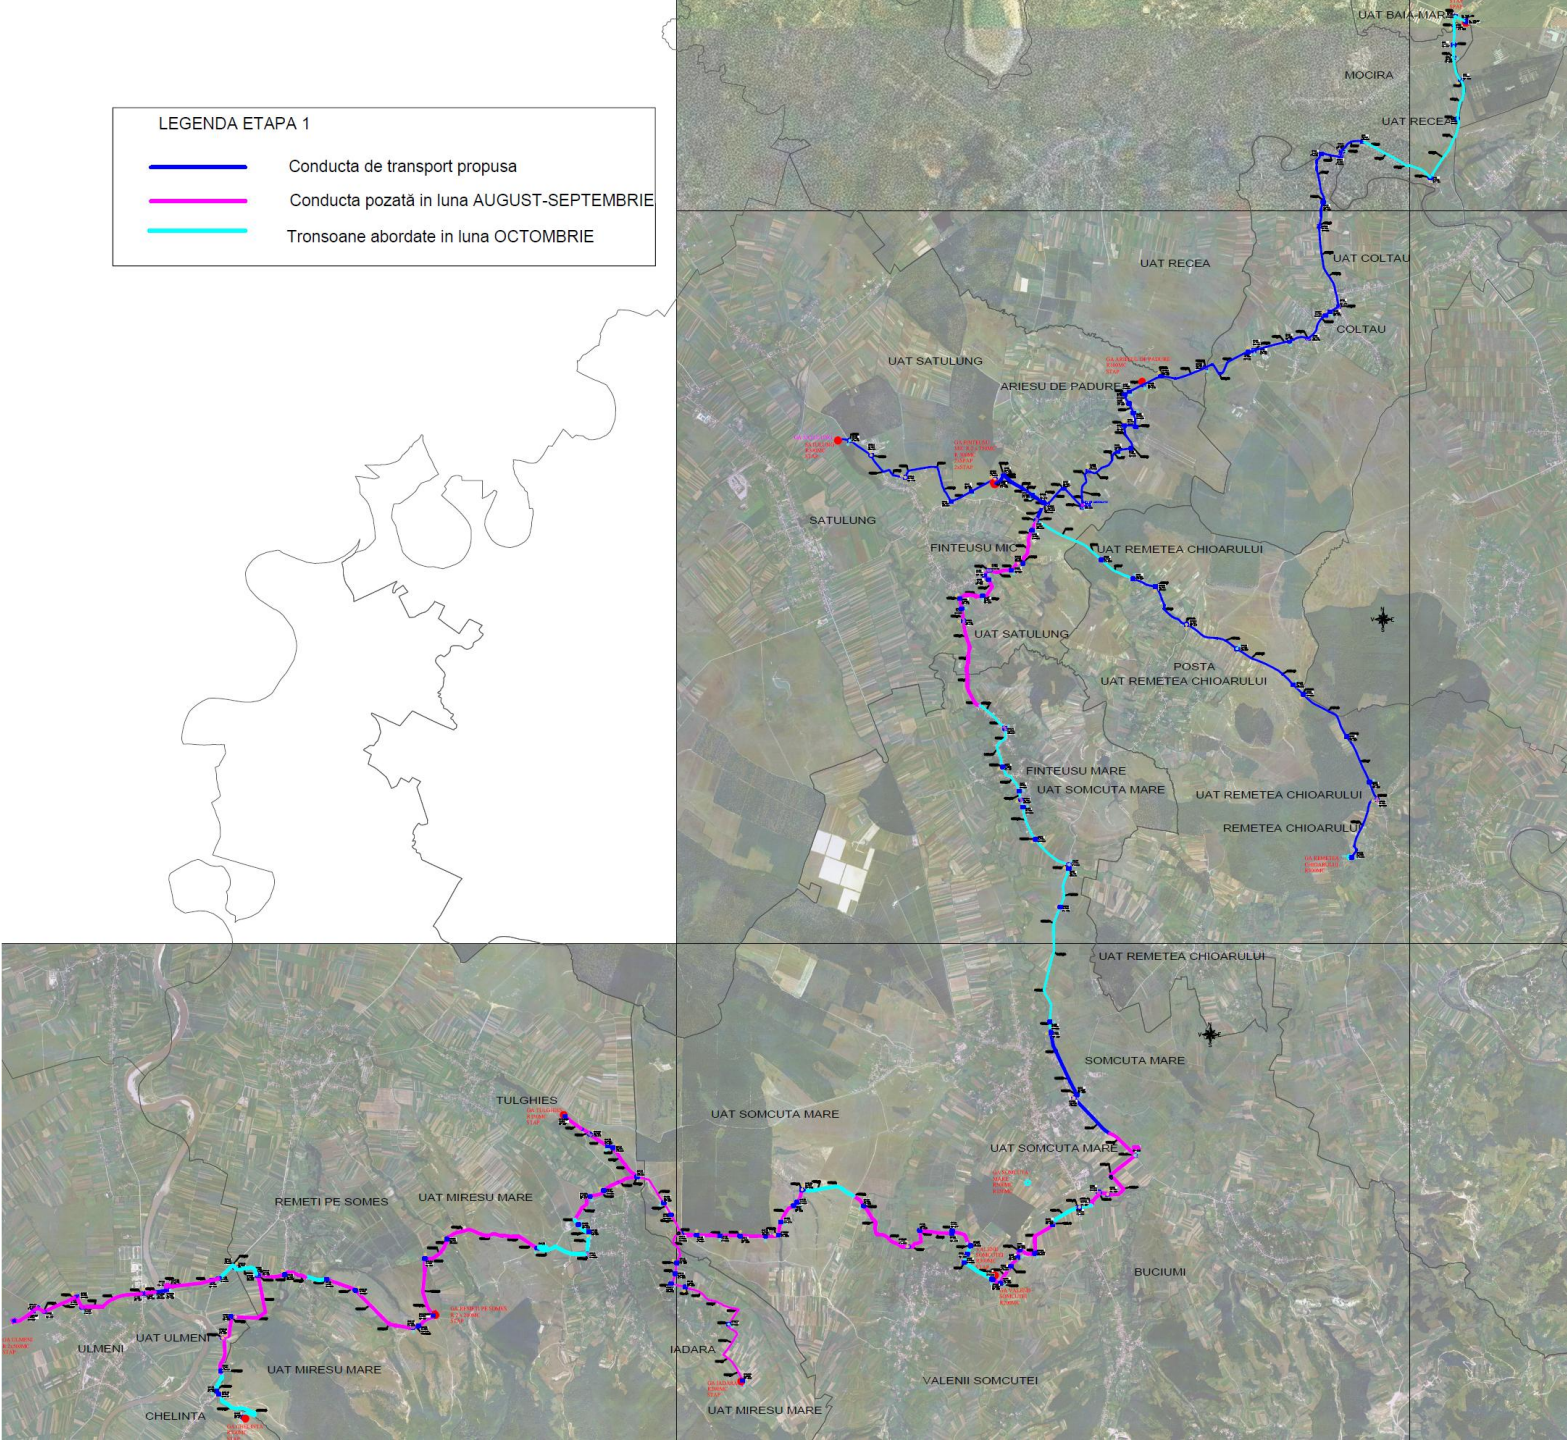

Sutrons	LUNGIME	PROPUS IN LUNA SEPTEMBRIE	EXECUTAT IN LUNA SEPTEMBRIE
1.1	1659	232,00	
1.2	1969		
1.3	1737		
1.4	1770		
1.5	1639		
1.6	909		
2.1	1450	189,00	
2.2	1459		
2.3	1202		
3.1	1737		
3.2	1157		
4.1	1098		
4.2	1881		
4.3	1508		
4.4	1974		
4.5	1916		
5.1	1927	1.041,00	666
5.2	1439		1439
5.3	1704		1105
5.4	1716	978,00	
5.5	1191		
5.6	1777		
5.7	982		
5.8	1610	1.401,00	918
5.9	1466		885
5.10	1468		895
6.1	1935	1.122,00	1153
6.2	1858		840
6.3	911	811,00	866
6.4	1168		1168
7.1	655	655,00	517
7.2	1398	126,00	1398
7.3	1014		999
8.1.1	1018	865,00	
8.1.2	1679		
8.1.3	2063	1.093,00	1137
8.1.4	1275		1259
8.2.1	1316	1.184,00	1107
8.2.2	1405	927,00	760
8.2.3	1854		1854
8.2.4	1195		
9	1331		1281
10.1	1839	1.011,00	549
10.2	1990		1895
TOTAL	66249	11635	22691



STRABAG
WORK ON PROGRESS







PROGRES EXECUTIE

Planificat Executat

