

**“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
in judetul Maramures”**


CONTRACT DE LUCRARI - MM-CL-06

“RETELE DE APA SI APA UZATA BAIA MARE”

Beneficiar: **VITAL S.A**

Antreprenor: **Asocierea DIMEX-2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL**

Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L

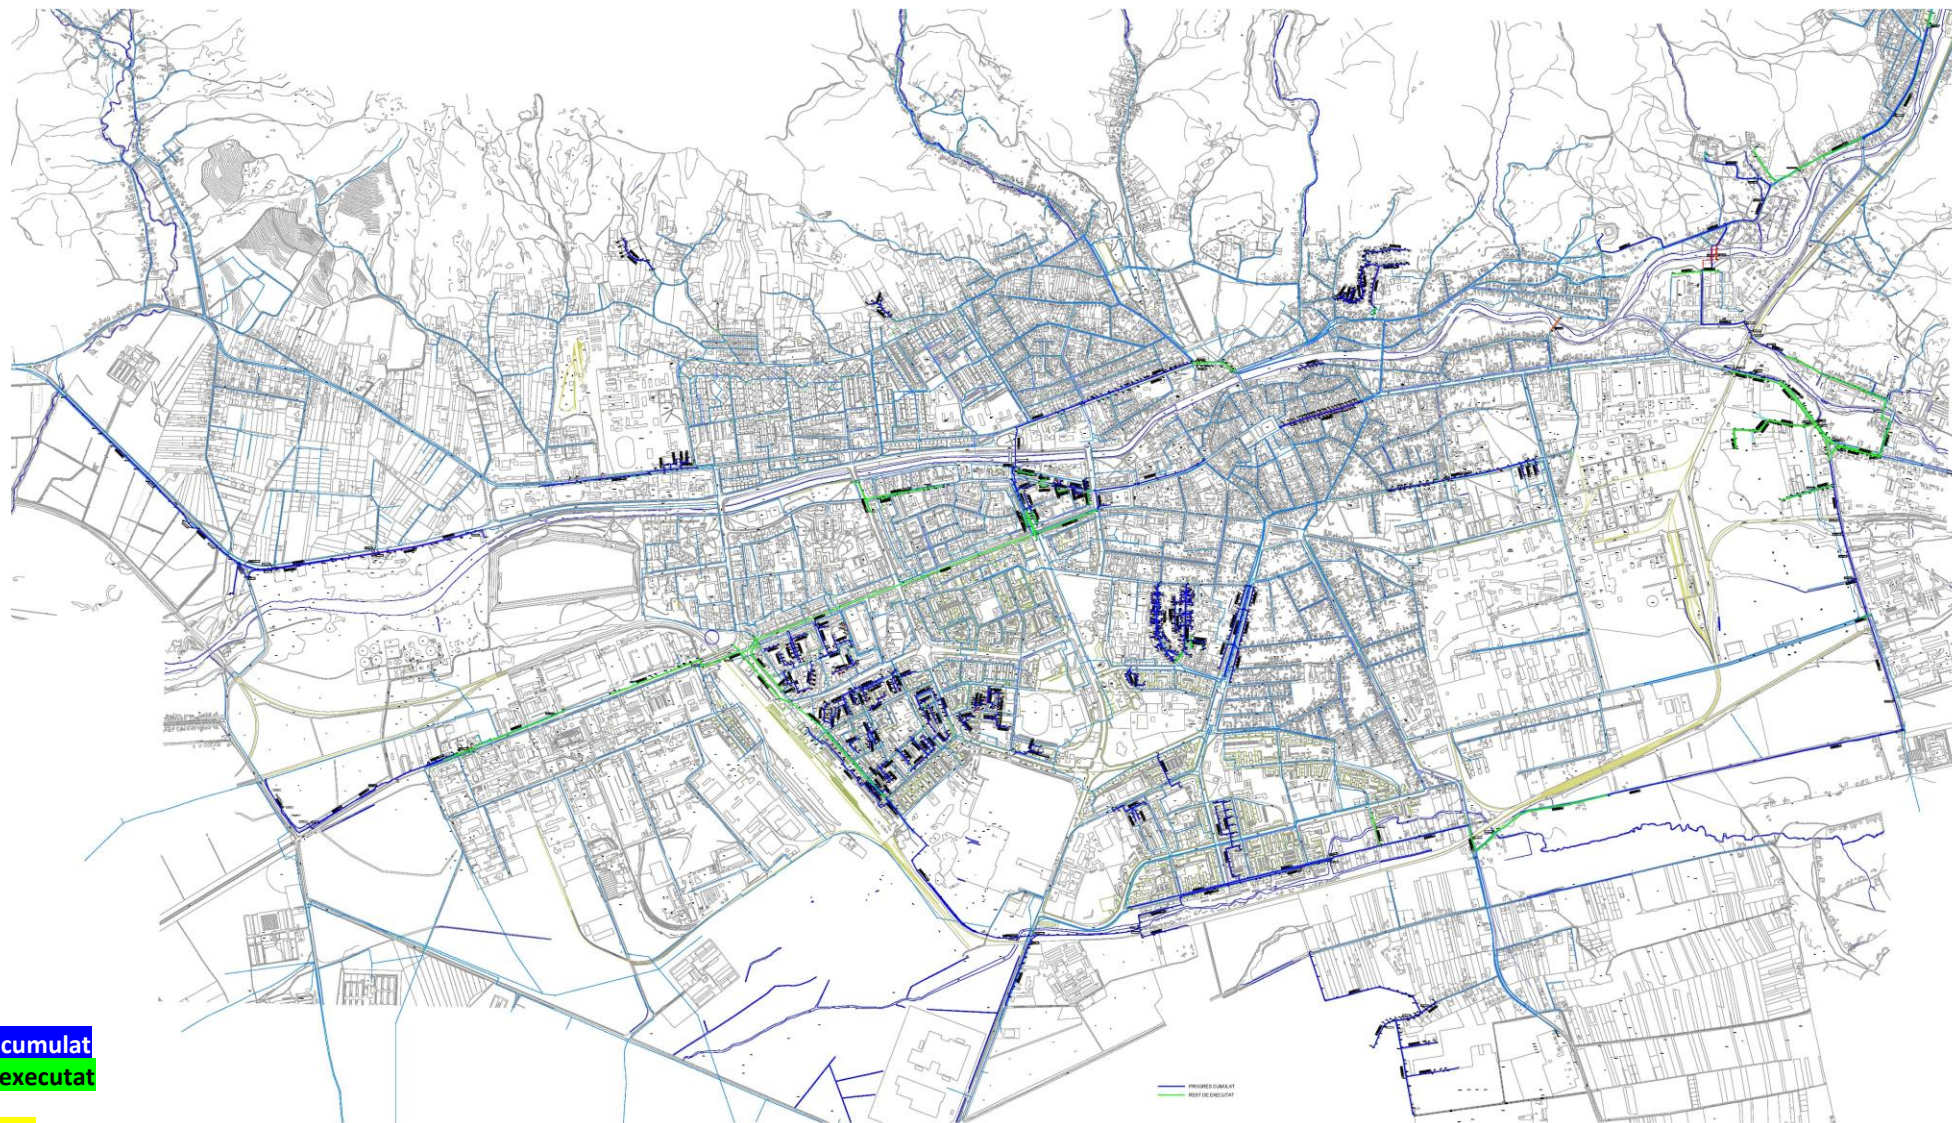

----- Progres cumulativ
----- Rest de executat

Procent executat: 69%

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	L = 1324 m, PEID PE100 PN10; De 1000 mm
Sub-obiect 1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	L = 13926 m, PEID PE100 PN10; De 315 mm ÷ 800 mm
Sub-obiect 1.3	Reabilitare retelei de distributie apa potabila	L = 4994 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm ÷ 400 mm
Sub-obiect 1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 1644 m, PEID PE100 PN10; De 400 mm
Sub-obiect 1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila	L = 173 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.6	Statie de pompare apa potabila	Grup pompare (2A+1R), Qgr = 10 l/s, Hp=30 m, P= 9,0 kW; Dimensiuni constructie: 5,5 x 2,4 x 2,7 m
OBIECT 2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea de canalizare	L = 5531 m, PVC SN8; De 250 mm; PAFSIN SN10000 De 500 mm
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea de canalizare	L = 16995 m, PVC SN8; De 250 mm ÷ De 400 mm; PAFSIN SN10000 De 300 mm ÷ De 800 mm
Sub-obiect 2.3	Reabilitare colector de canalizare	L = 3634 m, PAFSIN SN10000 De 300 mm, ovoid De 600/900 mm, De 760/1140 mm; clopot De 2100/1575 mm
Sub-obiect 2.4	Statie de pompare apa uzata SPAU1	1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 10,0 m, P = 1,65 kW, Lref = 490 m, PEID, De 110 mm
	Statie de pompare apa uzata SPAU2	3A+1R, Q = 21.0 l/s, Hp = 14,0 m, P = 9,0 kW, Lref = 1350 m, PEID, De 280 mm
Sub-obiect 2.5	Reabilitare Devensor	Dimensiuni: L= 20 m, l= 7 m, H= 5 m

PVPPA - 11.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
1.Str. Victoriei		MM-BM-C1-C-03	17.03.2025 - 15.07.2025		Construrom
1.Str. Victoriei	MM-BM-A2-C-11		23.03.2026-30.04.2026	30.04.2026-22.05.2026 16.07.2026-24.07.2026	Construrom
2.Str. Unirii	MM-BM-A2-C-12	MM-BM-C1-C-05	18.05.2026-19.06.2026		Construrom
3.Str. Grigore Ureche	MM-BM-A2-C-26	MM-BM-C1-C-30	17.03.2025 - 09.05.2025	09.05.2025 - 06.06.2025	Construrom
4.Str. Fructelor		MM-BM-C1-C-29	12.05.2025 - 27.06.2025		Construrom
5.Str. Colonia Topitorilor	MM-BM-A2-C-01		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
6.Str. Cerbului	MM-BM-A2-C-20 MM-BM-A2-C-21		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
7.Str. Privighetorii si Dealul Crucii	MM-BM-A2-C-25	s	17.03.2025 - 30.06.2025	30.06.2025-30.04.2026	Dimex
8.Str. Barbu Stefanescu Delavrancea	MM-BM-A2-C-23	MM-BM-C1-C-24	17.03.2025 - 24.06.2025	24.06.2025-31.08.2026	DIMEX
9.Str. Rozelor		MM-BM-C1-C-23	17.03.2025 - 15.04.2025	15.04.2025 - 27.06.2025	Dimex
PVPPA - 31.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Garii		MM-BM-C1-C-06 MM-BM-C2-C-07 MM-BM-C2-C-08 MM-BM-C2-C-11	14.07.2025-31.07.2025	31.07.2025-01.12.2025	Construrom
Str. Garii	MM-BM-A2-C-18		12.05.2025 - 22.08.2025		Construrom
Aleea Jupiter		MM-BM-C1-C-06	28.07.2025 - 05.08.2025	05.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Neptun		MM-BM-C1-C-07	21.07.2025-22.08.2025	22.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Saturn		MM-BM-C1-C-07			Construrom
Aleea Uranus		MM-BM-C1-C-07	25.07.2025-05.08.2025	05.08.2025-01.12.2025	Construrom
Str. Petru Rares		MM-BM-C1-C-08	23.10.2025 - 15.12.2025		Construrom
2.Str. Pasunii		MM-BM-C1-C-17	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
3.Str. Rapsodiei		MM-BM-C1-C-18	07.05.2025 - 25.07.2025		Dimex
PVPPA - 30.05.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Horea		MM-BM-C1-C-26	23.06.2025-29.09.2025		Dimex
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18 MM-BM-C1-C-25	07.05.2025 - 29.08.2025	29.08.2025-01.12.2025	Dimex
Paltinisului	MM-BM-A2-C-09 MM-BM-A2-C-10 MM-BM-A2-C-09 MM-BM-A2-C-10	MM-BM-C1-C-13 MM-BM-C1-C-14	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
Forestierului (Sudului)	MM-BM-A2-C-06		07.05.2025 - 22.08.2025	22.08.2025-30.08.2026	Dimex
PVPPA - 13.06.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Culturii			28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Gheorghe Sincal	MM-BM-A2-C-16		28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Vasile Lucaci		MM-BM-C1-C-27 MM-BM-C1-C-28	-		Dimex
PVPPA - 14.08.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Hortensiei		MM-BM-C1-C-23	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
Aleea Dobrogei		MM-BM-C1-C-10	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
PVPPA - 10.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18	12.09.2025-15.11.2025		Dimex
B-dul Republicii		MM-BM-C1-C-04	12.09.2025-15.11.2025		Dimex
PVPPA - 30.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Colector canalizare - Tronson RE-LINING (Ob. 2.3)					Dimex + Construrom
PVPPA - 23.10.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Colonia Topitorilor (tronson CV-ex - CVG1)	MM-BM-A2-C-01		16.10.2025-22.12.2025	22.12.2025-30.10.2026	Dimex
PVPPA - 27.01.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Codrului, str. Paltinului, str. Mesteacanului		MM-BM-C-C1-20	18.02.2026		Construrom
Str. Castanilor		MM-BM-C-C1-21	18.02.2026		Construrom

PVPPA - 04.02.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Supratraversare Rau Firiza	MM-BM-A2-C-01		-		Dimex
Str. Barajului si Colonia Topitorilor	MM-BM-A1-C1-01 MM-BM-A1-C1-02		02.03.2026-31.10.2026		Dimex
Str. Vasile Lucaci		MM-BM-C1-C-27	14.06.2026-30.06.2026 01.07.2026-30.09.2026		Dimex
Str. Petru Rares		MM-BM-C1-C-8	09.02.2026-30.04.2026		Construrom
Str. Matei Basarab		MM-BM-C1-C-8	09.02.2026-30.04.2026		Construrom
Aleea Amurgului		MM-BM-C1-C-8	09.02.2026-30.04.2026		Construrom
Str. Garii		MM-BM-C-C1-12	09.02.2026-30.04.2026		Construrom
Str. Murelor		MM-BM-C-C1-19	09.02.2026-30.04.2026		Construrom
PVPPA - 09.03.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Privighetorii (SPAP)	MM-BM-A9-C-01		17.03.2025-09.05.2025	09.05.2025-30.04.2026	DIMEX
PVPPA - 08.04.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Bucovinei		MM-BM-C1-C-09	23.03.2026-30.08.2026	30.08.2026-30.09.2026	Construrom
Str. Bogdan Voda		MM-BM-C1-C-08	23.03.2026-30.08.2026	30.08.2026-30.09.2026	Construrom
PVPPA - 16.04.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Bld. Independentei		MM-BM-C1-C-01 MM-BM-C1-C-02	27.04.2026-30.08.2026	30.08.2026-30.09.2026	Construrom
PVPPA - 22.04.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. 8 Martie-Str. Corbului	MM-BM-A2-C-02		22.04.2026-31.08.2026	31.08.2026-30.10.2026	Dimex
PVPPA - 13.05.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Bld. Regele Mihai I		MM-BM-A2-C-27	18.05.2026-19.06.2026		
PVPPA - 19.05.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Bld. Bucuresti reabilitare retea canal		MM-BM-C1-C-22 MM-BM-C2-C-57	-		Construrom
Bld. Bucuresti extinderea retea transport apa	MM-BM-A2-C-27 MM-BM-A4-C-34 MM-BM-A4-C-35		18.05.2026-19.06.2026	19.06.2026-30.08.2026	Construrom
Str. Mihai Eminescu reabilitare retea transport apa	MM-BM-A2-C-08 MM-BM-A4-C-10		-		Dimex
PVPPA - 29.05.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Muncii	MM-BM-A2-C-17 MM-BM-A4-C-21		08.07.2026-11.09.2026		Dimex
Str. Sebesului	MM-BM-A2-C-07 MM-BM-A4-C-08		08.06.2026-23.12.2026		Dimex
PVPPA - 02.07.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Dumbravei		MM-BM-C1-C-16	17.08.2026-30.09.2026		Construrom
Str. Bdul Unirii		MM-BM-C1-C-15	19.08.2026-31.10.2026		Construrom
Str. Garii Paltinisului		MM-BM-C1-C-13	07.05.2025-22.08.2025	22.08.2025-30.10.2026	Construrom
Str. Nufarului		MM-BM-C1-C-29	13.08.2026-30.09.2026		Construrom
PVPPA - 15.07.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Corbului		MM-BM-A2-C-03			Dimex
PVPPA - 22.07.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Victoriei	MM-BM-A2-C-11		27.07.2026-30.09.2026		Construrom
Str. Bdul Unirii (traversare colector canalizare)		MM-BM-C1-C-15	27.07.2026-17.08.2026	17.08.2026-30.09.2026	Construrom
PVPPA - 12.08.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. George Cosbuc		MM-BM-C1-C-01	12.08.2026-31.10.2026		Dimex
Str. Nufarului		MM-BM-C1-C-29	13.08.2026-30.09.2026		Construrom
PVPPA - 12.08.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Vasile Lucaci		MM-BM-C1-C-28	31.08.2026-31.10.2026		Dimex

RETELE DE APA SI APA UZATA BAI A MARE – MM-CL-06

Operator economic,

DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL

Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L


Zone de lucru – Obiect 1

- ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Corbului - PEID De800 mm
- ZONA DE LUCRU 1.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Sebesului - PEID De800 mm
- ZONA DE LUCRU 1.3 – CONSTRUROM SA – Str. Victoriei - PEID De800 mm + retea distributie
- ZONA DE LUCRU 1.4 – CONSTRUROM SA – B-dul Unirii - PEID De800 mm
- ZONA DE LUCRU 1.5 – CONSTRUROM SA – B-dul Bucuresti - PEID De400 mm

Zone de lucru – Obiect 2

- ZONA DE LUCRU 2.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Vasile Lucaciu - EST
- ZONA DE LUCRU 2.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barbu Stefanescu Delavrancea
- ZONA DE LUCRU 2.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. George Cosbuc (intre B-dul Culturii si B-dul Unirii)
- ZONA DE LUCRU 2.4 – CONSTRUROM SA – B-dul Unirii (intre Str. George Cosbuc si B-dul Bucuresti)
- ZONA DE LUCRU 2.5 – CONSTRUROM SA – B-dul Bucuresti
- ZONA DE LUCRU 2.6 – CONSTRUROM SA – Str. Paltinisului (ovoid 600/900)

- **ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Corbului - PEID De800 mm**

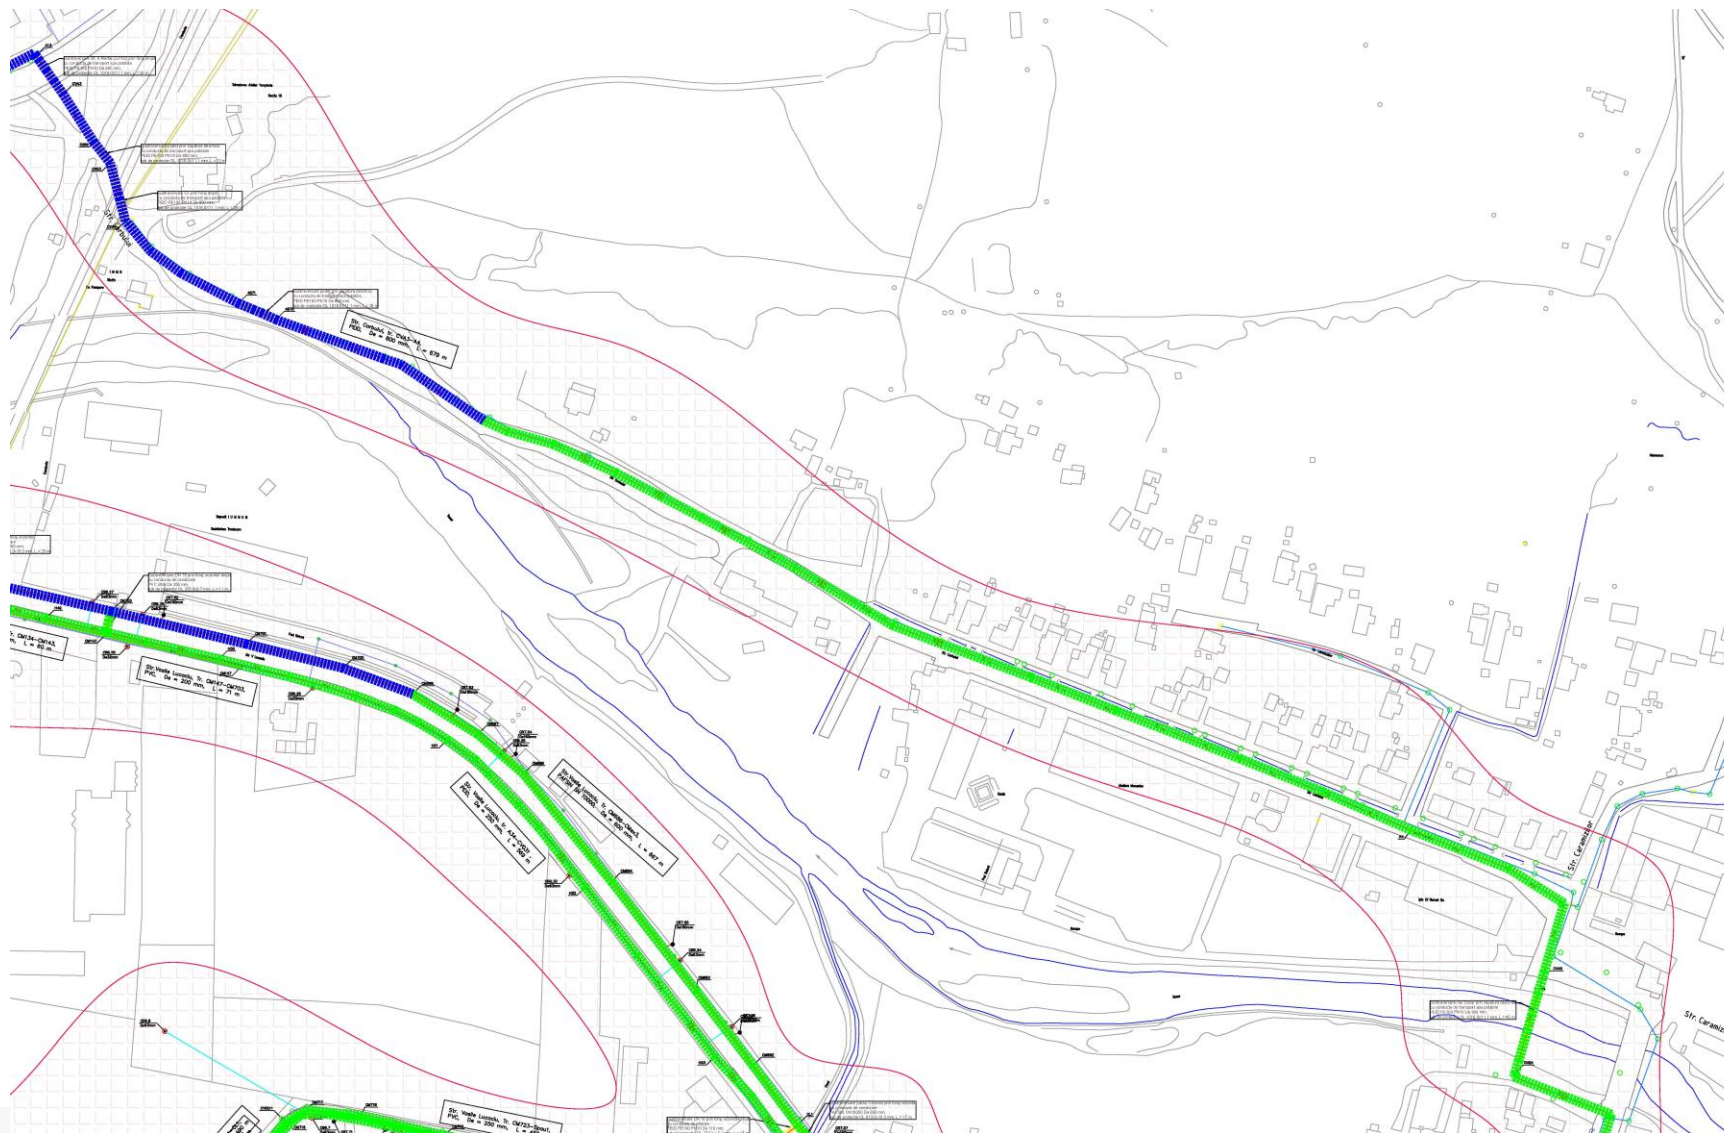


----- Progres cumulat
----- Rest de executat

Procent executat: 74%

		D1 - Conducte de transport apa / Rețele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9	De 630 De 800	m	7527	5552			1975	74		m		0			0	#DIV/0!		buc.	24	12			12	50
Lista Nr.	D-1.2-10																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!



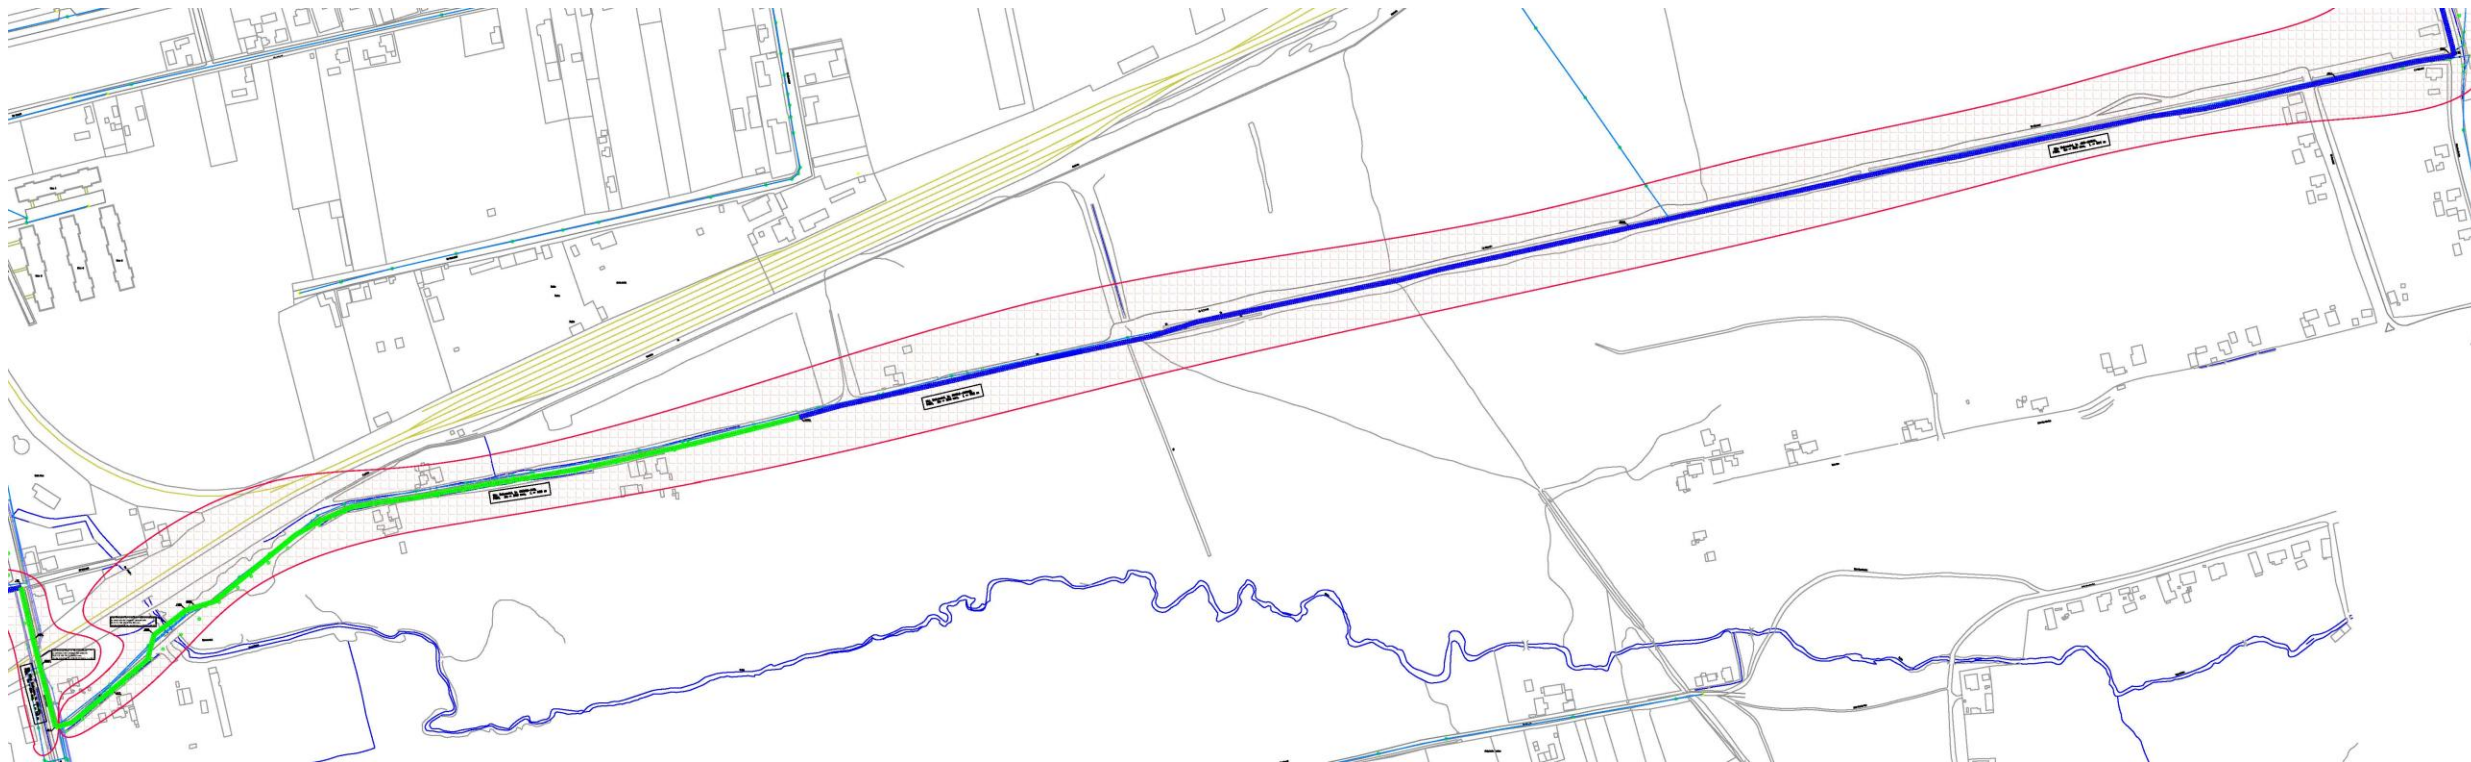

----- Progres cumulat
----- Rest de executat


Procent executat: 74%

		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9	De 630 De 800	m	7527	5552			1975	74		m		0			0	#DIV/0!		buc.	24	12			12	50
Lista Nr.	D-1.2-10																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

- **ZONA DE LUCRU 1.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Sebesului - PEID De800 mm**




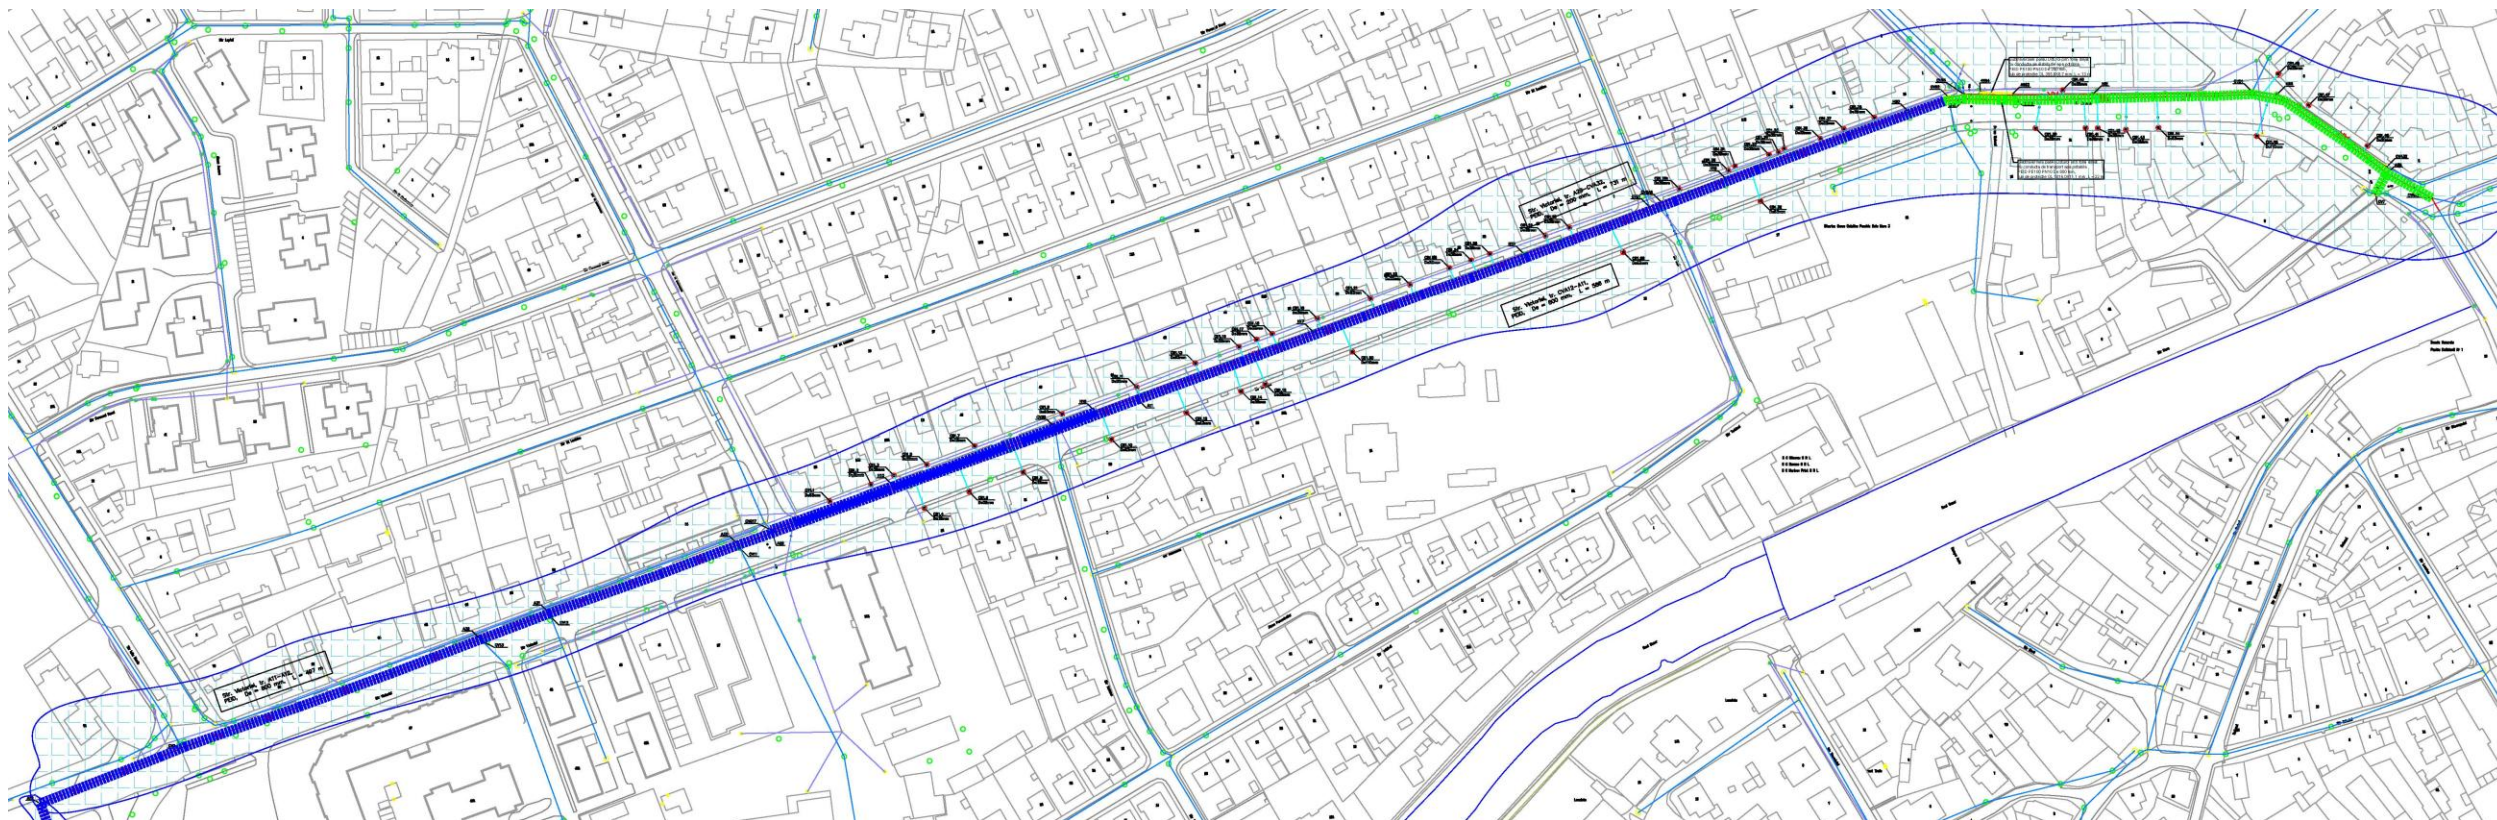

----- Progres cumulat
----- Rest de executat

Procent executat: 32% - transport

Procent executat: 73% - distributie

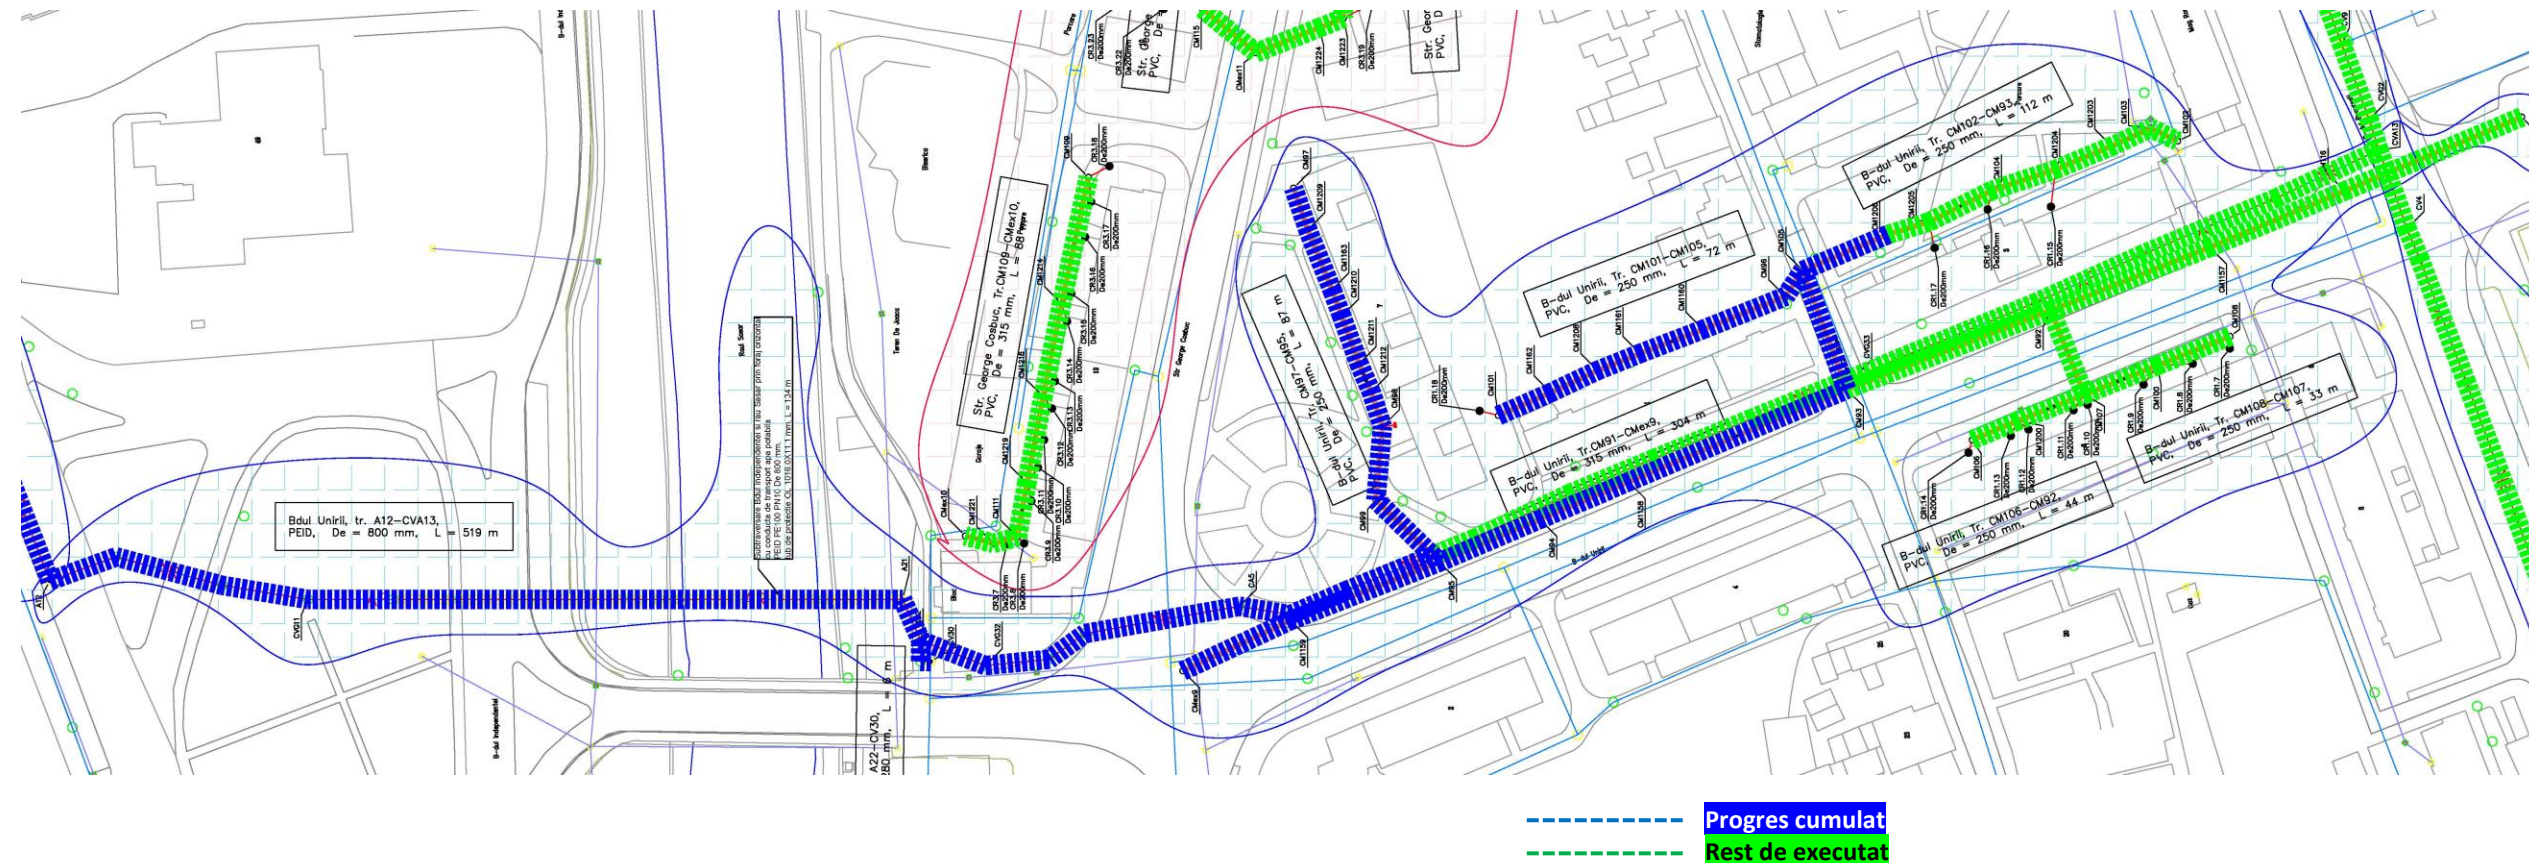

Procent executat: 32%


• ZONA DE LUCRU 1.3 + 1.4 – **CONSTRUROM SA** – Str. Victoriei - PEID De800 mm + retea distributie + B-dul Unirii - PEID De800 mm

		D1 - Conducte de transport apa / Rețele de distribuție														D5 - Camine de vane și camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea și extinderea rețelei de apă din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apă potabilă																								
Sectiune	Conducta transport apă potabilă (Str. Victoriei-Bdul București), tr. CVA12-CVG14	De 400 De 500 De 800	m	3514	1123			2391	32	De 63 De 100	m	120	0			120	0	buc.	18	4				14	22
Lista Nr.	D-1.2-7																								
		D6-2 - Hidranți de incendiu							D7 - Camine de bransament							D7-3 - Contoare debit									
		DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
		DN 100	buc.	5	0			5	0		buc.	12	0			12	0	DN 25 DN 40 DN 80	buc.	15	0			15	0

		D1 - Conducte de transport apa / Rețele de distribuție														D5 - Camine de vane și camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea și extinderea rețelei de apă din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.3 - Reabilitarea rețelei de distribuție apă potabilă																								
Sectiune	Str. Victoriei, tr. A28-CV7, tr. A29-CVA32	De 200 De 400	m	728	529			199	73	De 32 De 63 De 110	m	480	0			480	0	buc.	9	0				9	0
Lista Nr.	D-1.3-11																								
		D6-2 - Hidranți de incendiu							D7 - Camine de bransament							D7-3 - Contoare debit									
		DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
		DN 100	buc.	8	0			8	0		buc.	48	0			48	0	DN 25 DN 40 Dn 80	buc.	48	0			48	0

- **ZONA DE LUCRU 1.3 + 1.4 – CONSTRUROM SA – Str. Victoriei - PEID De800 mm + retea distributie + B-dul Unirii - PEID De800 mm**



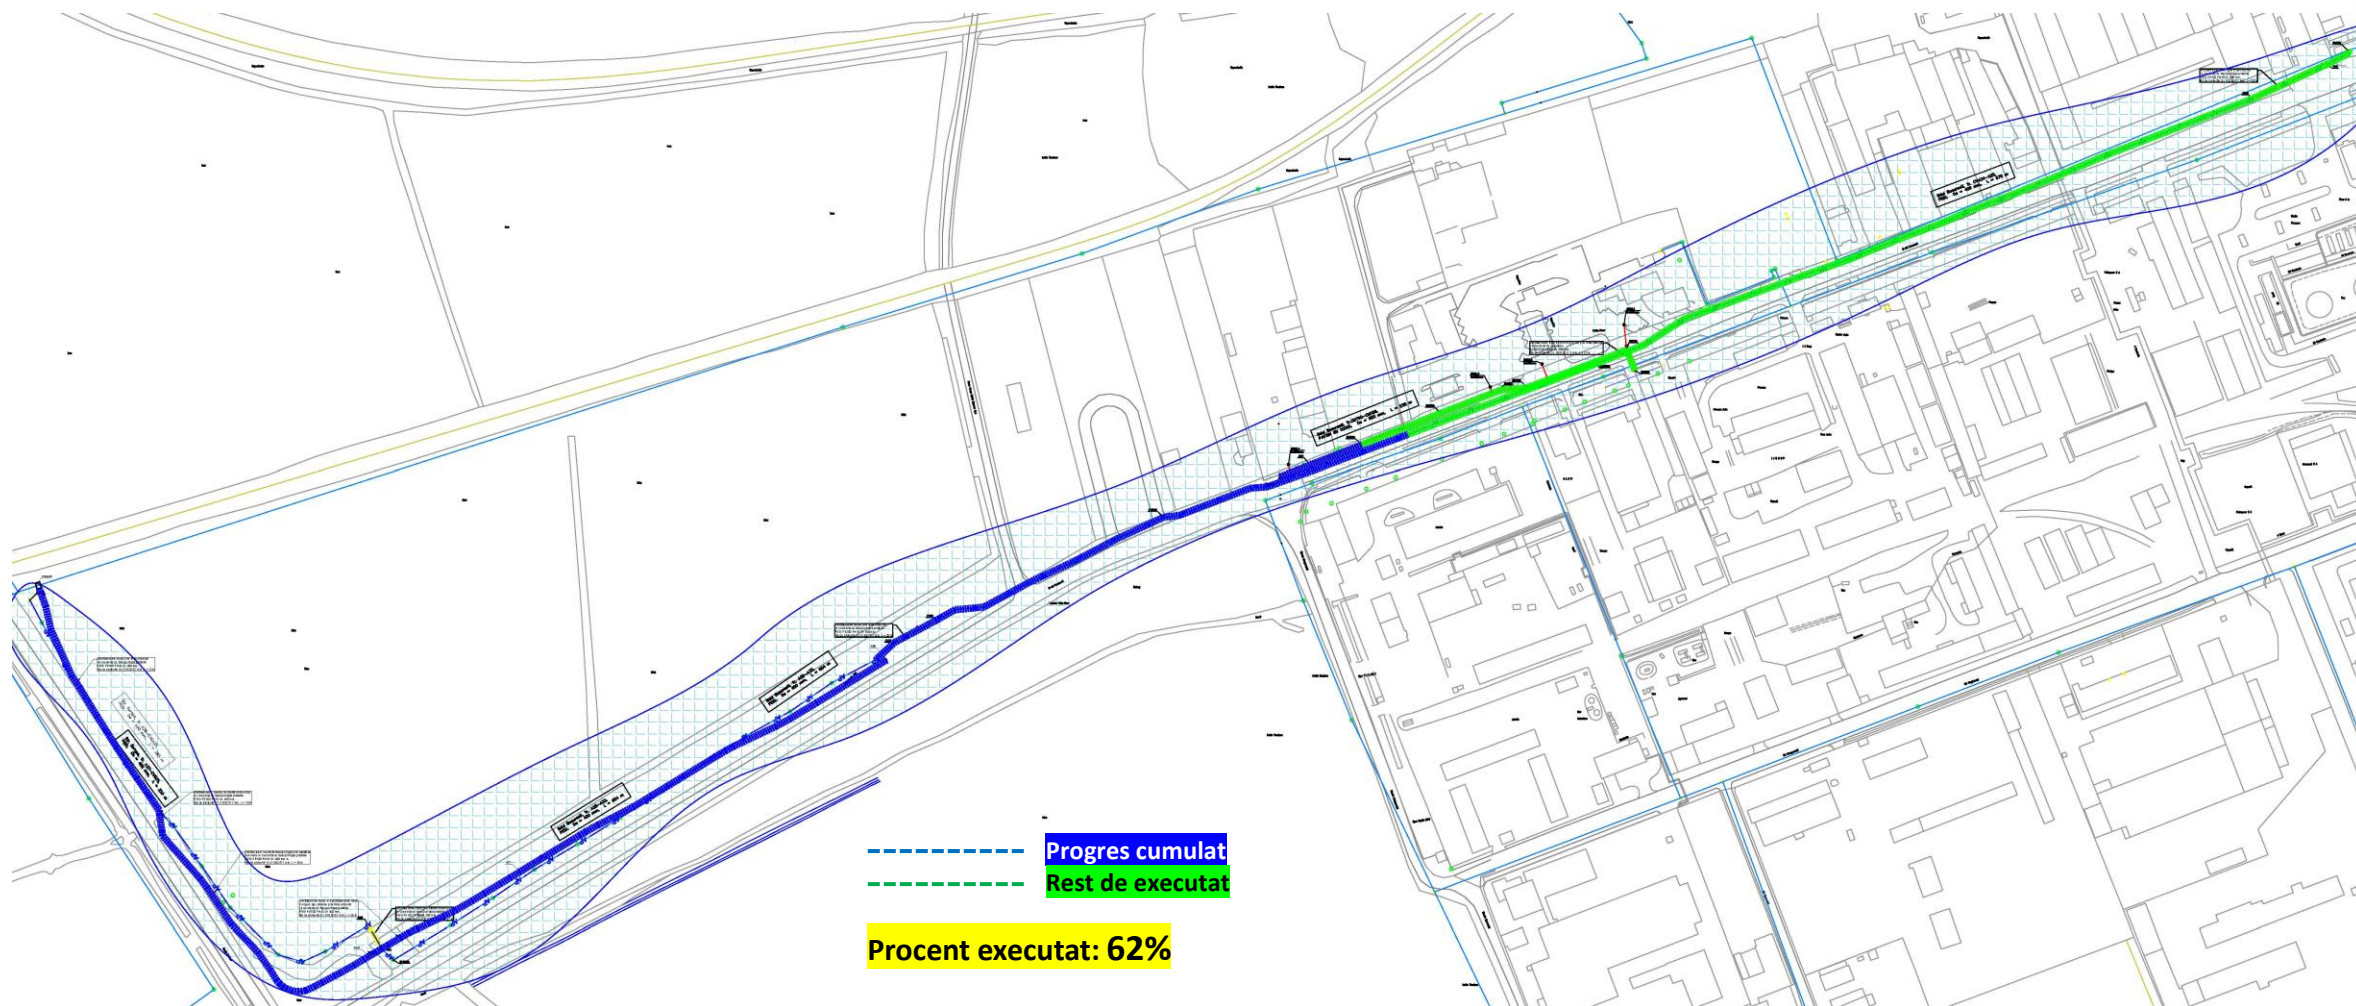


		D1 - Conducte de transport apa / Rețele de distribuție														D5 - Camine de vane și camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea și extinderea rețelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.4 - Extindere conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Bdul Bucuresti-Str. Europa), Tr. CVA34-CVG35	De 400	m	1549	955			594	62		m		0			0	#DIV/0!		buc.	4	4			0	100
Lista Nr.	D-1.4-1																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

- **ZONA DE LUCRU 1.5 – CONSTRUROM SA – B-dul Bucuresti - PEID De400 mm**



- **ZONA DE LUCRU 2.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Vasile Lucaciu - EST**

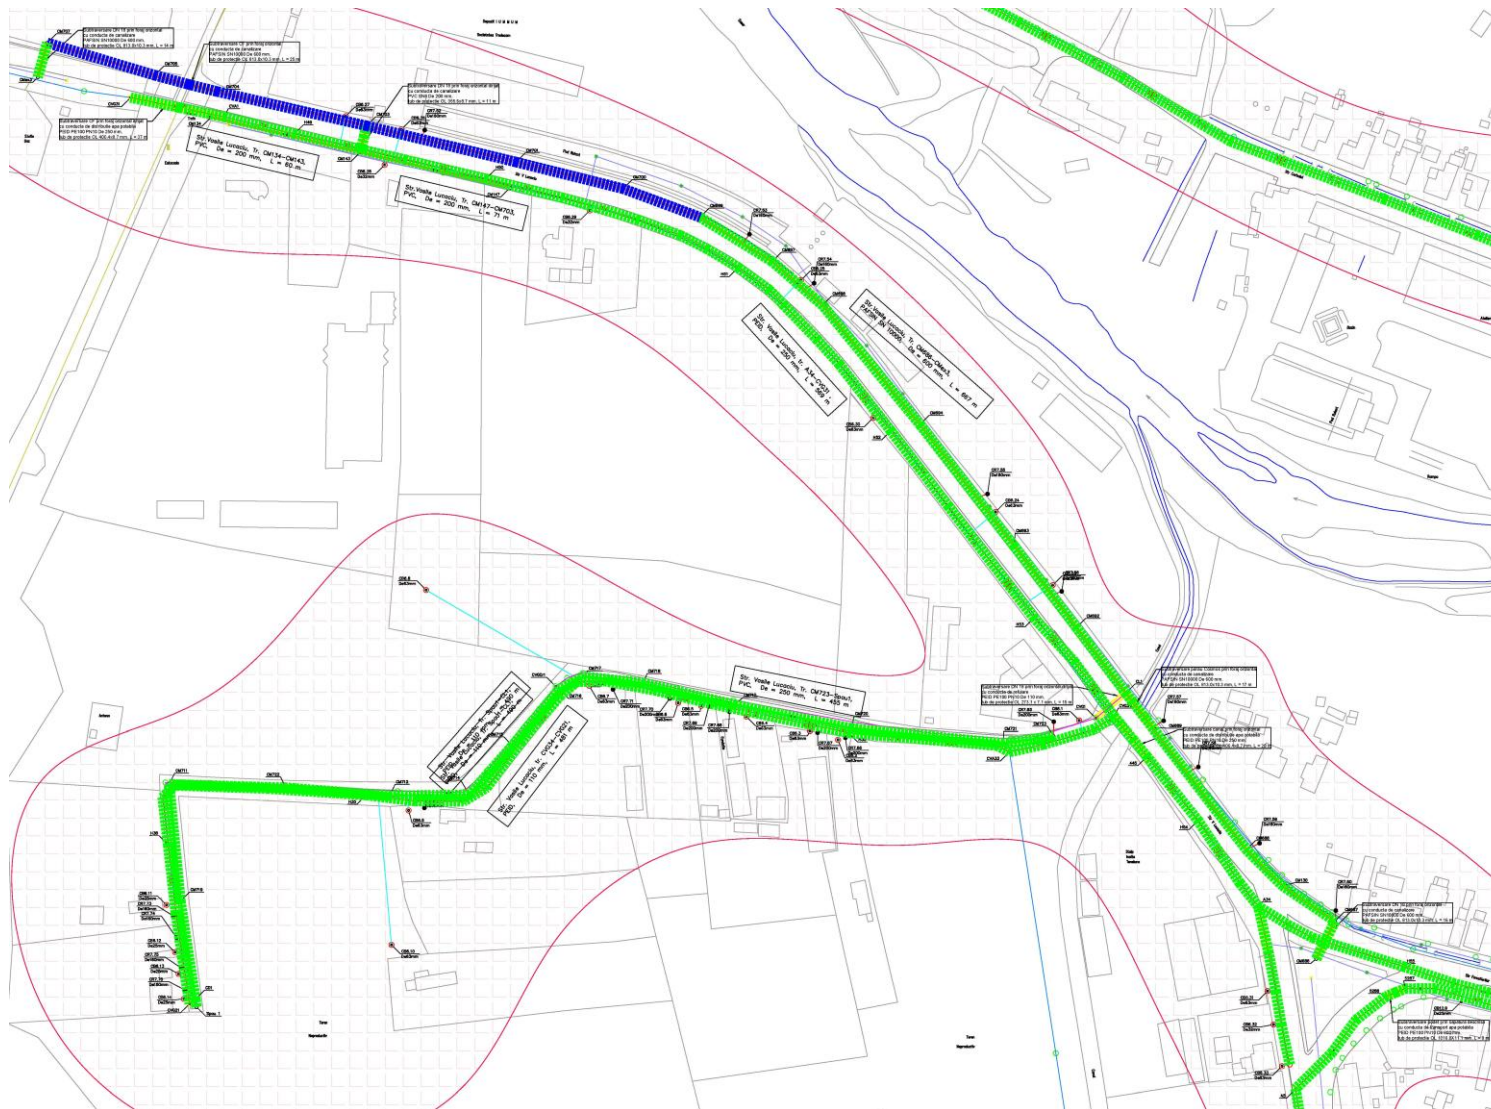

----- Progres cumulativ
----- Rest de executat

Procent executat: 58%

		D2 - Colectoare de canalizare																									
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat		
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																										
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																										
Sectiune	Str. Vasile Lucaciu, Tr. CM134-CM143, Tr. CM147-CM703, Tr. CM686-CMex3, Tr.CM550-CMex15																										
Lista Nr.	D-2.2-24																										
	DN 600	m	595	264				331	44	De 200 De 400	m	518	386				132	75	De 160 De 200	m	600	336				264	56


D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.	29	10			19	34	D 315 DN 800	buc.	60	21			39	35	E-2.2-1	5	0	5	0

- **ZONA DE LUCRU 2.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Vasile Lucaciu - EST**



 Progres cumulativ
 Rest de executat


Procent executat: 88%

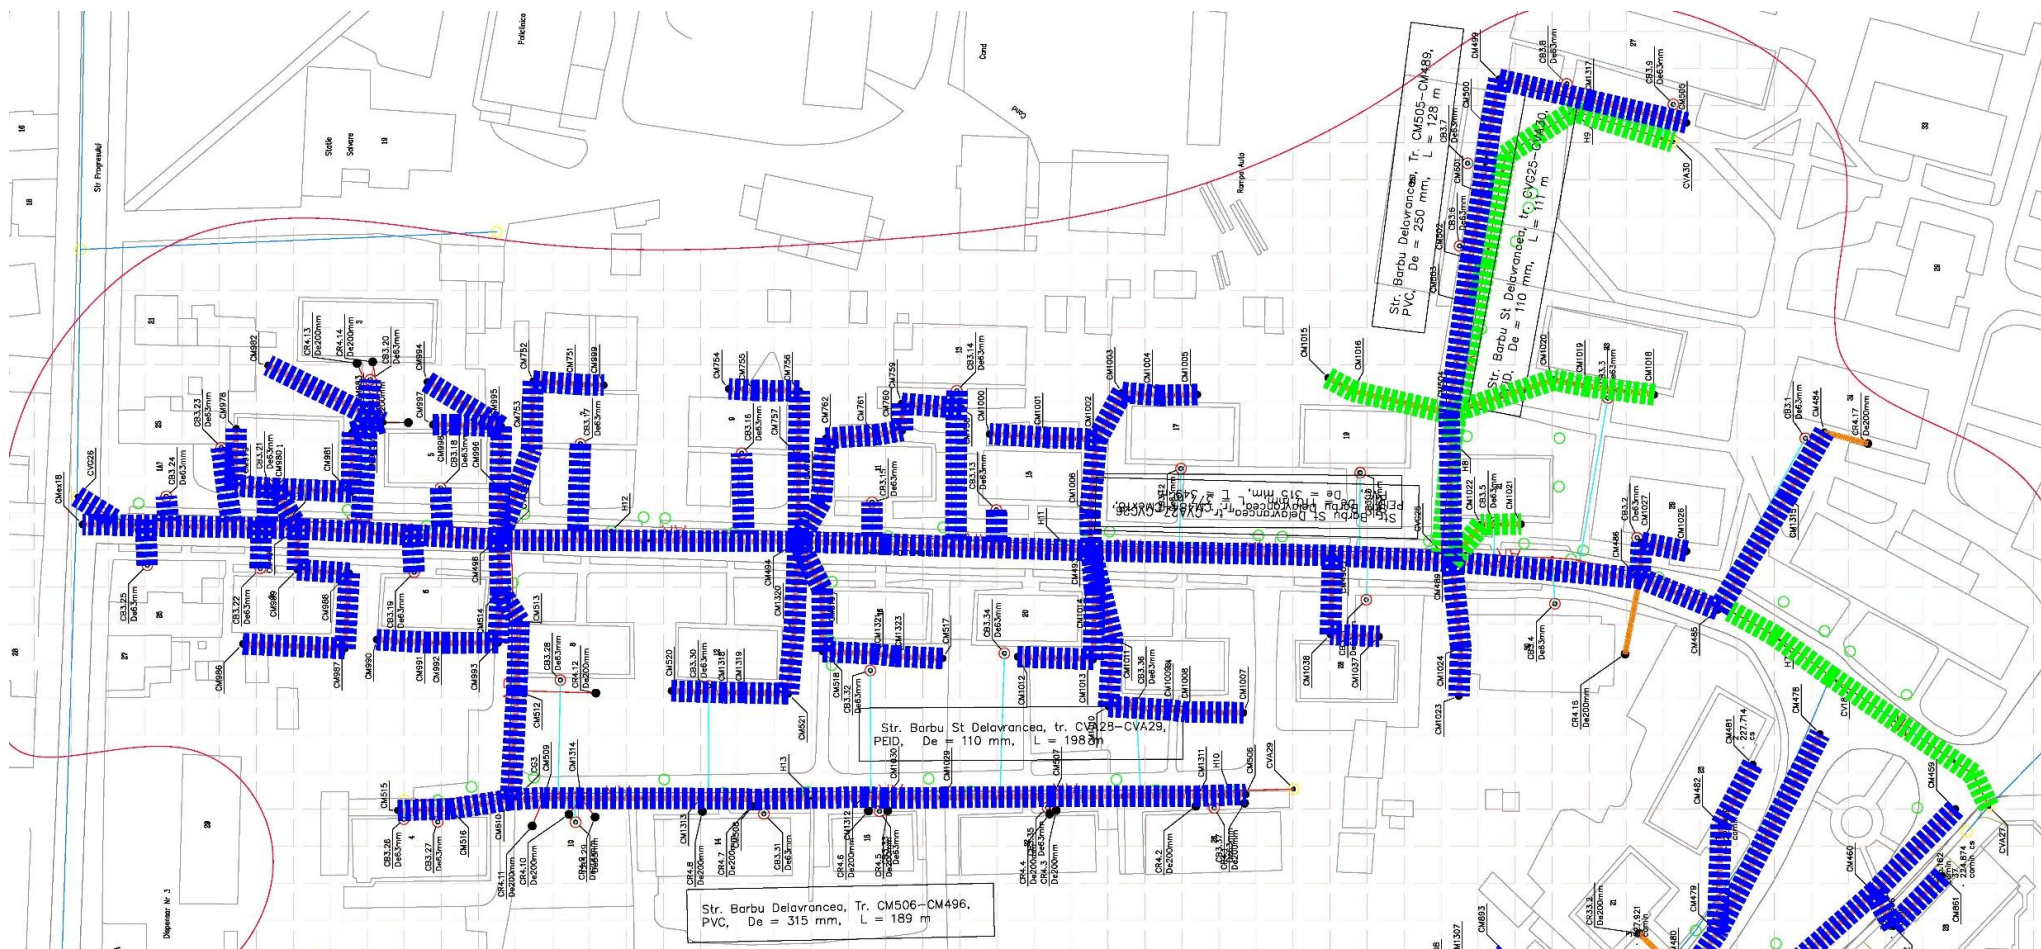


		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Str. Barbu Delavrancea, Tr. CM1000-CM1002, Tr. CM1005-CM493, Tr. CM1007-CM493, Tr. CM1012-CM493, Tr. CM1015-CM504, Tr. CM1018-CM504, Tr. CM1021-CM489, Tr. CM1023-CM489, Tr. CM1026-CM486, Tr. CM1037-CM490, Tr. CM484-CMex18, Tr. CM505-CM489, Tr. CM506-CM496, Tr. CM515-CM510, Tr. CM517-CM494, Tr. CM520-CM494, Tr. CM754-CM494, Tr. CM758-CM494, Tr. CM978-CM980, Tr. CM982-CM497, Tr. CM986-CM497, Tr. CM990-CM514, Tr. CM994-CM496, Tr. CM997-CM995, Tr. CM999-CM496		m		0			0	#DIV/0!	De 200 De 315	m	1438	1262			176	88	De 200	m	170	160			10	94
Lista Nr.	D-2.2-7																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	107	92			15	86	DN 1000	buc.	17	16			1	94			0	0	#DIV/0!

- **ZONA DE LUCRU 2.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barbu Stefanescu Delavrancea**

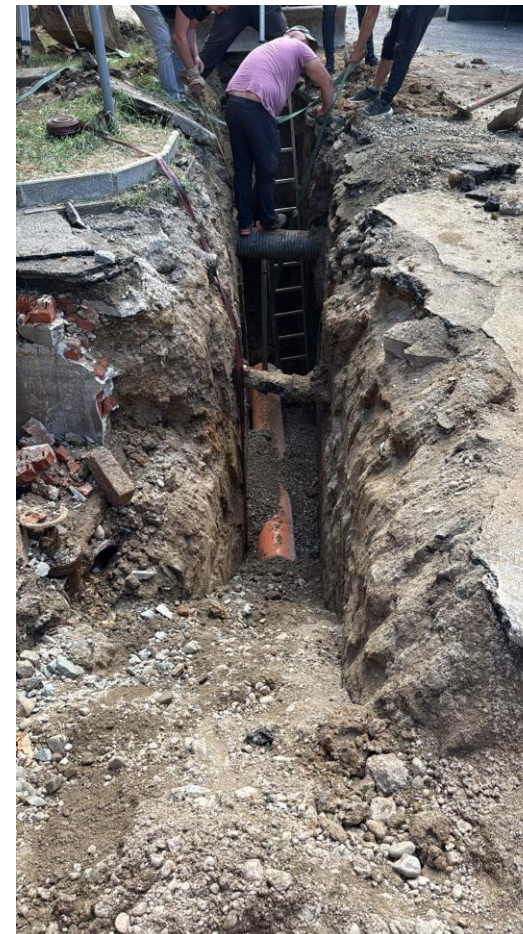

- **ZONA DE LUCRU 2.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. George Cosbuc (intre B-dul Culturii si B-dul Unirii)**

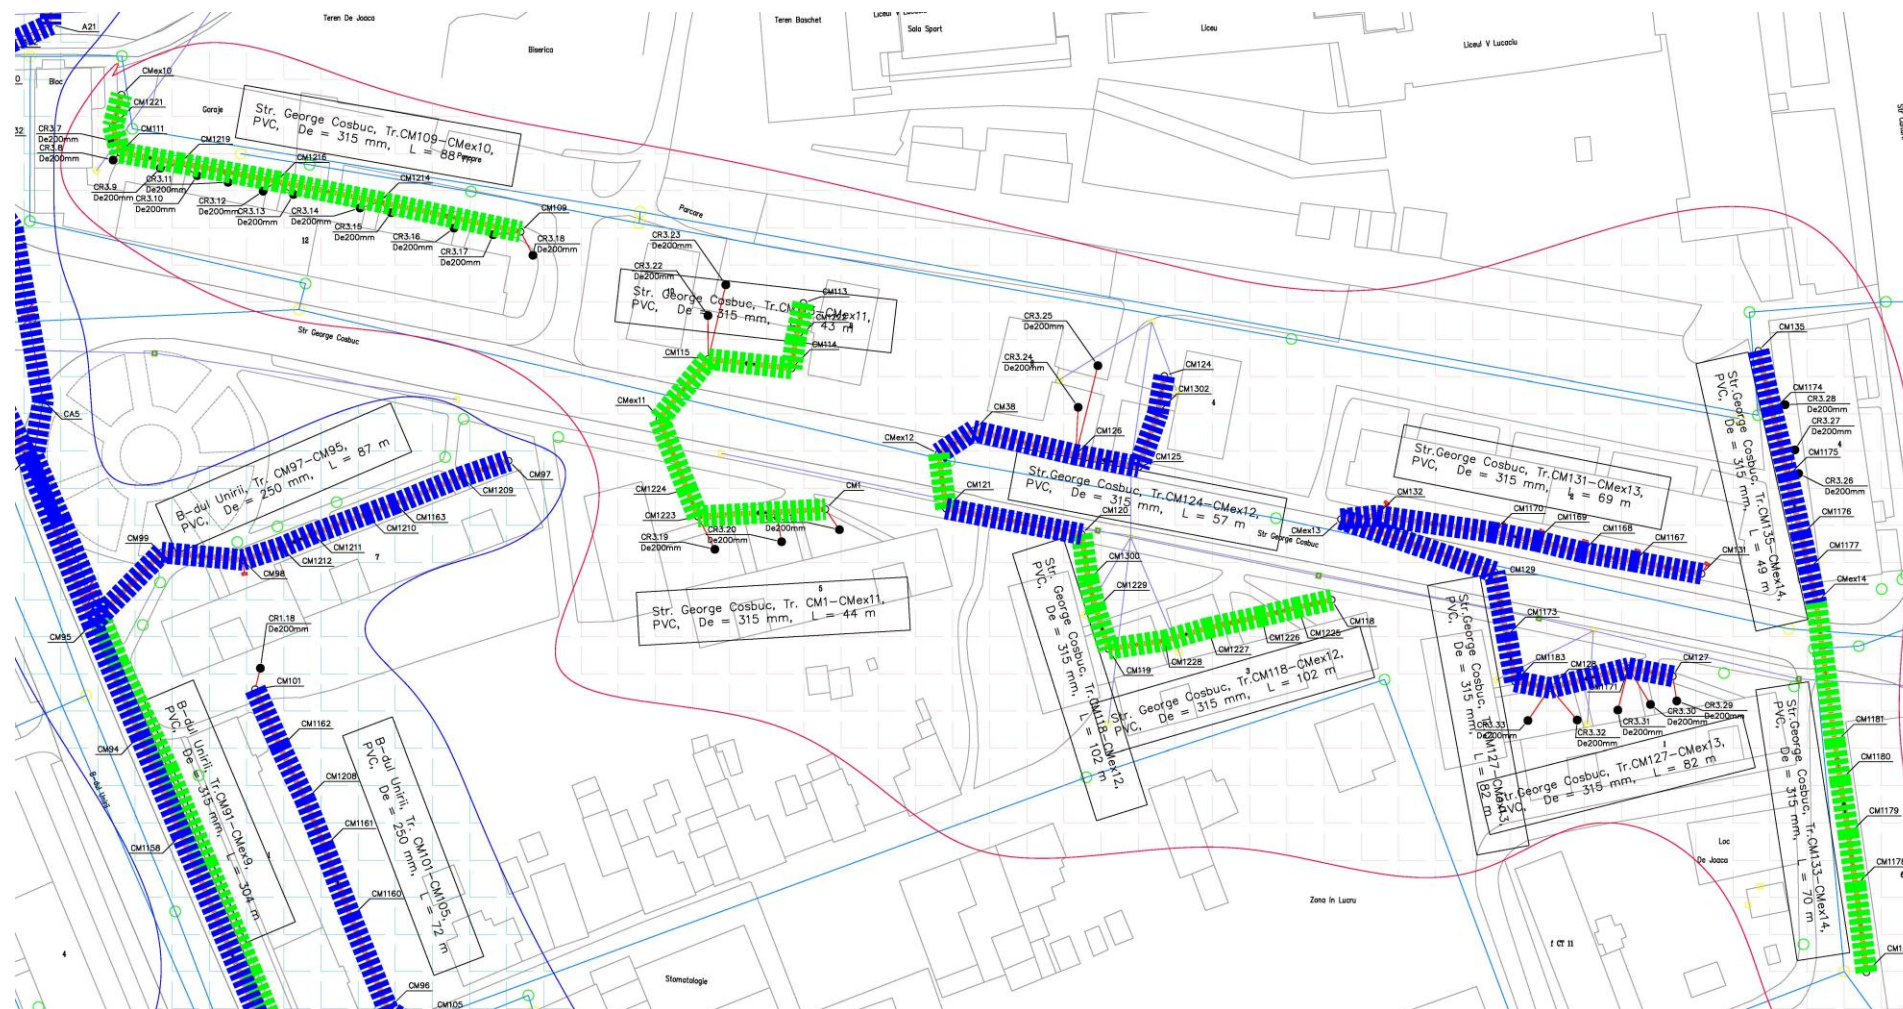

Progres cumulat
Rest de executat


Procent executat: 42%

		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Str. George Cosbuc, Tr. CM1-CMex11, Tr. CM78-CM75, Tr. CM85-CM84, Tr. CM87-CM83, Tr. CM88-CM83, Tr. CM89-CM81, Tr. CM90-CM80, Tr. CM109-CMex10, Tr. CM113-CMex11, Tr. CM118-CMex12, Tr. CM124-CMex12, Tr. CM127-CMex13, Tr. CM131-CMex13, Tr. CM133-CMex14, Tr. CM135-CMex14	DN 800	m	144	0			144	0	De 250 De 315 De 400	m	892	438			454	49	De 200	m	390	96			294	25
Lista Nr.	D-2.2-15																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare							D8 - Camine de racord								Traversari					
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.	70	58			12	83	DN 1000	buc.	33	0			33	0			0	0	#DIV/0!

- **ZONA DE LUCRU 2.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. George Cosbuc (intre B-dul Culturii si B-dul Unirii)**



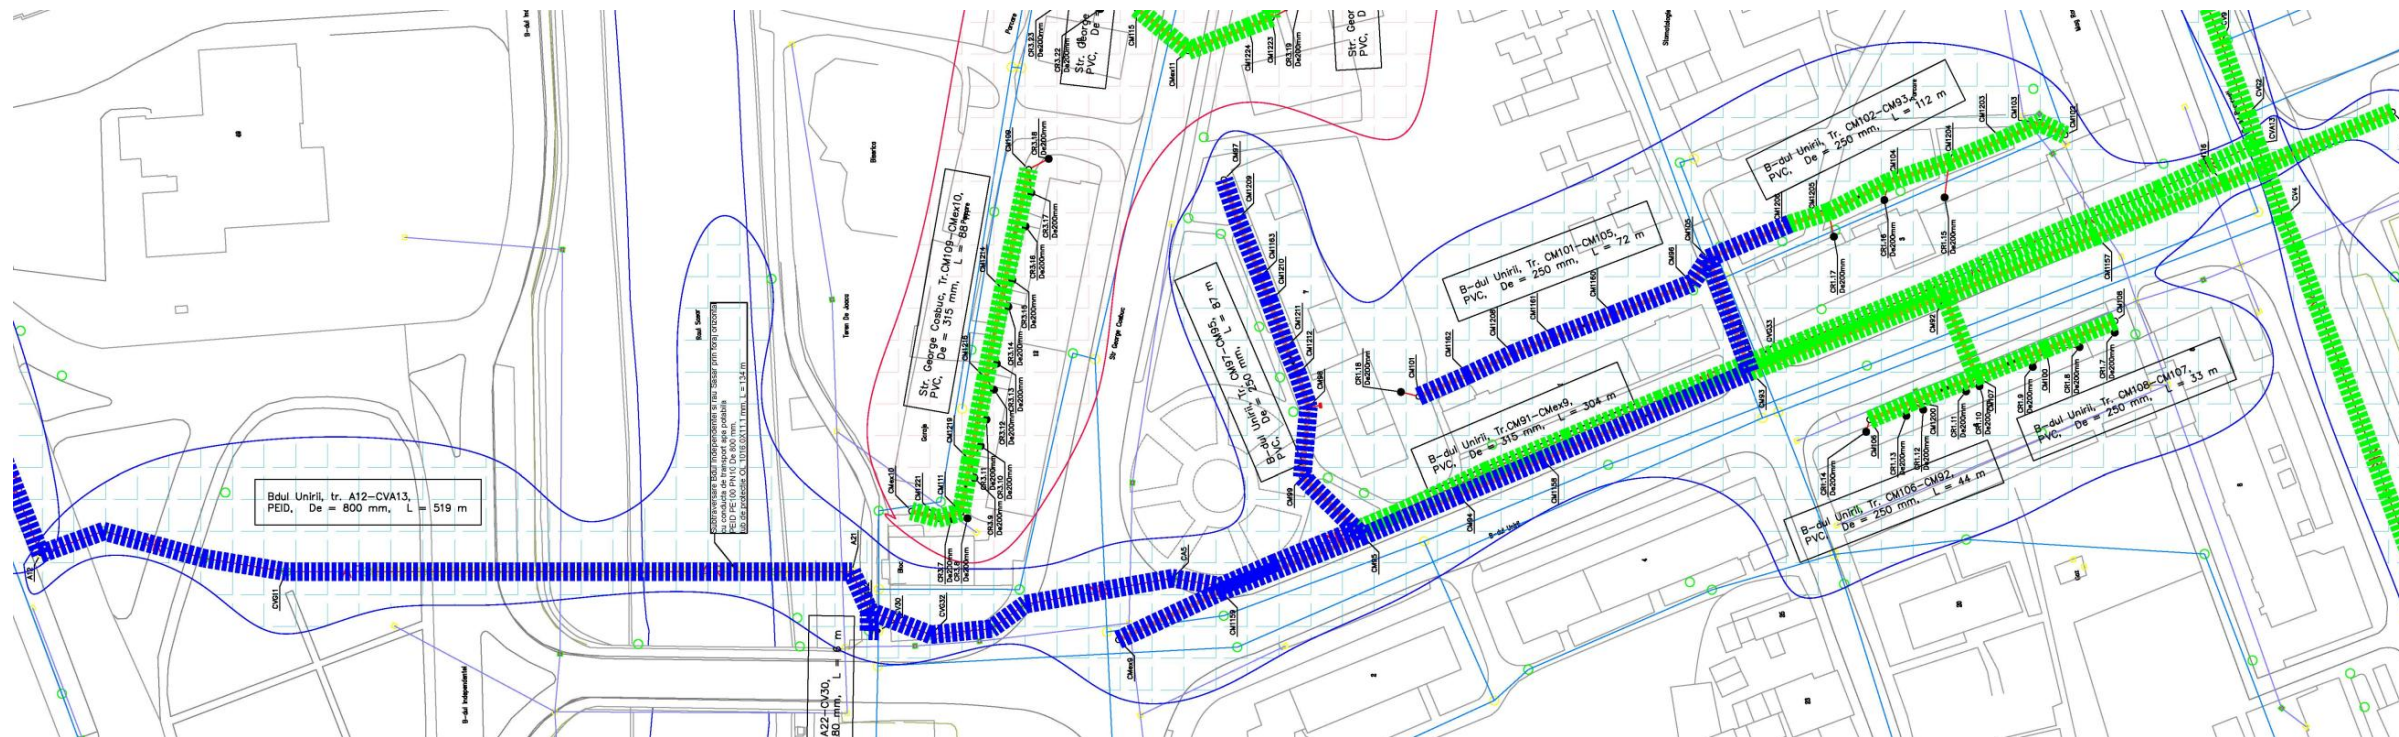

-----	Progres cumulativ
-----	Rest de executat


Procent executat: 53%

		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Bdul Unirii, Tr. CM101-CM105, Tr. CM102-CM93, Tr. CM106-CM92, Tr. CM108-CM107, Tr. CM736-CM600, Tr. CM97-CM95, Tr.CM91-CMex9		m		0			0	#DIV/0!	De 250 De 315	m	994	528			466	53	De 200	m	190	0			190	0
Lista Nr.	D-2.2-10																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	49	30			19	61	DN 800 DN 1000	buc.	18	0			18	0	E-2.2-1	1	0	1	0

- **ZONA DE LUCRU 2.4 – CONSTRUROM SA – B-dul Unirii (intre Str. George Cosbuc si B-dul Bucuresti)**



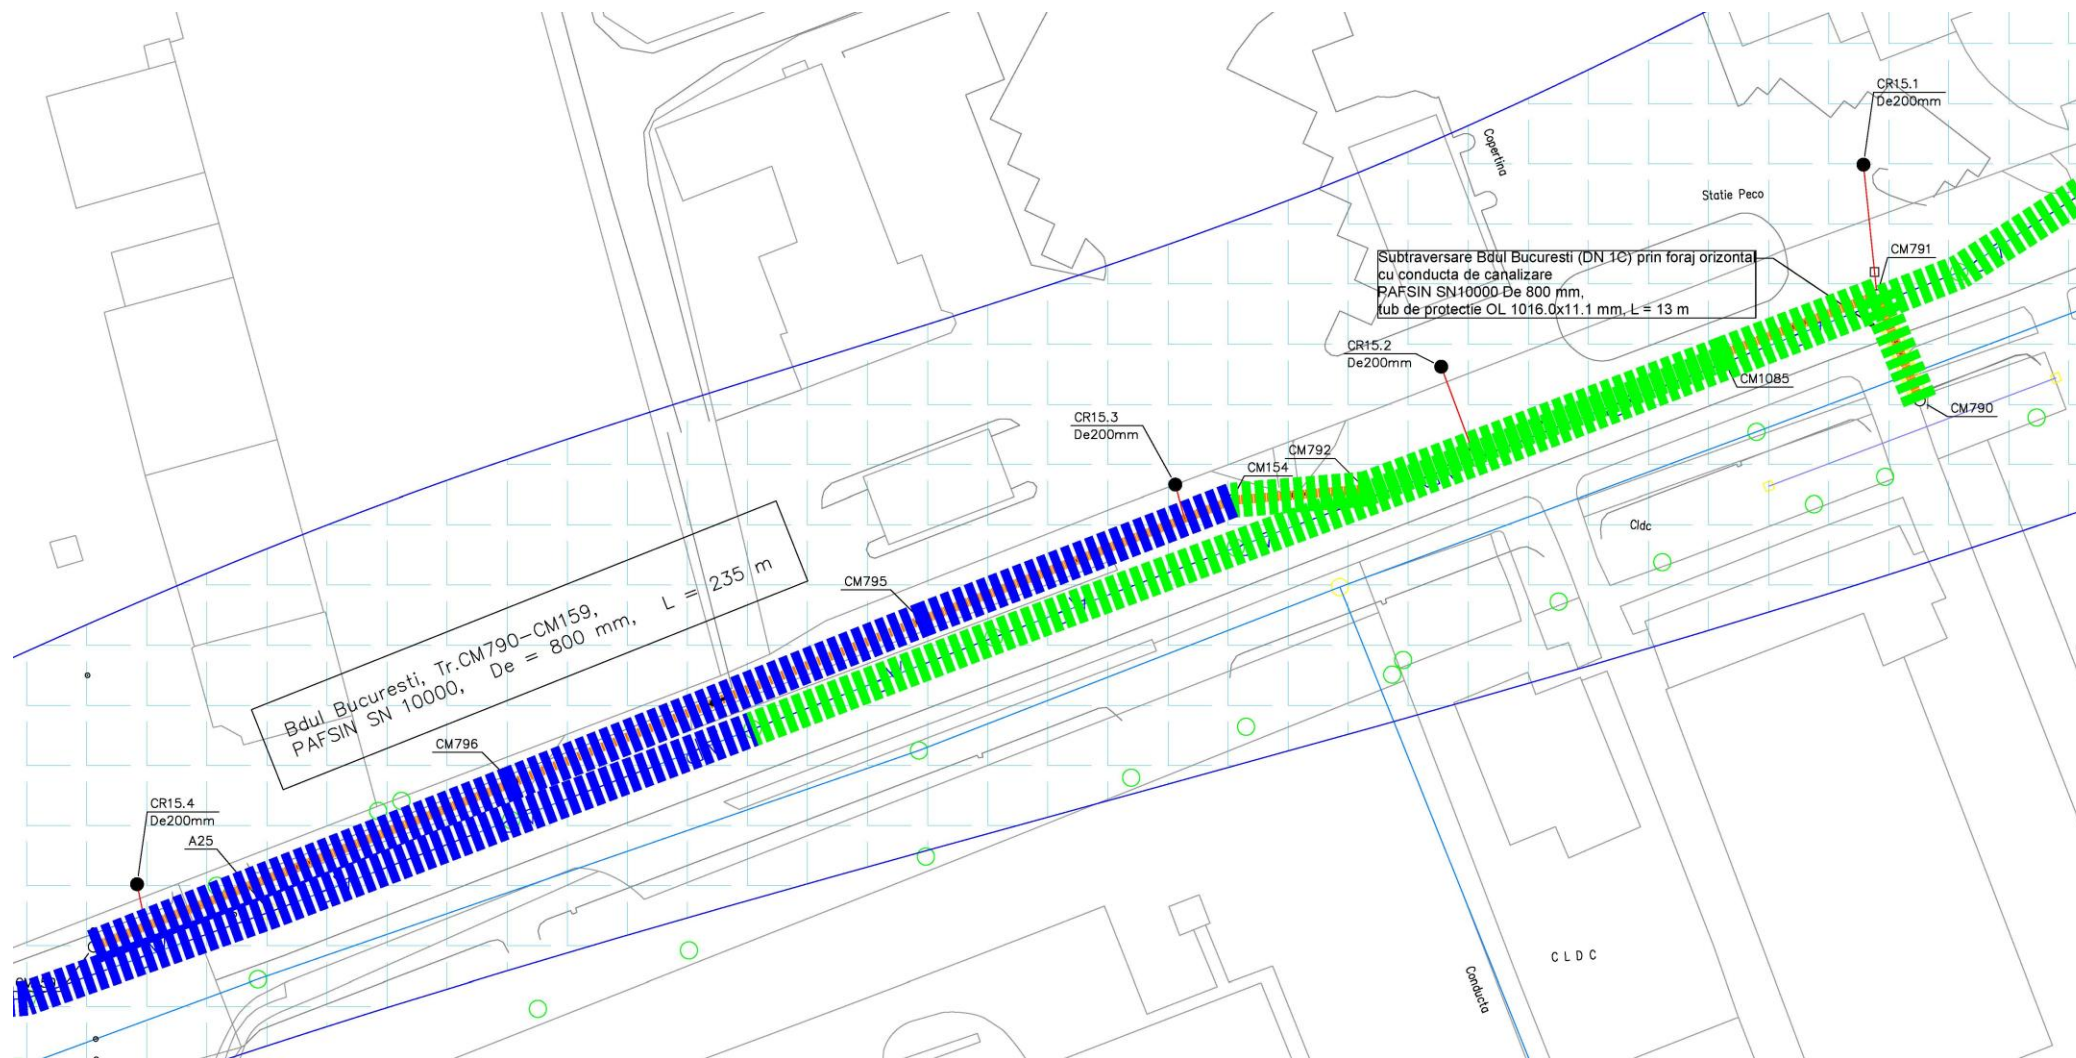


----- Progres cumulat
----- Rest de executat

Procent executat: 58%


		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Bdul Bucuresti, Tr.CM790-CM159																								
Lista Nr.	D-2.2-8																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.	8	4			4	50	DN 800	buc.	4	0			4	0	E-2.2-1	1	0	1	0



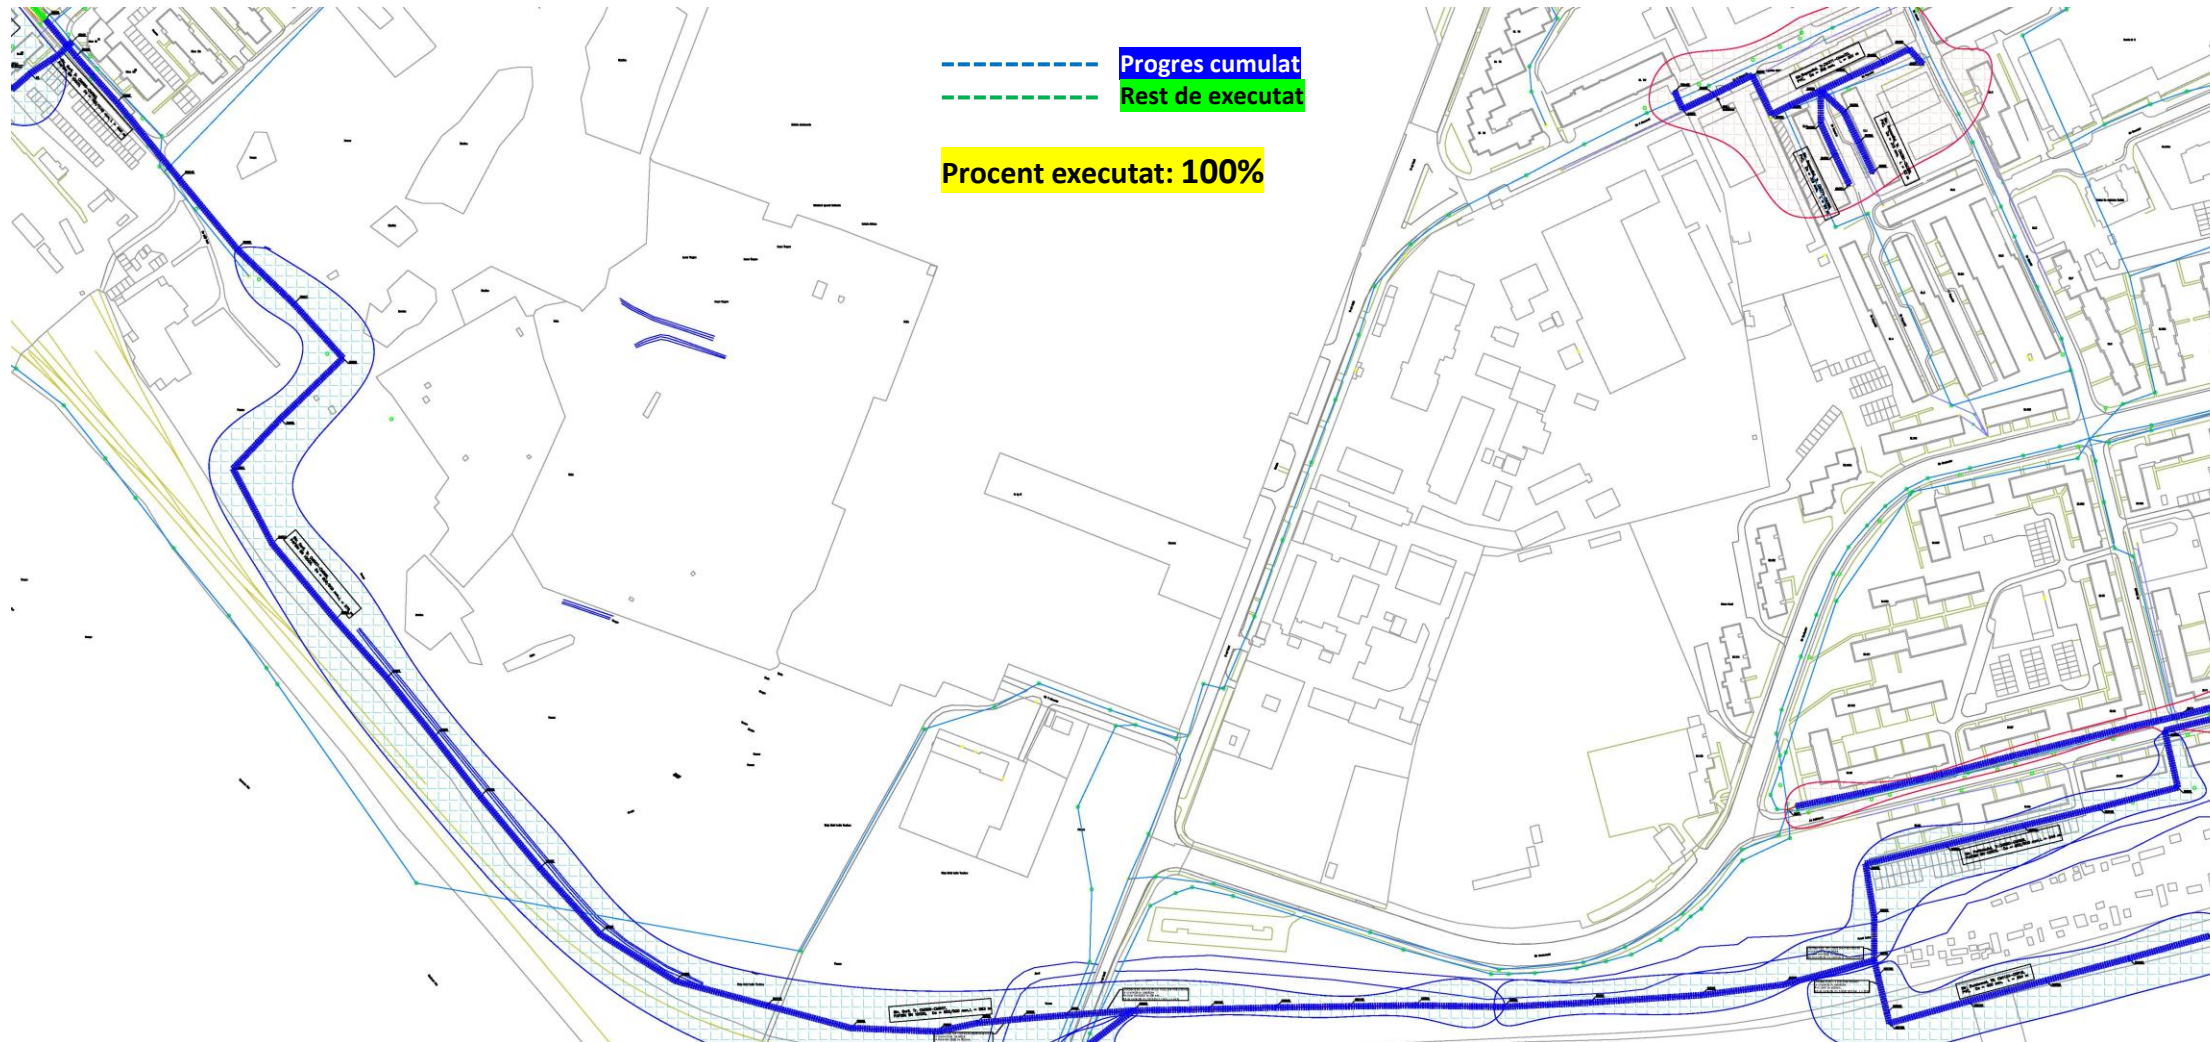

		D2 - Colectoare de canalizare								D5 - Camine de vane si camine de vizitare								Traversari				
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																					
Sub-Obiect	2.3 - Reabilitare colector de canalizare																					
Sectiune	Colector canalizare (Str. Paltinisului - Str. Garii), Tr. CM628-CMex23	DN 800	m	699	699			0	100		buc.	50	54			-4	108	E-2.3-1	1	1	0	100
		De 600/900		1617	1707			-90	106										3	2	1	66.7
		De 760/1140		818			818	0												0	#DIV/0!	
		De 2100/1575		380			380	0												0	#DIV/0!	
Lista Nr.	D-2.3-1			3514	2406	0	0	1108	68									4	3	1	75	

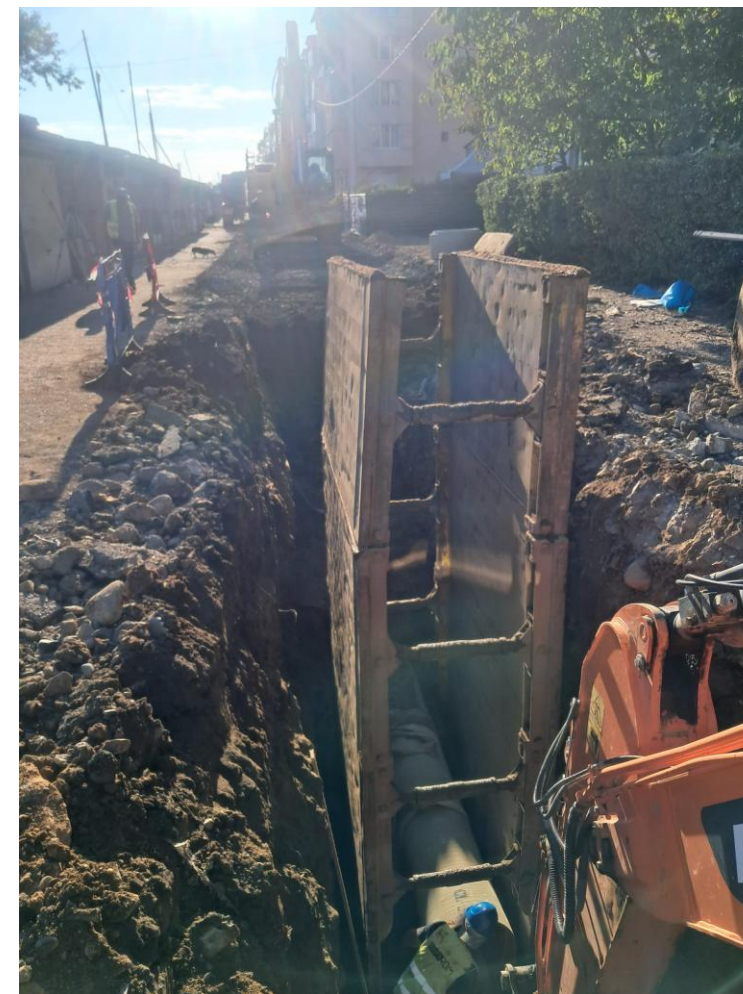

PROGRES GENERAL – MM-CL-06

DIMEX																		
	APA										CANALIZARE							
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI					PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT														
PROIECT	1294	9002	3536	1630	15462	74	151	41		PROIECT	2213	9123	2840	14176	593	226		
EXECUTAT	284	6902	1580	610	9376	23	2	9		EXECUTAT	1529	7563	800	9892	516	110		
PROCENT	21.95	76.7	44.7	37.4	60.6	31.1	1.3	22.0		PROCENT	69.1	82.9	28.2	69.8	87.0	48.7		
CONSTRUROM																		
	APA										CANALIZARE							
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI					PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT														
PROIECT		5694	1520	950	8164	43	87	21		PROIECT	2588	10643	3200	16431	468	266		
EXECUTAT		1123	2309	369	3801	14	42	8		EXECUTAT	2563	10396	1438	14397	464	218		
PROCENT		19.7	151.9	38.8	46.6	32.6	48.3	38.1		PROCENT	99.0	97.7	44.9	87.6	99.1	82.0		
TOTAL																		
	APA										CANALIZARE							
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI					PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT														
PROIECT	1294	14696	5056	2580	23626	117	238	62		PROIECT	4801	19766	6040	30607	1061	492		
EXECUTAT	284	8025	3889	979	13177	37	44	17		EXECUTAT	4092	17959	2238	24289	980	328		
PROCENT	21.95	54.6	76.9	37.9	55.8	31.6	18.5	27.4		PROCENT	85.2	90.9	37.1	79.4	92.4	66.7		

PROGRES GENERAL PE OBIECTE – MM-CL-06

Obiect	1	Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	m	1294	284	-	284	21.95
Sub-Obiect	1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	m	13147	6902	1123	8025	61.04
Sub-Obiect	1.3	Reabilitarea retelei de distributie apa potabila	m	4883	1580	1185	2765	56.63
Sub-Obiect	1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	m	1549	-	955	955	61.65
Sub-Obiect	1.5	Extinderea retelei de distributie apa potabila	m	173	-	169	169	97.69
Sub-Obiect	1.6	Statie de pompare apa potabila	buc.	1	0	-	0	0.00
Obiect	2	Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	2.1	Extindere retea de canalizare	m	5393	362	4495	4857	90.06
Sub-Obiect	2.2	Reabilitare retea de canalizare	m	16858	8031	6757	14788	87.72
Sub-Obiect	2.3	Reabilitare colector de canalizare	m	3514	-		2406	68.47
Sub-Obiect	2.4	Statii de pompare apa uzata si conducta de refulare						
		<i>Statii de pompare apa uzata</i>	buc.	2	0	0	0	0.00
		<i>Conducte de refulare</i>	m	1649	0	1174	1174	71.19
Sub-Obiect	2.5	Reabilitare deversor, B-dul Bucuresti	buc.	1	-	0	0	0.00

FLUX DE NUMERAR– MM-CL-06

Nr. crt.	An	Luna	Cereri de plată acceptate	Valoare cereri de plată acceptate	Valoare avans	Returnare avans (25%)	Returnare avans cumulat	Valoare certificata lunar	Valoare certificata cumulata	Valoare de plata in luna...1)	Valoare de plata cumulata in luna... 1)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2025	ianuarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		februarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		martie	0.00	0.00	1,260,599.58	0.00	0.00	1,260,599.58	1,260,599.58	1,260,599.58	1,260,599.58
4		aprilie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,599.58	0.00	1,260,599.58
5		mai	0.00	0.00	14,736,857.10	0.00	0.00	14,736,857.10	15,997,456.68	14,736,857.10	15,997,456.68
6		iunie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997,456.68	0.00	15,997,456.68
7		iulie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997,456.68	0.00	15,997,456.68
8		august	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997,456.68	0.00	15,997,456.68
9		septembrie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997,456.68	0.00	15,997,456.68
10		octombrie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997,456.68	0.00	15,997,456.68
11		noiembrie	4,947,992.30	4,947,992.30	0.00	1,236,998.08	1,236,998.08	3,710,994.23	19,708,450.91	3,710,994.23	19,708,450.91
12		decembrie	11,637,219.50	16,585,211.80	0.00	2,909,304.88	4,146,302.95	8,727,914.63	28,436,365.53	8,727,914.63	28,436,365.53
13	2026	ianuarie	0.00	16,585,211.80	0.00	0.00	4,146,302.95	0.00	28,436,365.53	0.00	28,436,365.53
14		februarie	0.00	16,585,211.80	0.00	0.00	4,146,302.95	0.00	28,436,365.53	0.00	28,436,365.53
15		martie	0.00	16,585,211.80	0.00	0.00	4,146,302.95	0.00	28,436,365.53	0.00	28,436,365.53
16		aprilie	11,801,238.50	28,386,450.30	0.00	3,296,912.40	7,443,215.35	8,504,326.10	36,940,691.63	8,504,326.10	36,940,691.63
17		mai	12,504,490.92	40,890,941.22	0.00	8,554,241.33	15,997,456.68	3,950,249.59	40,890,941.22	3,950,249.59	40,890,941.22
18		iunie	8,597,331.49	49,488,272.71	0.00	0.00	0.00	8,597,331.49	49,488,272.71	8,597,331.49	49,488,272.71
19		iulie	7,137,405.68	56,625,678.39	0.00	0.00	0.00	7,137,405.68	56,625,678.39	7,137,405.68	56,625,678.39
20		august	17,104,276.18	73,729,954.57	0.00	0.00	0.00	17,104,276.18	73,729,954.57	17,104,276.18	73,729,954.57
21		septembrie	23,350,598.69	97,080,553.26	0.00	0.00	0.00	23,350,598.69	97,080,553.26	23,350,598.69	97,080,553.26
22		octombrie	21,763,411.64	118,843,964.90	0.00	0.00	0.00	21,763,411.64	118,843,964.90	21,763,411.64	118,843,964.90
23		noiembrie	14,642,465.76	133,486,430.67	0.00	0.00	0.00	14,642,465.76	133,486,430.67	14,642,465.76	133,486,430.67
24		decembrie	9,147,222.71	142,633,653.38	0.00	0.00	0.00	9,147,222.71	142,633,653.38	9,147,222.71	142,633,653.38
25	2027	ianuarie	4,679,884.64	147,313,538.02	0.00	0.00	0.00	4,679,884.64	147,313,538.02	4,679,884.64	147,313,538.02
26		februarie	4,625,242.14	151,938,780.16	0.00	0.00	0.00	4,625,242.14	151,938,780.16	4,625,242.14	151,938,780.16
27		martie	2,485,908.89	154,424,689.04	0.00	0.00	0.00	2,485,908.89	154,424,689.04	2,485,908.89	154,424,689.04
28		aprilie	2,417,150.00	156,841,839.04	0.00	0.00	0.00	2,417,150.00	156,841,839.04	2,417,150.00	156,841,839.04
29		mai	1,495,291.65	158,337,130.69	0.00	0.00	0.00	1,495,291.65	158,337,130.69	1,495,291.65	158,337,130.69
30		iunie	1,417,150.00	159,754,280.69	0.00	0.00	0.00	1,417,150.00	159,754,280.69	1,417,150.00	159,754,280.69
	2032	iunie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,754,280.69	0.00	159,754,280.69
TOTAL (lei fara TVA)			159,754,280.69	159,754,280.69	15,997,456.68	15,997,456.68	7,443,215.35	159,754,280.69	159,754,280.69	159,754,280.69	159,754,280.69
TOTAL (lei cu TVA inclus)			190,107,594.03	190,107,594.03	19,036,973.45	19,036,973.45	8,857,426.27	190,107,594.03	190,107,594.03	190,107,594.03	190,107,594.03

ZONE INCEPERE LUCRARI OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2026:

- 1. Str. Vasile Lucaciu – extindere retea de canalizare, SPAU si conducta de refulare**
