



Sedinta lunara de progres IULIE 2026

***PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES
SMIS+ 322218***

**MM-CL-10 „ Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus,
Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte ”**

MM-CL-10 „*Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte*”

• 1. DETALII CONTRACT

- Contract nr. 196/28.07.2025 MM-CL-10 „*Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte*”
- Program
 - « *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Maramures* », finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Dezvoltare Durabila 2021 - 2027
- Contractor
 - *Asocierea PRODEXIMP SRL – ALAVAL PROD COM SRL – DACIA ASPHALT SRL*
- Valoarea Contractului LEI
 - **175.247.779,82 lei (fara TVA)**
- Data acordului
 - **28.07.2025**
- Autorizatie de construire
 - **Nr. 37 din 26.09.2025**
- Autorizatie de construire organizare de santier
 - **UAT Viseu de Sus – Nr. 2 din 30.01.2026**
 - **UAT Bocicoiu Mare – Nr. 3 din 28.01.2026**
 - **UAT Poienile de Sub Munte – Nr. 1 din 12.02.2026**
- Durata contractului:
 - **30 LUNI**
- Perioada de garantie
 - **36 LUNI**

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPER AFERENTE LUCRARILOR nr. 1 / 27.02.2026; nr. 4 / 30.03.2026

- OBIECTIV 1:

- Reabilitare conducta de transport apa potabile – L = 676 m;
- Extindere conducta de transport apa potabile – L = 5.202 m;
- Reabilitare retea de distributie apa potabile – L = 1.595 m;
- Extindere retea de distributie apa potabile – L = 20.570 m;
- Extindere statii de pompare apa potabile – L = 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA1 (existenta) – Str. Aurel Vlaicu: reabilitare rezervor inmagazinare 1.000 m² – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA2 (noua) – Str. Frasinului: rezervor nou inmagazinare 250 m² – 1 buc. si statie noua clorinare – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA3 (noua) – Str. 1 Mai: statie noua de pompare Q_p = 5 l/s, H_p = 200 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon – 150m² – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA4 (noua) – Str. Randunelelor (DN18): statie noua pompare Q_p = 5 l/s, H_p = 60 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon 150 m² – 1 buc. si statie noua de clorinare - 1 buc.
- Front de captare existent: reabilitare rezervor 150 m³, reabilitare rezervor de inmagazinare 150 m³ = 1 buc.

- OBIECTIV 2:

- Extindere retea canalizare – L = 9.417 m;
- Extindere statii de pompare apa uzata si conducte de refulare apa uzata - 8 buc. SPAU, L = 1.641 m

WISEU DE SUS

• **PROGRES FIZIC**

WISEU DE SUS

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate)
UAT VISEU DE SUS						
Obiect VS-1 REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN LOCALITATEA VISEU DE SUS						
VS-1.3 Reabilitare retea de distributie apa potabila		Conform contract				
1	Str. Branduselor 1 Tr 1	157	110	157	0	
2	Str. Branduselor 2 Tr 1	244	110	135	0	
3	Str. Mierlei4 Tr 1	124	110	123	0	
4	Str. Zavoi Tr 1	94	110	90	0	
5	Str. Paraului Tr 1	186	110	120	13	
TOTAL				625	13	
VS-1.4 Extindere retea distributie apa potabila		Conform contract				
1	Str. Valea Raului TRONSON 3	374	110	201	0	
2	Str. Valea Raului TRONSON 4	178	110	399	0	
3	Str. Valea Raului TRONSON 5	400	110	400	0	
4	Str. Valea Raului TRONSON 6	311	110	311	0	
5	Str. Valea Raului TRONSON 6_1	178	110	178	0	
6	Str. Valea Raului TRONSON 6_2	263	110	263	0	
7	Str. Valea Raului TRONSON 7	394	110	394	0	
8	Str. Valea Raului TRONSON 8	374	110	374	0	
9	Str. Valea Raului TRONSON 9	390	110	390	0	
10	Str. Valea Raului TRONSON 10	394	110	337	0	
11	Str. Mierlei 5 TRONSON 1	96	110	96	0	
12	Str. Mierlei 11 TRONSON 1	293	110	272	0	
13	Str. Valea Scardei TRONSON 1	365	110	286	0	
14	Str. Borcutului TRONSON 1	376	110	291	0	
15	Str. Borcutului TRONSON 2	386	110	386	0	
16	Str. Borcutului TRONSON 3	380	110	31	349	
17	Str. Borcutului TRONSON 4	380	110	0	380	
18	Str. Borcutului TRONSON 5	298	110	0	163	
TOTAL				4,609	892	


• **PROGRES FIZIC**

WISEU DE SUS

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate
UAT VISEU DE SUS						
Obiect VS-2 REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN LOCALITATEA VISEU DE SUS						
VS-2.1 Extindere retea de canalizare		Conform contract				
1	Str. Mierlei 2 Tr 3	73	250	26	0	
2	Str. Zavoi Tr 1	175	250	119	0	PV etanseitate FD- 16.07.2026
3	Str. Branduselor Tr1	143	250	109	0	PV etanseitate FD- 16.07.2026
4	Str. Mierlei 4 Tr 1	286	250	255	0	PV etanseitate FD- 22.07.2026
5	Str. Mierlei 5 Tr 1	96	250	96	0	PV etanseitate FD- 16.07.2026
6	Str. Paraului Tr 1	188	250	140	14	PV etanseitate FD- 16.07.2026
7	Str. Mierlei 13 Tr 1	134	250	130	0	PV etanseitate FD- 16.07.2026
8	Str. Mierlei 14 Tr2	144	250	139	0	PV etanseitate FD- 16.07.2026
9	Str. Mierlei 14 Tr1	46	250	0	46	PV etanseitate FD- 16.07.2026
10	Str. Nuferilor Tr1	182	250	0	63	
TOTAL				1014	123	
VS-2.2.2 Extindere statii de pompare apa uzata		Conform contract				
1	SPAU 6 (str. Branduselor 2 TR1) str. Zavoi Tr1	174	90	174	0	
2	SPAU 8 (str. Mierlei 11)	300	140	280	0	
TOTAL				454	0	

*Lucrari aflate
in executie*

WISEU DE SUS
Apa

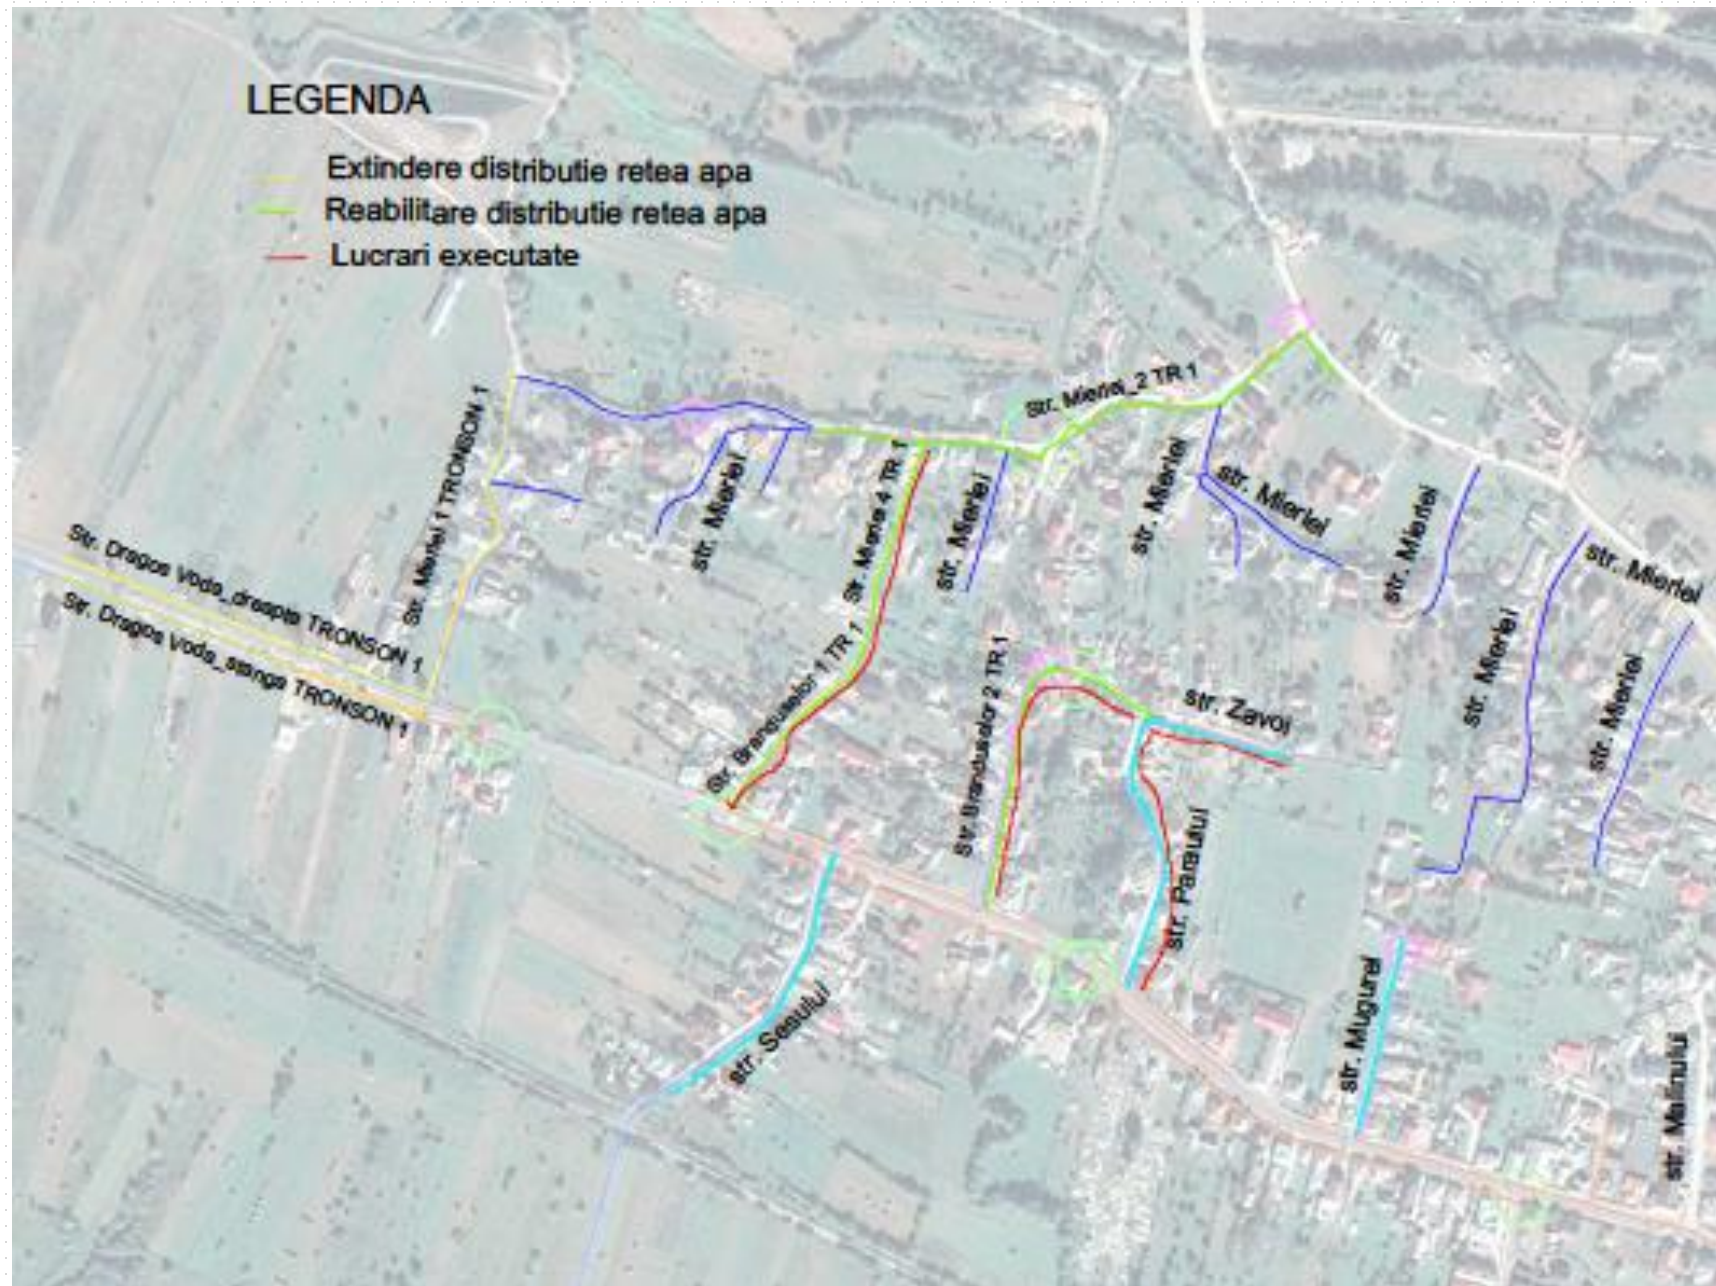


*Lucrari aflate
in executie*

WISEU DE SUS
Apa




*Lucrari aflate
in executie*

*WISEU DE SUS
Apa*

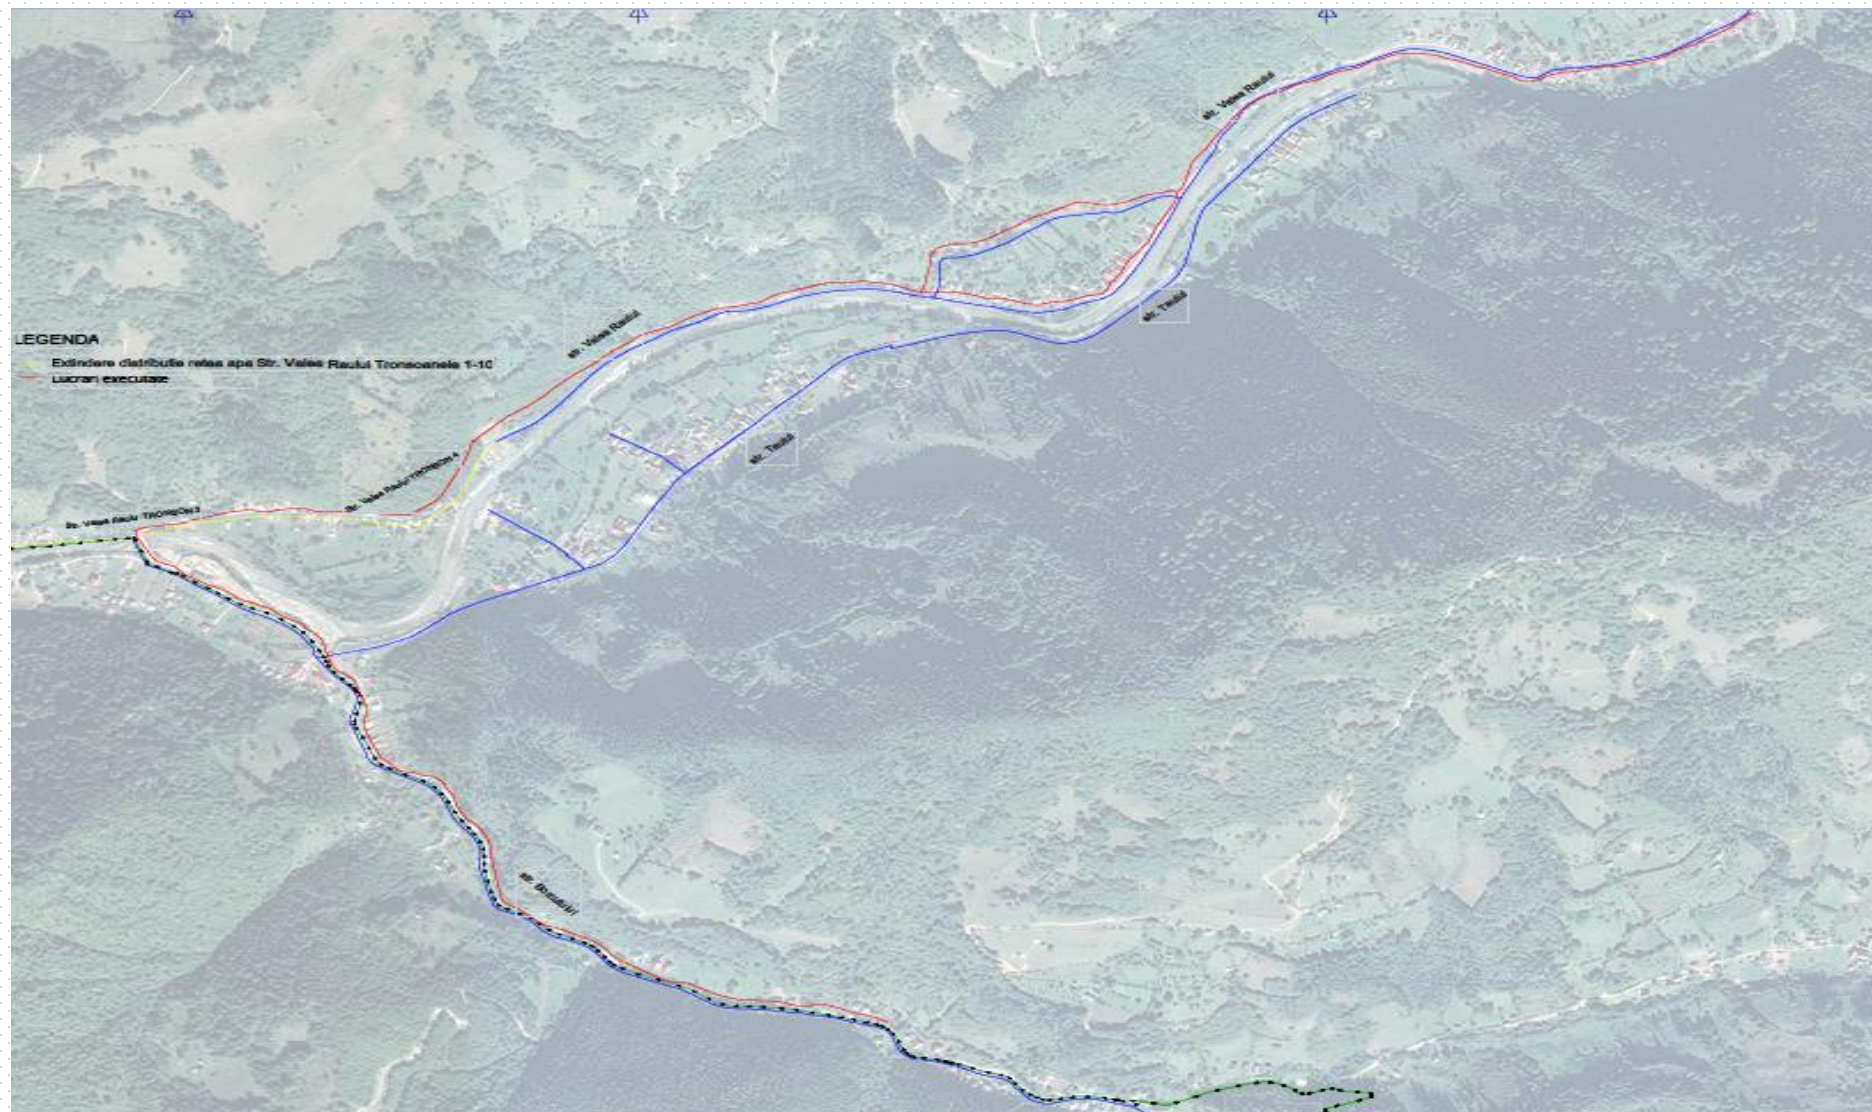

*Lucrari aflate
in executie*

WISEU DE SUS
Apa uzata

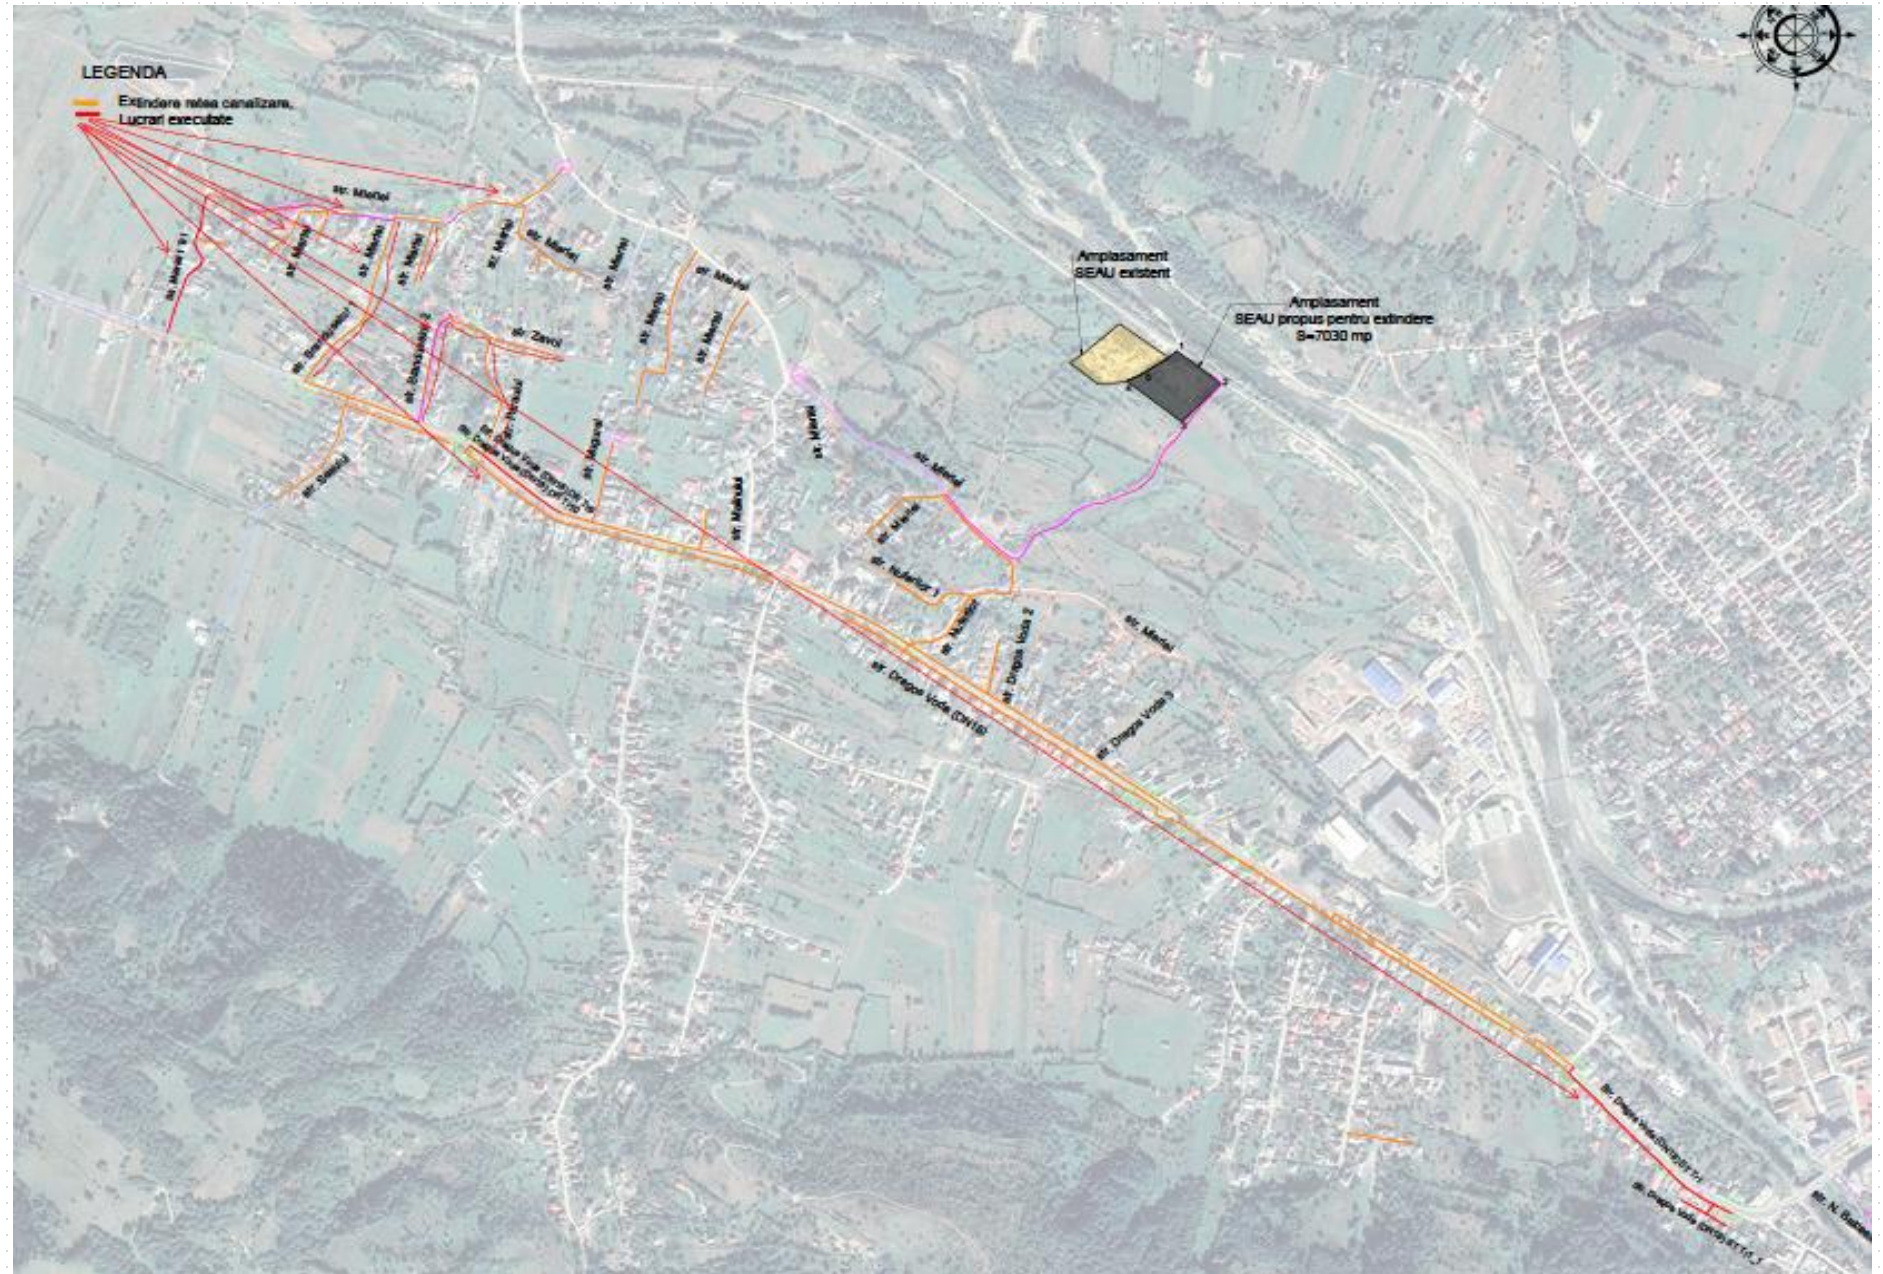

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SIA BORNELOR DE
REPER AFERENTE LUCRARILOR nr. 2/02.03.2026, nr. 5 / 06.04.2026

• OBIECTIV 1:

- Extindere retea de distributie – L = 31.773 m;
- Statie de pompare GA Craciunesti – 1 buc.;
- Gospodaria de apa: rezervor nou de inmagazinare 500 m³ – 2 buc.;
- Statie noua de clorinare – 1 buc.;
- Conducta de transport apa potabile – L = 3.201 m;

• OBIECTIV 2:

- Extinderea sistemului de apa uzata – L = 23.486 m;

• OBIECTIV 3:

- Statie de pompare apa uzata SPAU 1 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 2 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 3 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 4 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 5 – 1 buc.;

• OBIECTIV 4:

- Conducta refulare SPAU 1 – Lref = 676 m;
- Conducta refulare SPAU 2 – Lref = 637 m;
- Conducta refulare SPAU 3 – Lref = 637 m
- Conducta refulare SPAU 4 – Lref = 637 m
- Conducta refulare SPAU 5 – Lref = 637 m

BOCICOIU MARE

• **PROGRES FIZIC**

BOCICOIU MARE

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate)
UAT Bocicoiu Mare						
Obiect 1: EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN BOCICOIU MARE						
1	Str. Tisa 1	1607	110	626	0	
2	Str. Tisa 3	301	110	297	0	
3	Str. Tisa 4	114	110	114	0	
4	Str. Tisa 5	152	110	152	0	
5	Str. Tisa 7	361	110	361	0	
6	Str. Tisa 10	1106	110	350	170	
7	Str. Lunca 1	112	110	100	0	
8	Str. Lunca 2	115	110	110	0	
9	Str. Lunca 3	59	110	55	0	
10	Str. Lunca 4	373	110	370	0	
11	Str. Lunca 5	161	110	160	0	
12	Str. Lunca 6	439	110	430	0	
13	Str. Lunca 7	223	110	218	0	
14	Str. Lunca 8	95	110	90	0	
15	Str. Craciunesti 1	1146	110	1100	0	
16	Str. Craciunesti 2	98	110	98	0	
17	Str. Craciunesti 4	1433	110	0	760	
18	Str. Craciunesti 7	910	110	760	0	
19	Str. Craciunesti 8	125	110	120	0	
20	Str. Craciunesti 9	848	110	840	0	
21	Str. Craciunesti 10	323	110	90	0	
22	Str. Craciunesti 0 Rezevor	1006	180	576	0	
23	Str. Principala Craciunesti Dj185stg	1311	160	1211	0	
24	Str. Principala Craciunesti Dj185dr	800	110	1261	0	
25	Str. Bocicoiu 2	370	110	330	0	
26	Str. Principala Bocicoiu Dj185dr	1704	110	789	0	
27	Str. Principala Bocicoiu Dj185stg	2892	140	290	172	
28	Conducta de transport apa potabila in Bocicoiu	3201	160 - 180	1170	0	
TOTAL				12068	1102	

• **PROGRES FIZIC**

BOCICOIU MARE

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRTIPV de aducere la starea initiala probe presiune-etanseitate)
UAT Bocicoiu Mare						
Obiect 2: EXTINDEREA SISTEMULUI DE APA UZATA IN BOCICOIU MARE						
1	Str. Tisa 1	1730	250	979	388	PV etanseitate FD-03.07.2026,06.07.2026,07.07.2026,08.07.2026,09.07.2026
2	Str. Tisa 2	143	250	0	91	
3	Str. Tisa 3	264	250	264	0	PV etanseitate FD-07.07.2026,08.07.2026
4	Str. Tisa 4	162	250	162	0	
5	Str. Tisa 5	112	250	112	0	
6	Str. Tisa 6	350	250	350	0	PV etanseitate FD-01.07.2026, 02.07.2026
7	Str. Tisa 7	360	250	360	0	PV etanseitate FD-03.07.2026, 06.07.2026,07.07.2026
8	Str. Tisa 10	814	250	82	118	
9	Str. Tisa 11	428	250	200	0	
10	Str. Craciunesti 1	1290	250	1106	0	
11	Str. Craciunesti 2	86	250	86	0	
12	Str. Craciunesti 4	1534	250	1524	0	PV etanseitate FD-01.07.2026, 02.07.2026,03.07.2026,06.07.2026,07.07.2026,08.07.2026,09.07.2026,10.07.2026
13	Str. Craciunesti 5	357	250	357	0	
14	Str. Craciunesti 6	127	250	120	0	PV etanseitate FD-08.07.2026
15	Str. Craciunesti 7	856	250	824	0	PV etanseitate FD-01.07.2026, 02.07.2026,03.07.2026, 06.07.2026
16	Str. Craciunesti 8	117	250	112	0	PV etanseitate FD-06.07.2026
17	Str. Craciunesti 9	788	250	788	0	PV etanseitate FD-07.07.2026,08.07.2026,09.07.2026,10.07.2026
18	Str. Craciunesti 10	275	250	275	0	PV etanseitate FD-09.07.2026
19	Str. Craciunesti 12	296	250	0	195	
20	Str. Principala Craciunesti DJ185 stg	1279	250	1279	0	
21	Str. Principala Bocicoiu Mare Dj185 stg	2247	250	928	0	
22	Str. Principala Craciunesti DJ185dr	1248	250	1190	0	
23	Str. Principala Bocicoiu Mare Dj185dr	1159	250	694	0	PV etanseitate FD-02.07.2026,03.07.2026,06.07.2026,09.07.2026
24	Str. Bocicoiu 2	324	250	274	0	
TOTAL				12066	792	


- **PROGRES FIZIC**

BOCICOIU MARE

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate
UAT Bocicoiu Mare						
Obiect 4: CONDUCTE REFULARE SPAU IN BOCICOIU MARE						
1	Conducta Refulare SPAU 4	790	90	1150	0	
2	Conducta Refulare SPAU 3	491	90	410	0	
3	Conducta Refulare SPAU 2	637	110	290	0	
4	Conducta Refulare SPAU 1	676	90	270	172	
TOTAL				2120	172	

*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa

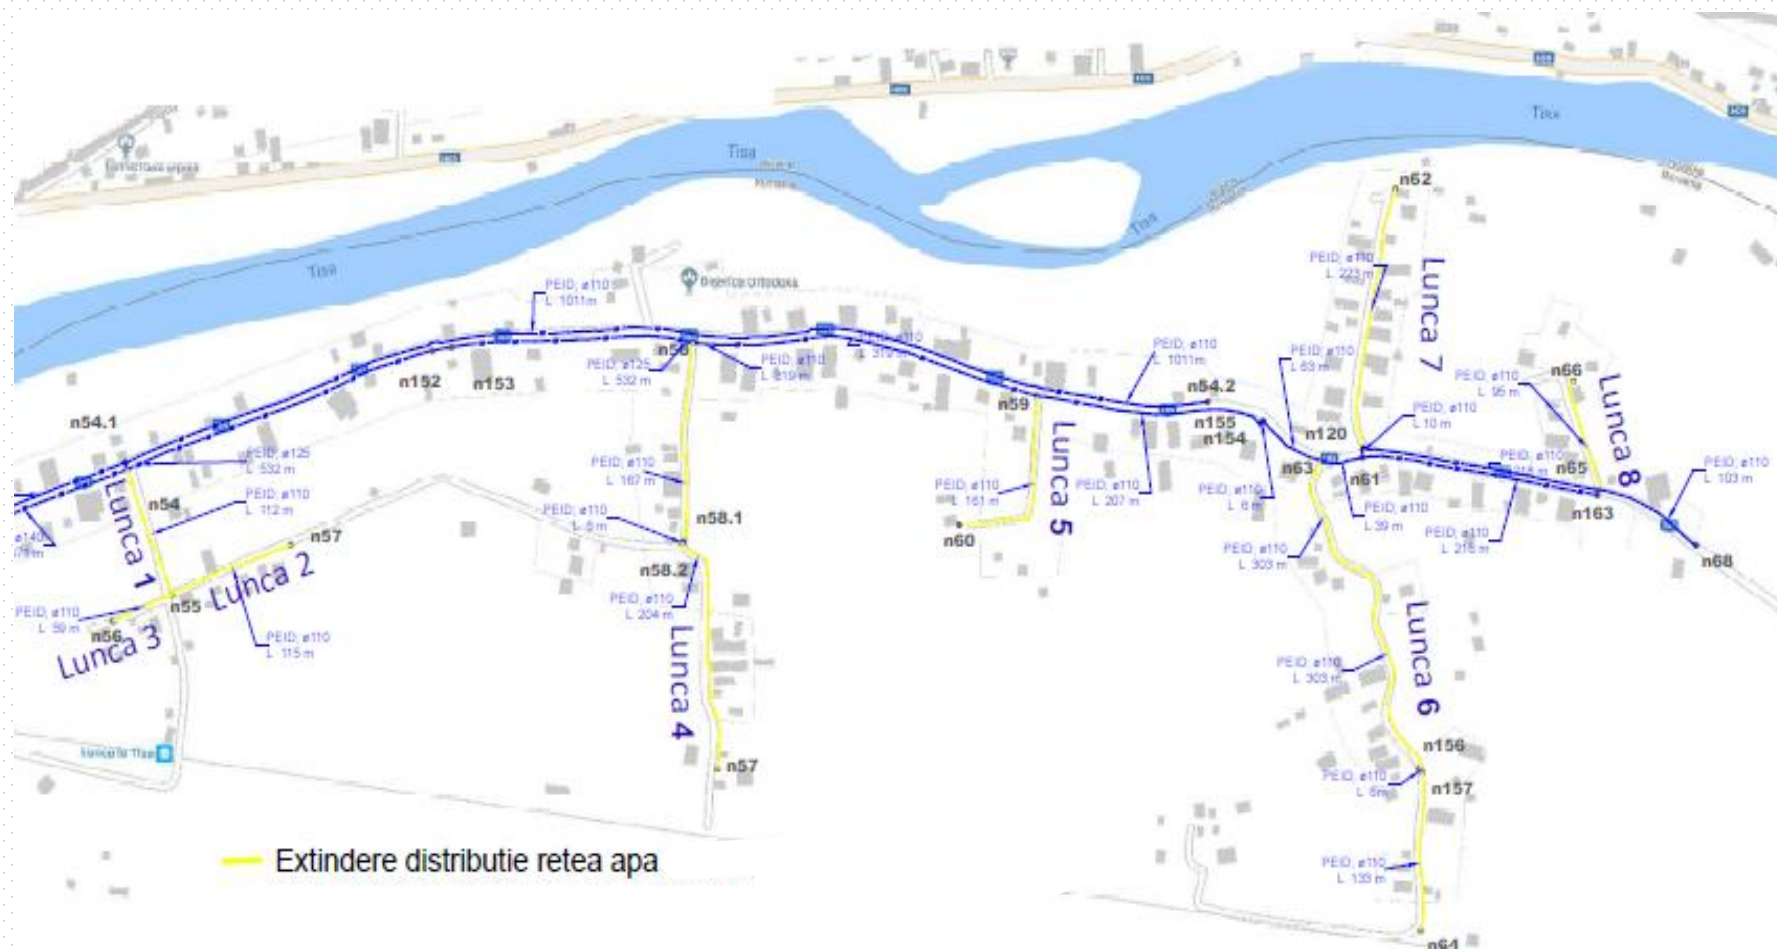


BOCICOIU MARE
Apa



*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa

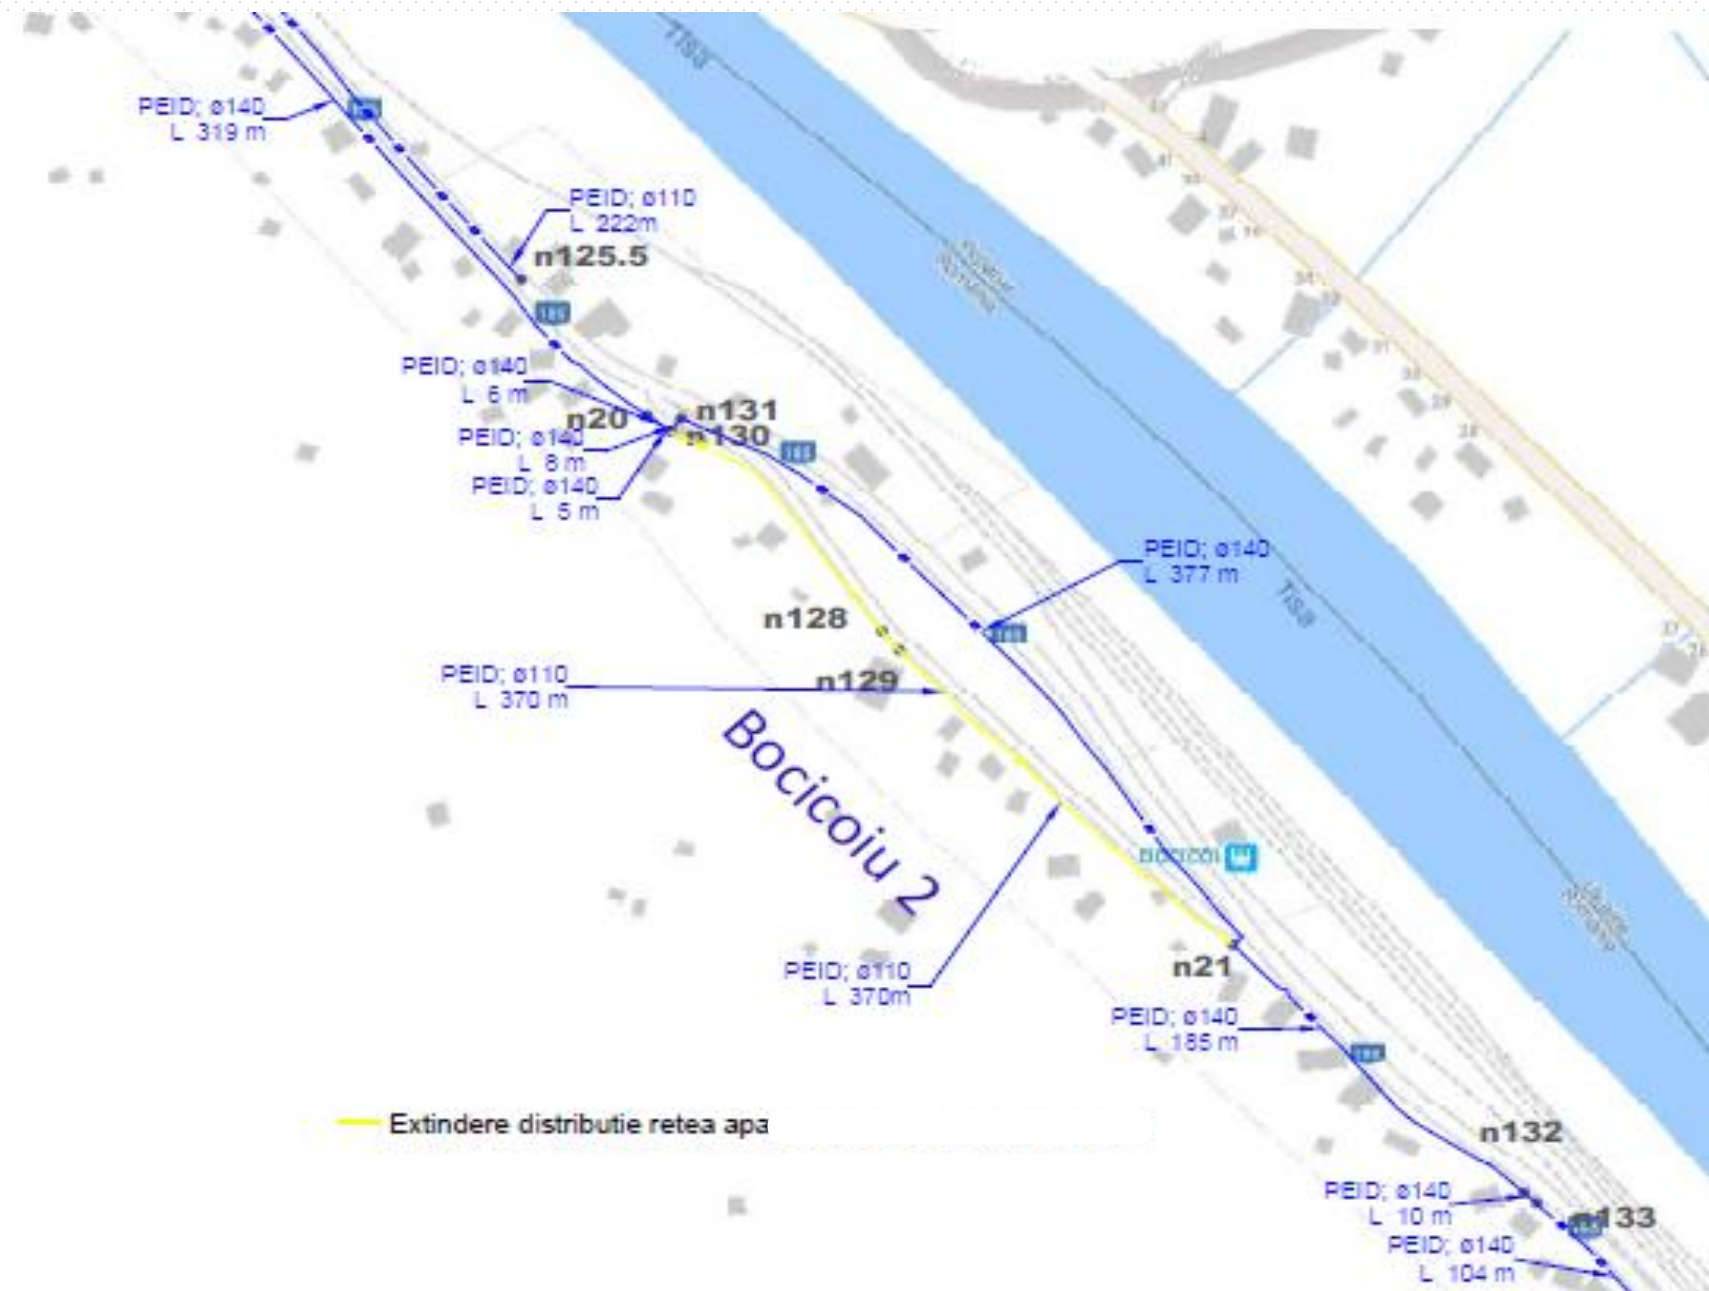

*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa



*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa uzata



**PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR
DE REPER AFERENTE LUCRARILOR nr. 3 / 03.03.2026, nr. 6 / 29.04.2026**

- **OBIECTIV 1:**
 - Extinderea rețelei de distributie apa potabile – L = 25.119 m;
 - Statii de pompare apa potabila – 2 buc.;
 - Bransamente de retea de distributie existente: 2.910 buc.
- **OBIECTIV 2:**
 - Extinderea rețelei de colectare apa uzata – L = 21.492 m;
 - Statii de pompare ape uzate – 6 buc.;
 - Conducte de refulare SPAU – L = 914 m;

• **PROGRES FIZIC**


POIENILE DE SUB Munte

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate)
UAT POIENILE DE SUB Munte						
PDSM-2.1: Extinderea retelei de alimentare cu apa din localitatea Poienile de Sub Munte						
1	Str. Zarica	1576	110	645	457	
2	Str. Potocina	169	110	168	0	
3	Str. Chelemancic	286	110	197	73	
4	Str. Paniana	879	110, 125, 160	588	39	
5	Str. Capletea	127	110	110	0	
6	Str. Berdane	217	110	70	0	
7	Str Dupa Biserica	858	110	0	360	
TOTAL				1,778	929	
Obiect PDSM-2 EXTINDEREA RETELEI DE COLECTARE APA UZATA APA DIN LOCALITATEA POIENILE DE SUB Munte						
PDSM-2.2: Extinderea retelei de colectare apa uzata din localitatea Poienile de Sub Munte						
1	Str. Potocina	147	250	147	0	PV etanseitate FD-24.07.2026
2	Str. Chelemancic	283	250	252	20	PV etanseitate FD-24.07.2026,27.07.2026
3	Str. Paniana	1647	250	619	343	PV etanseitate FD-24.07.2026, 27.07.2026,28.07.2026
4	Str. Capletea	105	250	105	0	
5	Str. Berdane	185	250	78	0	
6	Str. Nejni Crai	3417,01	250	105	0	PV etanseitate FD-24.07.2026
7	Str. Dupa Biserica	1024	250	54	269	
8	Str. Azil	222.01	250	0	201	
TOTAL				1360	833	

**Lucrari aflate
in executie**

POIENILE DE SUB MUNTE


Apa

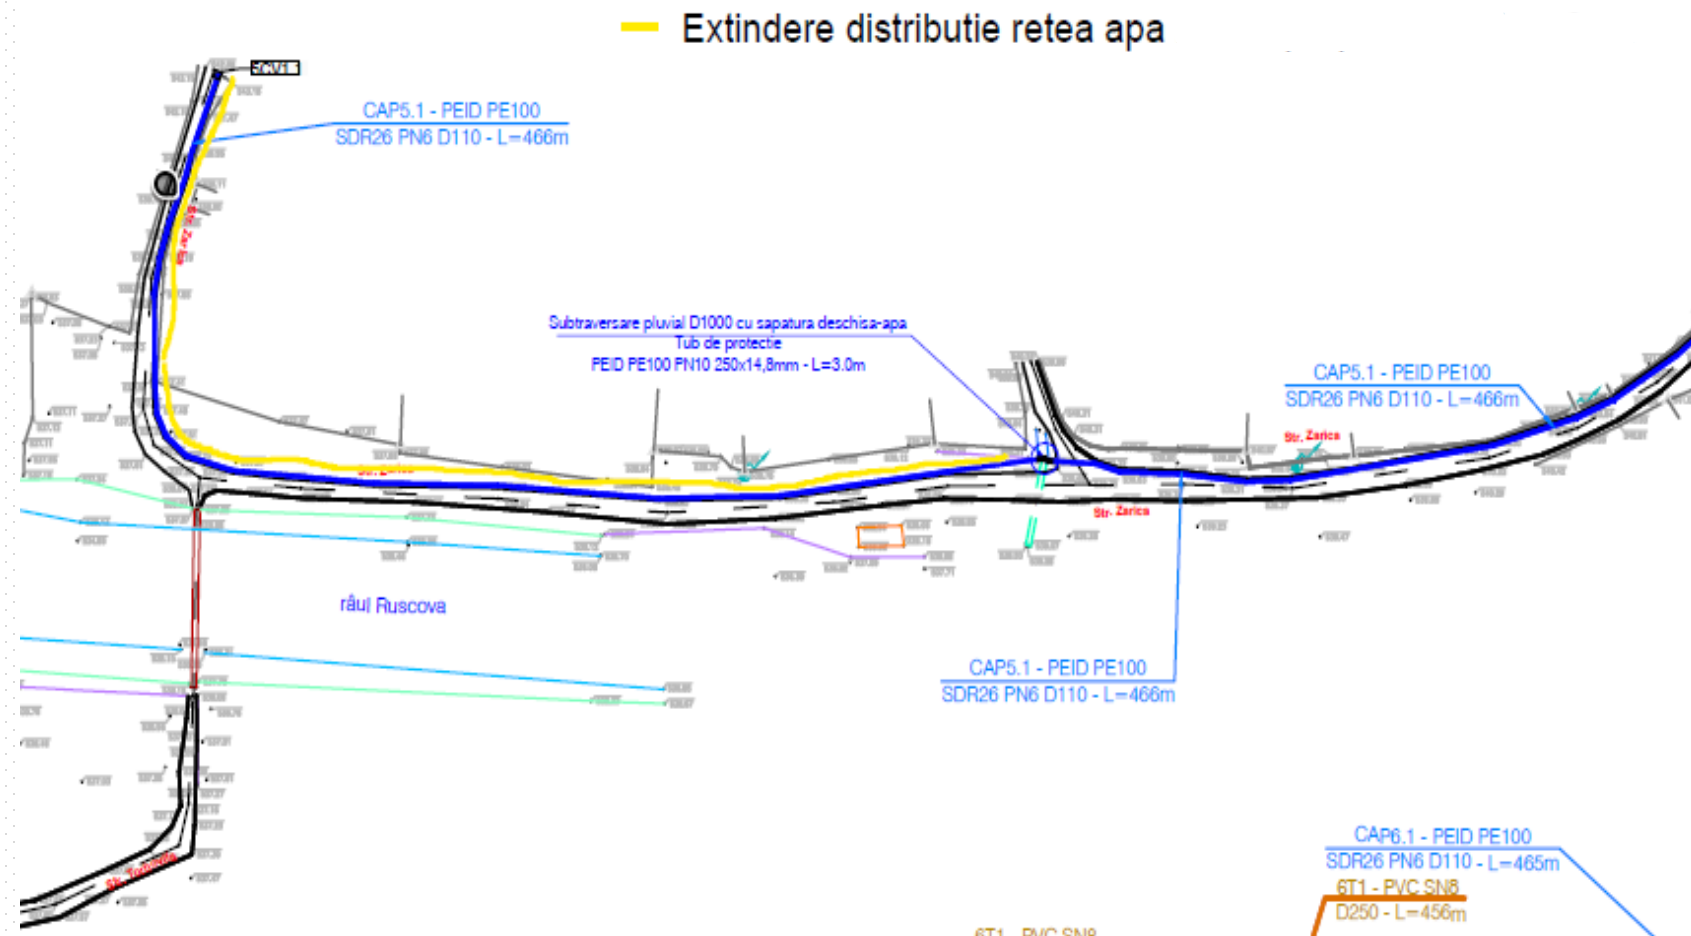

— Extindere distributie retea apa

*Lucrari aflate
in executie*


**POIENILE DE SUB MUNTE
Apa**

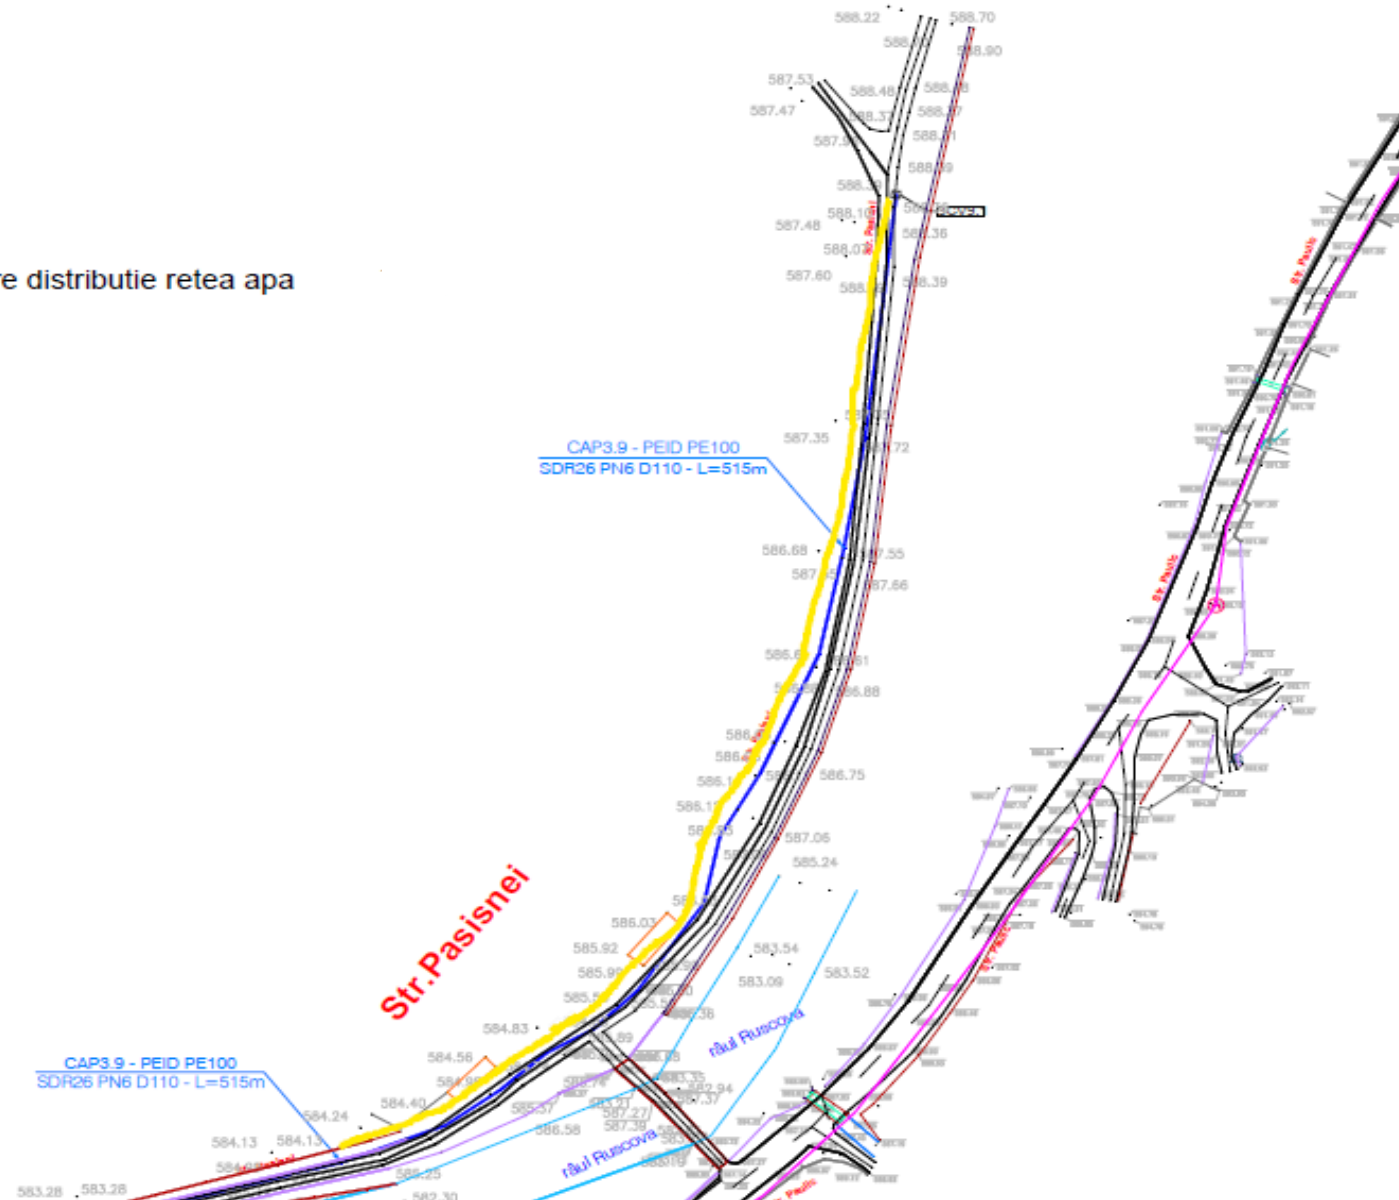

— Extindere distributie retea apa


*Lucrari aflate
in executie*

**POIENILE DE SUB MUNTE
Apa**

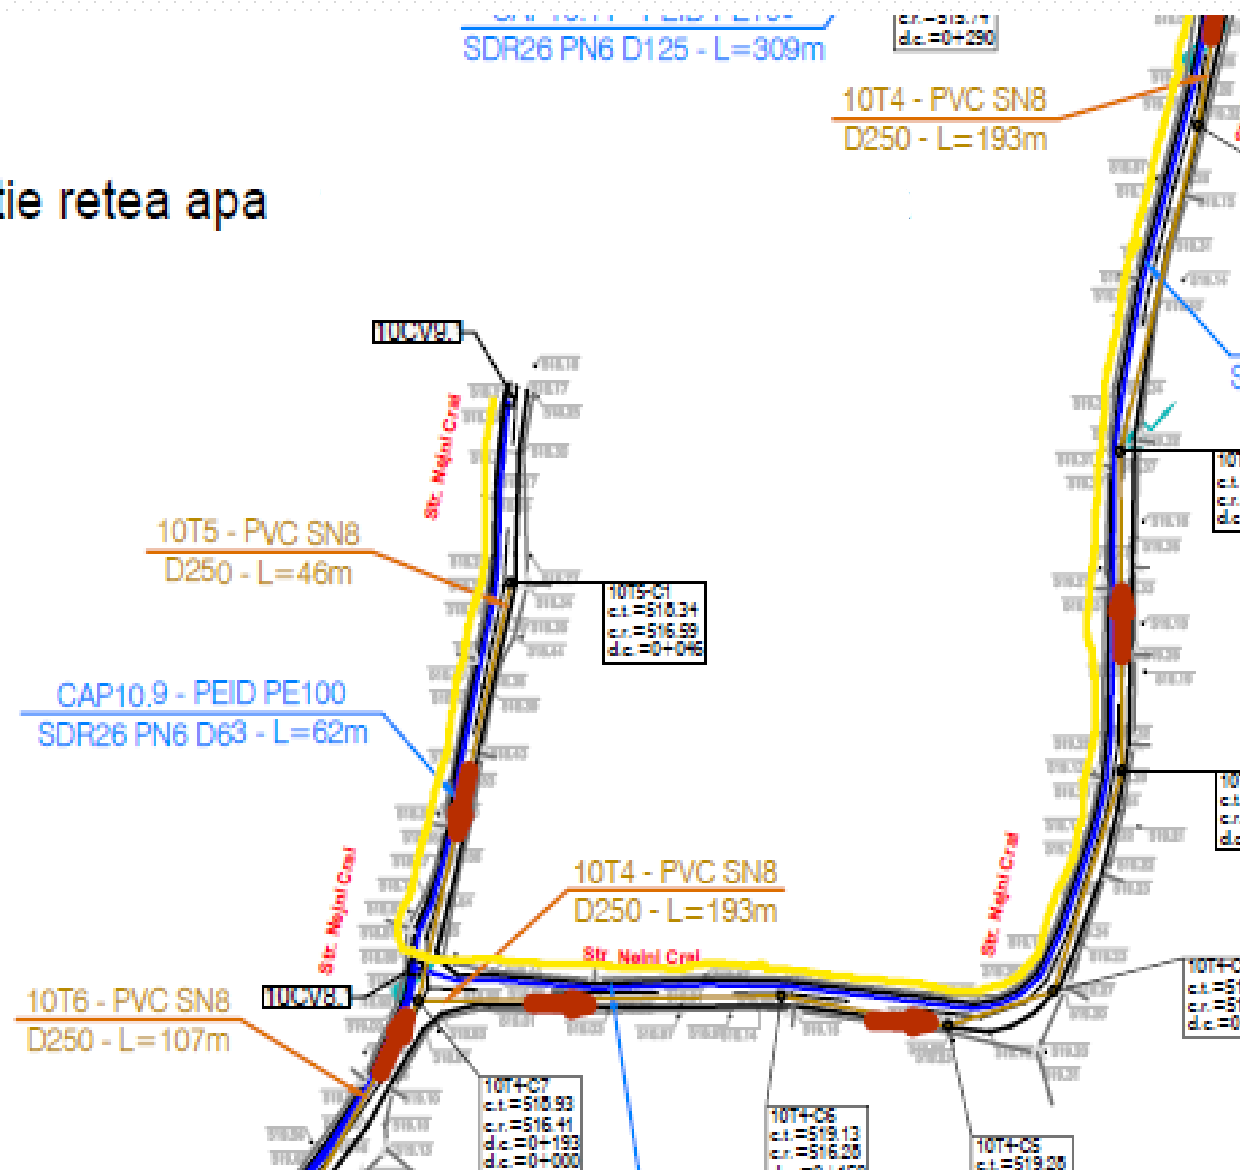


POIENILE DE SUB MUNTE

Apa uzata

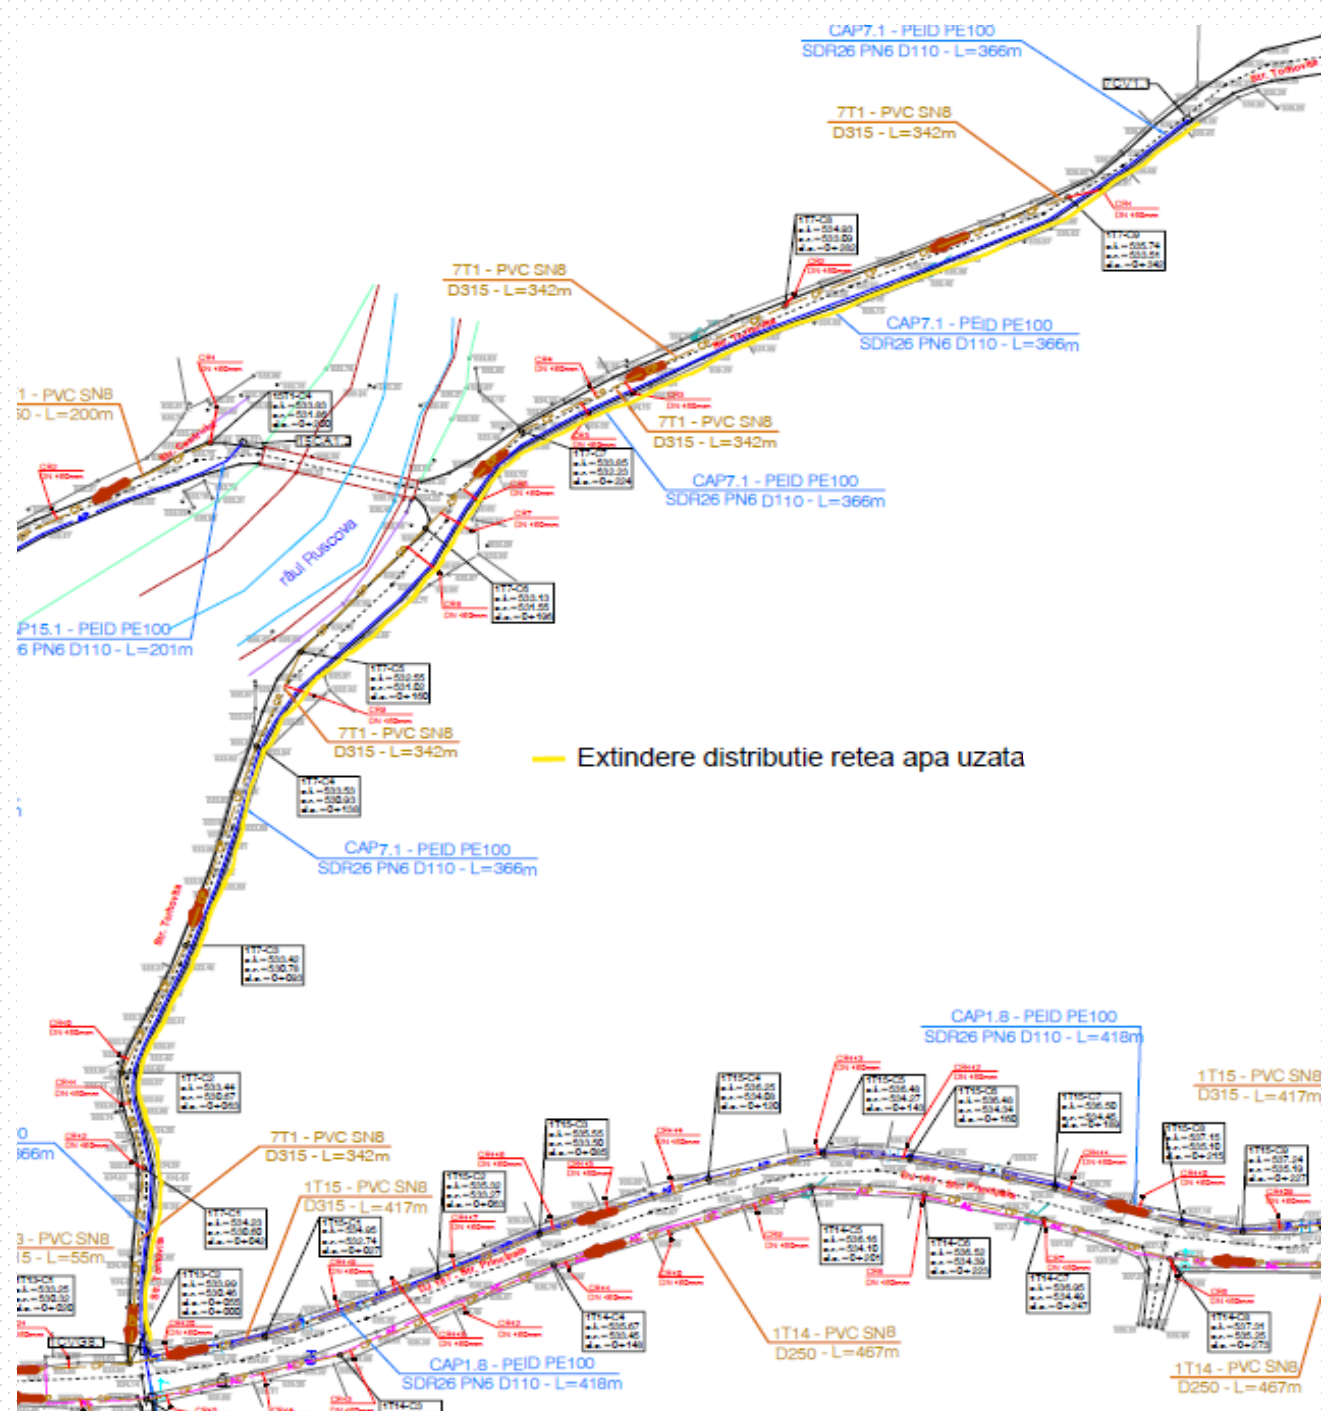

*Lucrari aflate
in executie*

POIENILE DE SUB MUNTE
Apa uzata

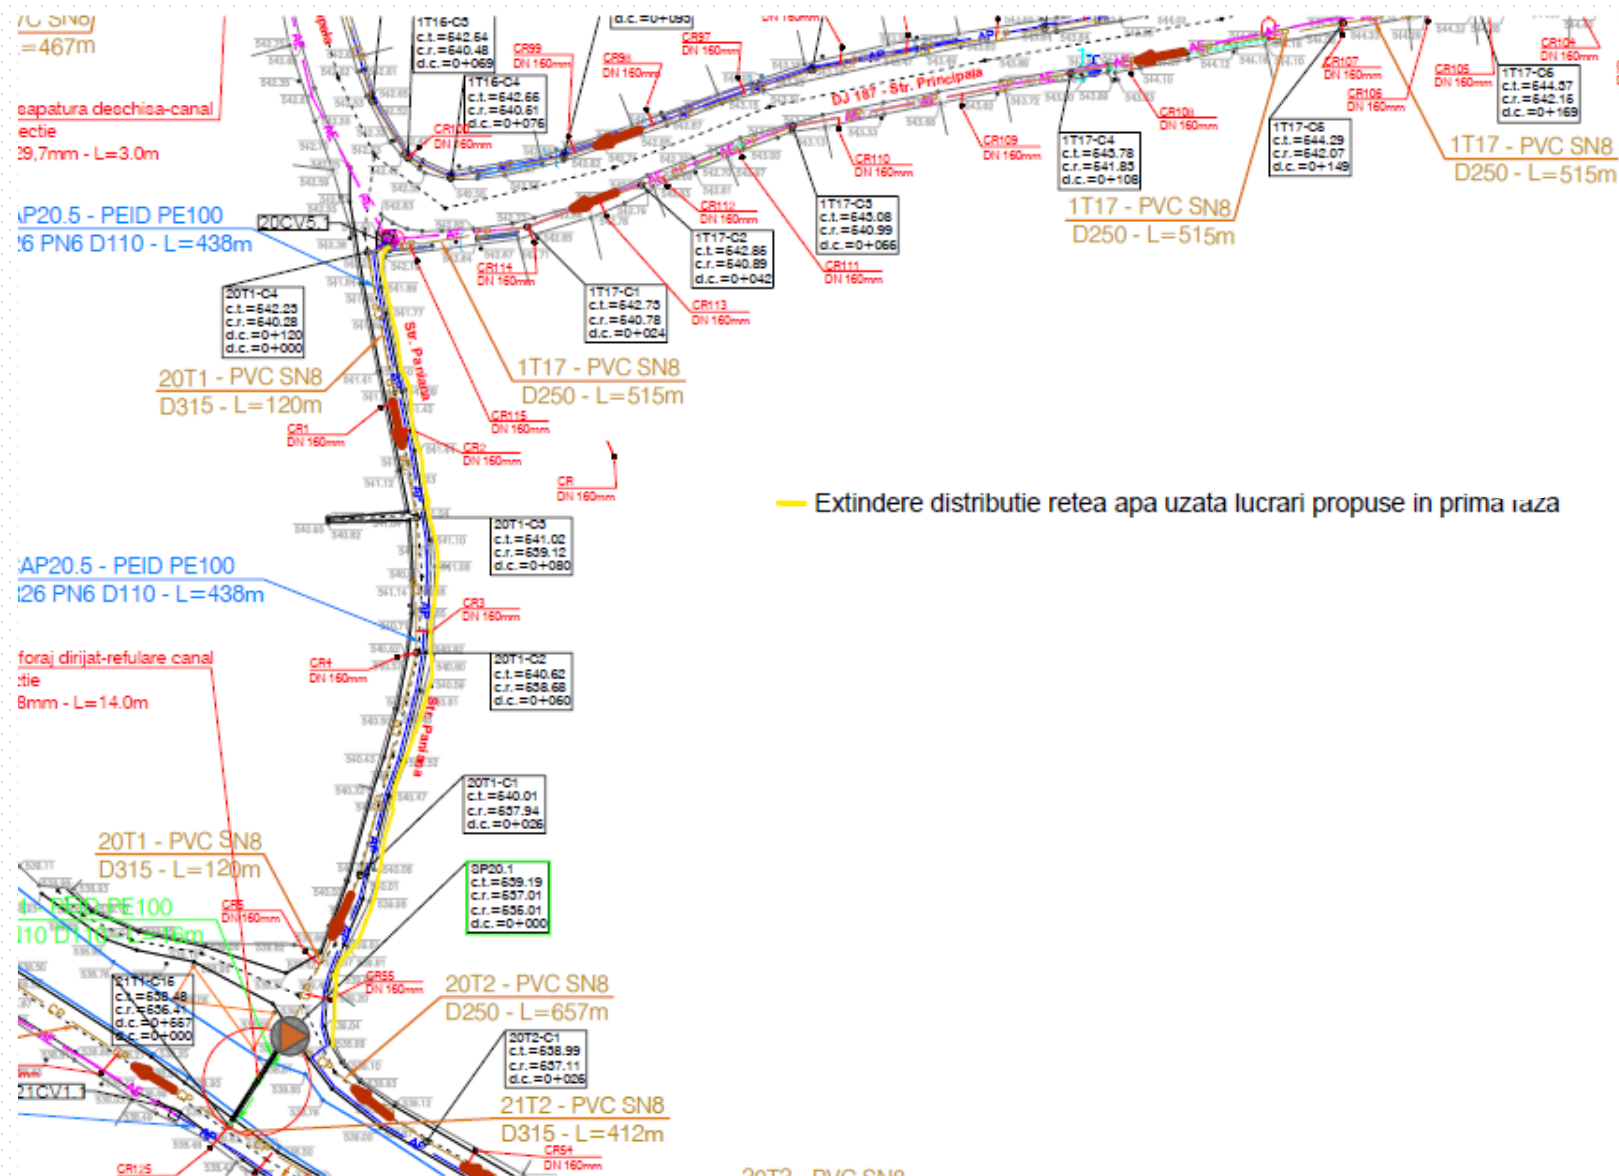

POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa - str. BORCUTULUI





POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa - str. BORCUTULUI /str. VALEA RAULUI (montare hidranti)



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Extindere retea distributie apa - str. VALEA RAULUI (montare hidranti)

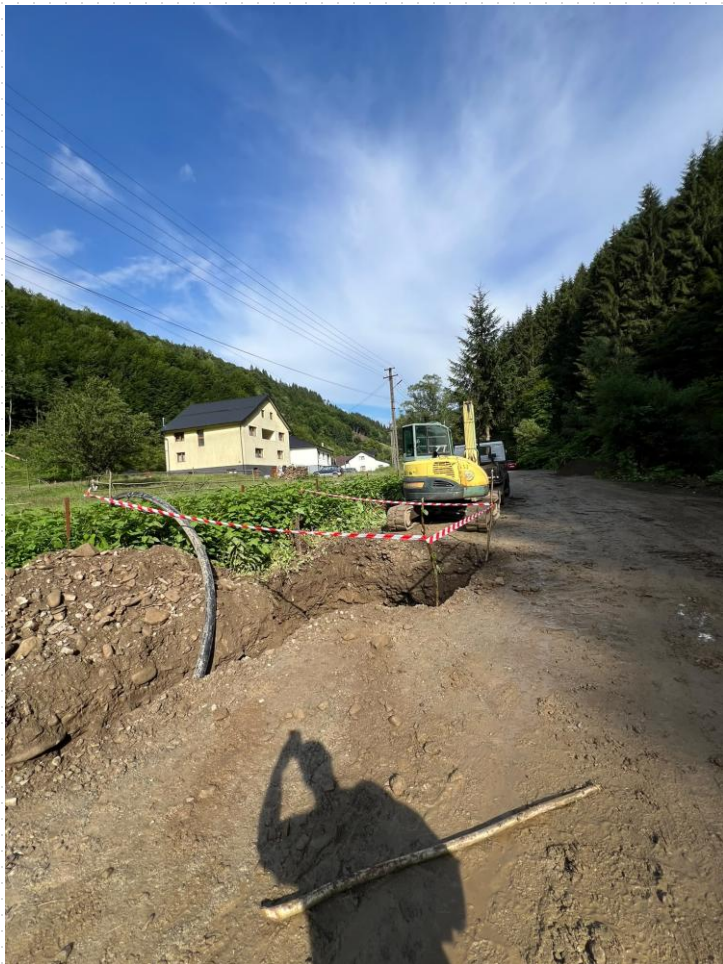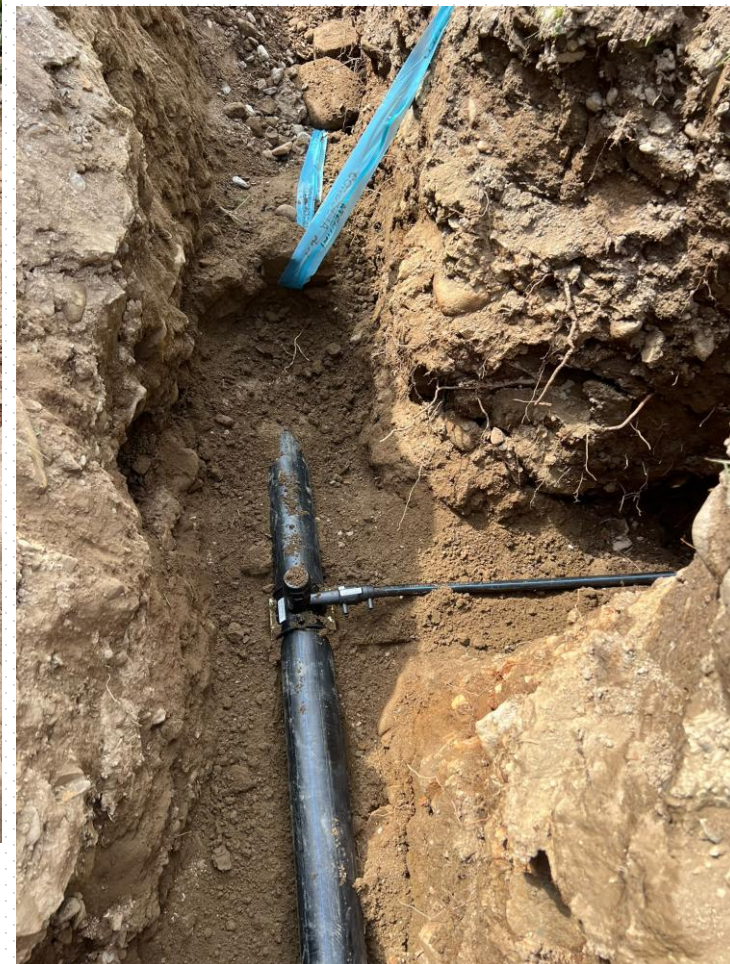

POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa cu subtraversare utilitati – str. BORCUTULUI




POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Extindere retea distributie apa cu subtraversare utilitati – str. BORCUTULUI



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa cu subtraversare utilitati – str. BORCUTULUI

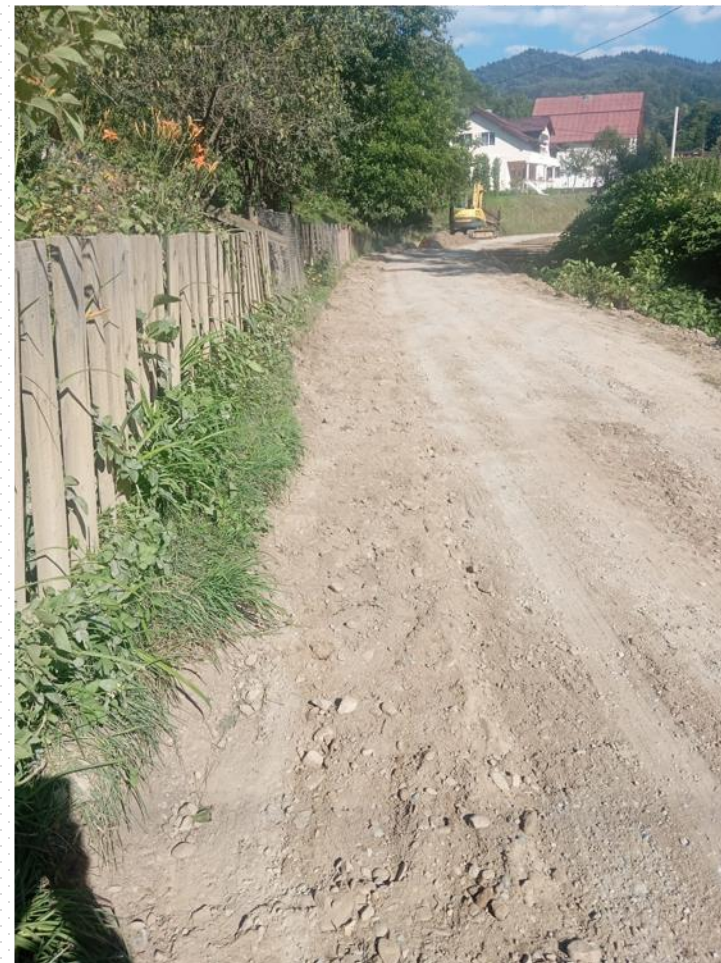

POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Extindere retea distributie apa cu subtraversare utilitati – str. BORCUTULUI



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Extindere retea distributie apa cu subtraversare utilitati – str. BORCUTULUI



POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE

Extindere retea distributie apa cu subtraversare utilitati – str. Paniana



POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE

Extindere retea distributie apa/canalizare cu subtraversare utilitati – str. Paniana



POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE

Extindere retea canalizare – str. Paniana




POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE

Extindere retea apa/canalizare – str. Paniana



POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE

Extindere retea canalizare – str. Dupa Biserica

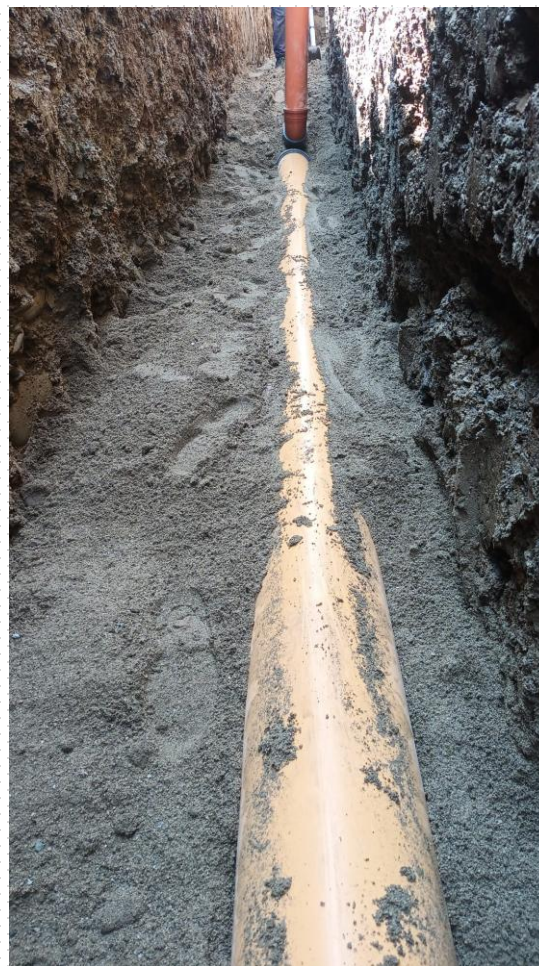

POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE

Extindere retea canalizare – str. Dupa Biserica




POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea canalizare – str. Tisa 1




POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Tisa 10

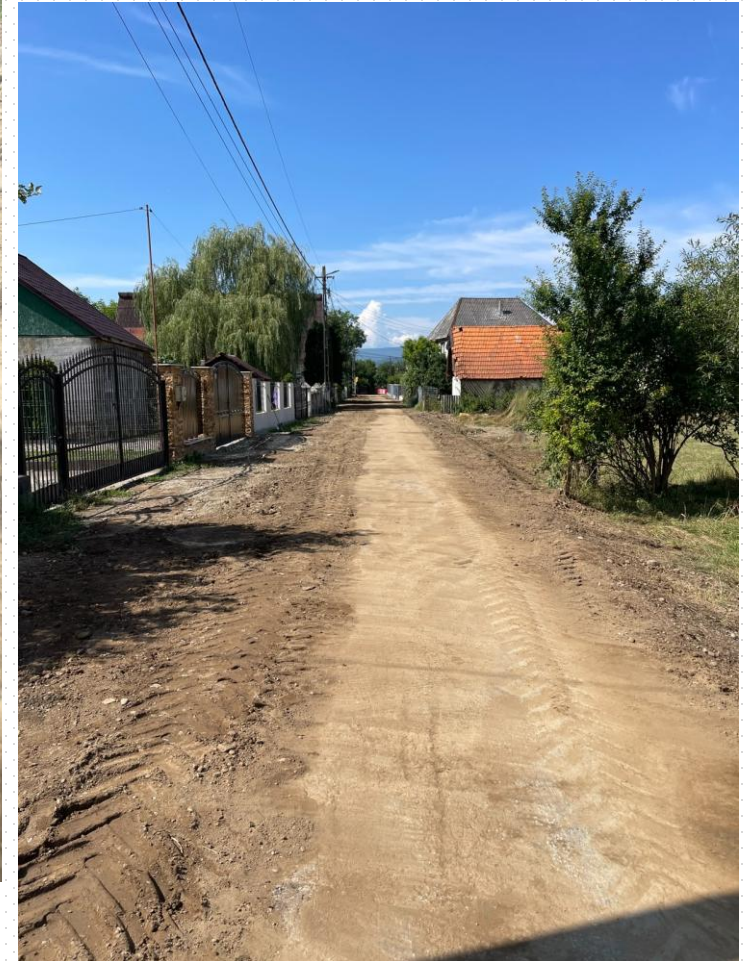

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea de canalizare – str. Tisa 2 -

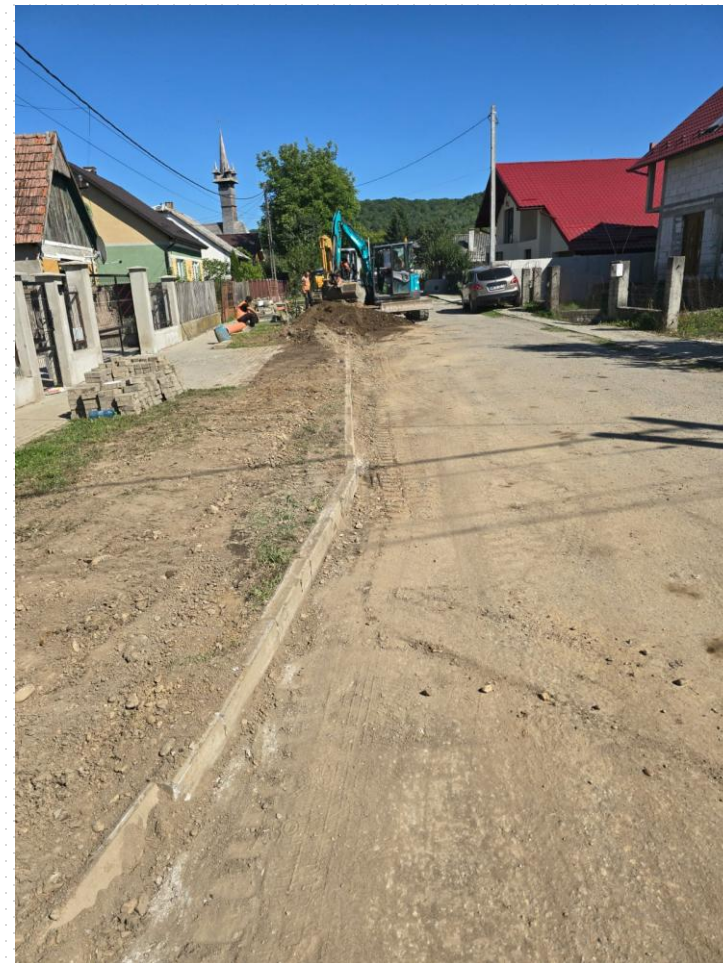


POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de apa – str. Craciunesti 4



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de apa/canal – str. Craciunesti 9

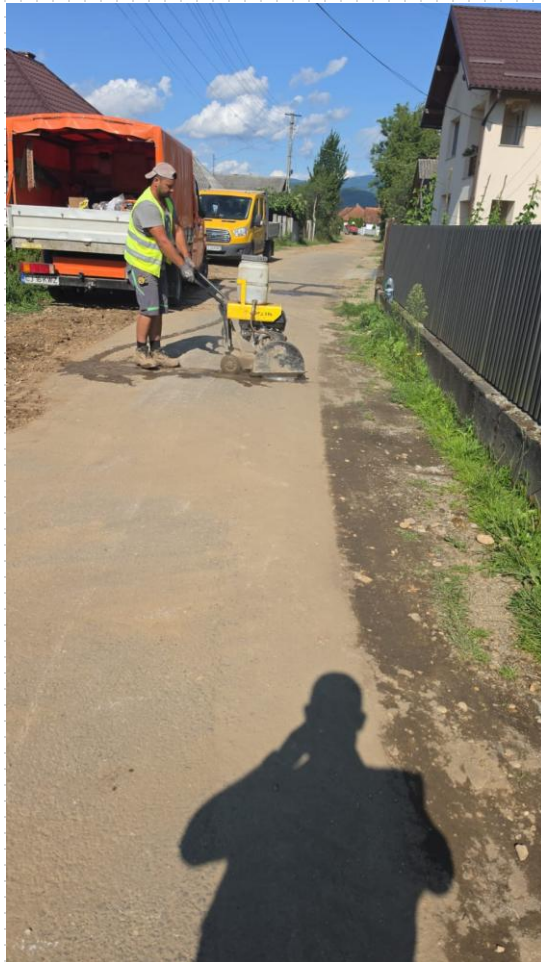

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Craciunesti 12



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea de distributie apa potabila – DJ Bocicoiu Mare

