

**“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
in judetul Maramures”**

CONTRACT DE LUCRARI - MM-CL-06

“RETELE DE APA SI APA UZATA BAIA MARE”

Beneficiar: **VITAL S.A**

Antreprenor: **Asocierea DIMEX-2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL**

Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L



RETELE DE APA SI APA UZATA BAI A MARE – MM-CL-06

Operator economic,

DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL

Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	L = 1324 m, PEID PE100 PN10; De 1000 mm
Sub-obiect 1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	L = 13926 m, PEID PE100 PN10; De 315 mm ÷ 800 mm
Sub-obiect 1.3	Reabilitare retelei de distributie apa potabila	L = 4994 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm ÷ 400 mm
Sub-obiect 1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 1644 m, PEID PE100 PN10; De 400 mm
Sub-obiect 1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila	L = 173 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.6	Statie de pompare apa potabila	Grup pompare (2A+1R), Qgr = 10 l/s, Hp=30 m, P= 9,0 kW; Dimensiuni constructie: 5,5 x 2,4 x 2,7 m
OBIECT 2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea de canalizare	L = 5531 m, PVC SN8; De 250 mm; PAFSIN SN10000 De 500 mm
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea de canalizare	L = 16995 m, PVC SN8; De 250 mm ÷ De 400 mm; PAFSIN SN10000 De 300 mm ÷ De 800 mm
Sub-obiect 2.3	Reabilitare colector de canalizare	L = 3634 m, PAFSIN SN10000 De 300 mm, ovoid De 600/900 mm, De 760/1140 mm; clopot De 2100/1575 mm
Sub-obiect 2.4	Statie de pompare apa uzata SPAU1	1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 10,0 m, P = 1,65 kW, Lref = 490 m, PEID, De 110 mm
	Statie de pompare apa uzata SPAU2	3A+1R, Q = 21.0 l/s, Hp = 14,0 m, P = 9,0 kW, Lref = 1350 m, PEID, De 280 mm
Sub-obiect 2.5	Reabilitare Deversor	Dimensiuni: L= 20 m, l= 7 m, H= 5 m

PVPPA - 11.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
1.Str. Victoriei		MM-BM-C1-C-03	17.03.2025 - 15.07.2025		Construrom
2.Str. Victoriei	MM-BM-A2-C-11	MM-BM-C1-C-05	23.03.2026-30.04.2026	30.04.2026-22.05.2026	Construrom
3.Str. Unirii	MM-BM-A2-C-12	MM-BM-C1-C-05	18.05.2026-19.06.2026		Construrom
4.Str. Grigore Ureche	MM-BM-A2-C-26	MM-BM-C1-C-30	17.03.2025 - 09.05.2025	09.05.2025 - 06.06.2025	Construrom
5.Str. Fructelor		MM-BM-C1-C-29	12.05.2025 - 27.06.2025		Construrom
6.Str. Colonia Topitorilor	MM-BM-A2-C-01		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
7.Str. Cerbului	MM-BM-A2-C-20		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
8.Str. Privighetorii si Dealul Crucii	MM-BM-A2-C-25	s	17.03.2025 - 30.06.2025	30.06.2025-30.04.2026	Dimex
9.Str. Barbu Stefanescu Delavrancea	MM-BM-A2-C-23	MM-BM-C1-C-24	17.03.2025 - 24.06.2025	24.06.2025-04.02.2026	DIMEX
10.Str. Rozelor		MM-BM-C1-C-23	17.03.2025 - 15.04.2025	15.04.2025 - 27.06.2025	Dimex
PVPPA - 31.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Garii		MM-BM-C1-C-06 MM-BM-C2-C-07 MM-BM-C2-C-08 MM-BM-C2-C-11	14.07.2025-31.07.2025	31.07.2025-01.12.2025	Construrom
Str. Garii	MM-BM-A2-C-18		12.05.2025 - 22.08.2025		Construrom
Aleea Jupiter		MM-BM-C1-C-06	28.07.2025 - 05.08.2025	05.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Neptun		MM-BM-C1-C-07	21.07.2025-22.08.2025	22.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Saturn		MM-BM-C1-C-07			Construrom
Aleea Uranus		MM-BM-C1-C-07	25.07.2025-05.08.2025	05.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Amurgului		MM-BM-C1-C-08	-		Construrom
Str. Matei Basarab		MM-BM-C1-C-08	-		Construrom
Str. Petru Rares		MM-BM-C1-C-08	23.10.2025 - 15.12.2025		Construrom
Str. Bogdan Voda		MM-BM-C1-C-08	-		Construrom
Str. Bucovinei		MM-BM-C1-C-09	-		Construrom
2.Str. Pasunii		MM-BM-C1-C-17	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
3.Str. Rapsodiei		MM-BM-C1-C-18	07.05.2025 - 25.07.2025		Dimex
PVPPA - 30.05.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Horea		MM-BM-C1-C-26	23.06.2025-29.09.2025		Dimex
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18 MM-BM-C1-C-25	07.05.2025 - 29.08.2025	29.08.2025-01.12.2025	Dimex
Paltinisului	MM-BM-A2-C-09 MM-BM-A2-C-10	MM-BM-C1-C-13 MM-BM-C1-C-14	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
Forestierului (Sudului)	MM-BM-A2-C-06		07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
PVPPA - 13.06.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Culturii	MM-BM-A2-C-16		28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Gheorghe Sincai			28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Vasile Lucaciu		MM-BM-C1-C-27 MM-BM-C1-C-28	-		Dimex
PVPPA - 14.08.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Hortensiei		MM-BM-C1-C-23	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
Aleea Dobrogei		MM-BM-C1-C-10	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
PVPPA - 10.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18	12.09.2025-15.11.2025		Dimex
B-dul Republicii		MM-BM-C1-C-04	12.09.2025-15.11.2025		Dimex


PVPPA - 30.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Colector canalizare - Tronson RE-LINING (Ob. 2.3)					Dimex + Construrom
PVPPA - 29.10.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Colonia Topitorilor (tronson CV-ex - CVG1)	MM-BM-A2-C-01		16.10.2025-22.12.2025	22.12.2025-31.07.2026	Dimex
PVPPA - 27.01.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Matei Basarab		MM-BM-C1-C-8	PRIMARIE		Construrom
Aleea Amurgului		MM-BM-C1-C-8	PRIMARIE		Construrom
Str. Petru Rares		MM-BM-C1-C-8	23.10.2025-15.12.2025		Construrom
Str. Garii		MM-BM-C1-C-12	16.10.2025 - 22.12.2025	22.12.2025-15.03.2026	Construrom
Str. Murelor		MM-BM-C1-C-19	18.02.2026		Construrom
Str. Codrului, str. Paltinului, str. Mesteacanului		MM-BM-C1-C-20	18.02.2026		Construrom
Str. Castanilor		MM-BM-C1-C-21	18.02.2026		Construrom
PVPPA - 04.02.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Supratraversare Rau Firiza	MM-BM-A2-C-01		-		Dimex
Str. 8 Martie	MM-BM-A2-C-02		22.04.2026-31.08.2026		Construrom
Str. Vasile Lucaciu		MM-BM-C1-C-27	PRIMARIE		Dimex
PVPPA - 25.02.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Colonia Topitorilor	MM-BM-A1-C1-01 MM-BM-A1-C1-02		PRIMARIE		Dimex
Str. Bucovinei		MM-BM-C1-C-09	23.03.2026-30.08.2026		Construrom
Str. Bogdan Voda		MM-BM-C1-C-08	23.03.2026-30.08.2026		Construrom
PVPPA - 09.03.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Privighetorii (SPAP)	MM-BM-A9-C-01		17.03.2025-09.05.2025	09.05.2025-30.04.2026	DIMEX
PVPPA - 16.04.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Bld. Independentei		MM-BM-C1-C-01 MM-BM-C1-C-02	27.04.2026-31.08.2026		Construrom
PVPPA - 19.05.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Bld. Bucuresti reabilitare retea canal		MM-BM-C1-C-22 MM-BM-C2-C-57			Construrom
Bld. Bucuresti extinderea retea transport apa	MM-BM-A2-C-27 MM-BM-A4-C-34 MM-BM-A4-C-35		18.05.2026-19.06.2026		Construrom
Str. Mihai Eminescu reabilitare retea transport apa	MM-BM-A2-C-08 MM-BM-A4-C-10				Dimex
PVPPA - 29.05.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Muncii	MM-BM-A2-C-17 MM-BM-A4-C-21				Dimex
Str. Sebesului	MM-BM-A2-C-07 MM-BM-A4-C-08				Dimex
PVPPA - 02.07.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Nufarului		MM-BM-C1-C-29			Construrom
Str. Dumbravei		MM-BM-C1-C-16			Construrom
Str. Bdul Unirii		MM-BM-C1-C-15			Construrom
Str. Garii Paltinisului		MM-BM-C1-C-13			Construrom
PVPPA - 15.07.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
str. Corbului		MM-BM-A2-C-03		Dimex	

Zone de lucru – Obiect 1

- ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Colonia Topitorilor – PEID De800 mm
- ZONA DE LUCRU 1.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Sebesului – PEID De800 mm
- ZONA DE LUCRU 1.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barbu Stefanescu Delavrancea – PEID De110/63 mm
- ZONA DE LUCRU 1.4 – CONSTRUROM SA – B-dul Bucuresti – PEID De400 mm

Zone de lucru – Obiect 2


- ZONA DE LUCRU 2.1 – CONSTRUROM SA – B-dul Independentei
- ZONA DE LUCRU 2.2 – CONSTRUROM SA – Str. Mesteacanului
- ZONA DE LUCRU 2.3 – CONSTRUROM SA – Str. Bogdan Voda
- ZONA DE LUCRU 2.4 – CONSTRUROM SA – Str. Bucovinei
- ZONA DE LUCRU 2.5 – CONSTRUROM SA – Str. Garii (ovoid 600/900)
- ZONA DE LUCRU 2.6 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Vasile Lucaciu (Centru Vechi)
- ZONA DE LUCRU 2.7 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

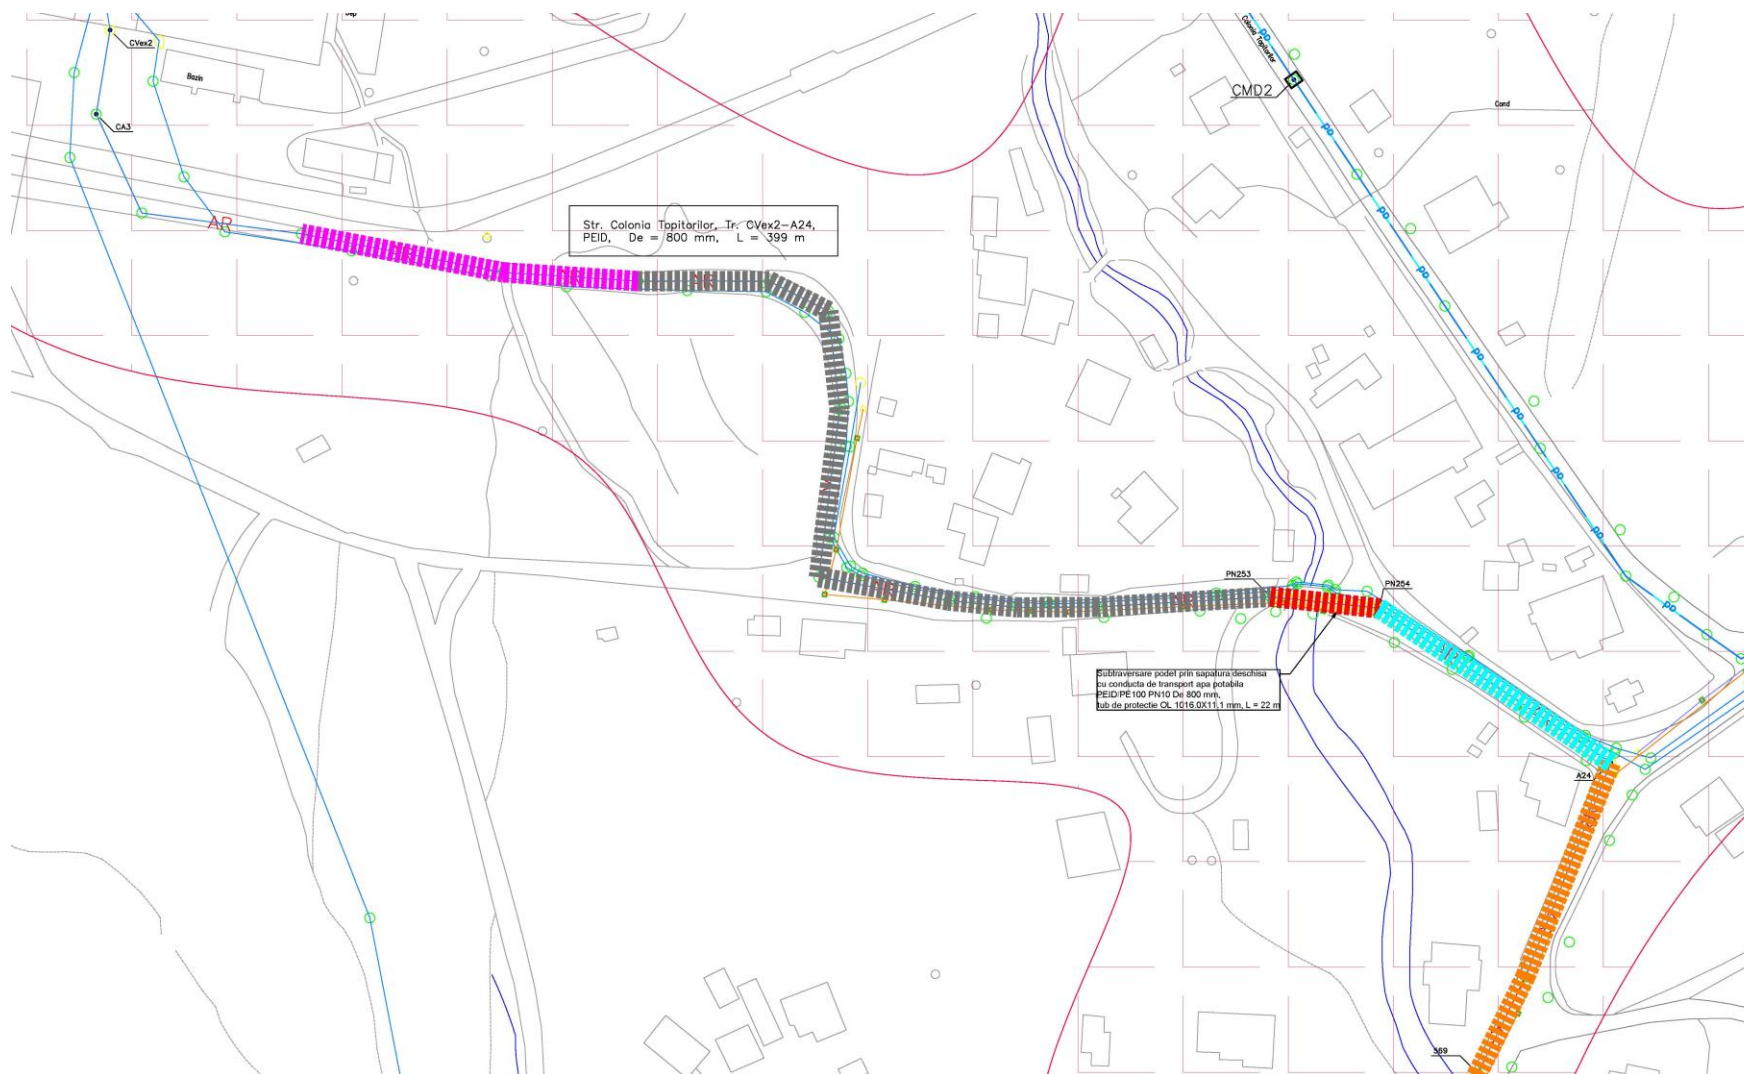

		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PE1D PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9		De 630 De 800	m	7527	4129			3398	55		m		0			0	#DIV/0!	buc.	24	7			17	29
Lista Nr.	D-1.2-10																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!


Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatate	Proba presiune	CCTV	As-built
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
E-1.2-1	16	2	14	13		mp	16441	0			16441	0		mp	16441	0			16441	0				

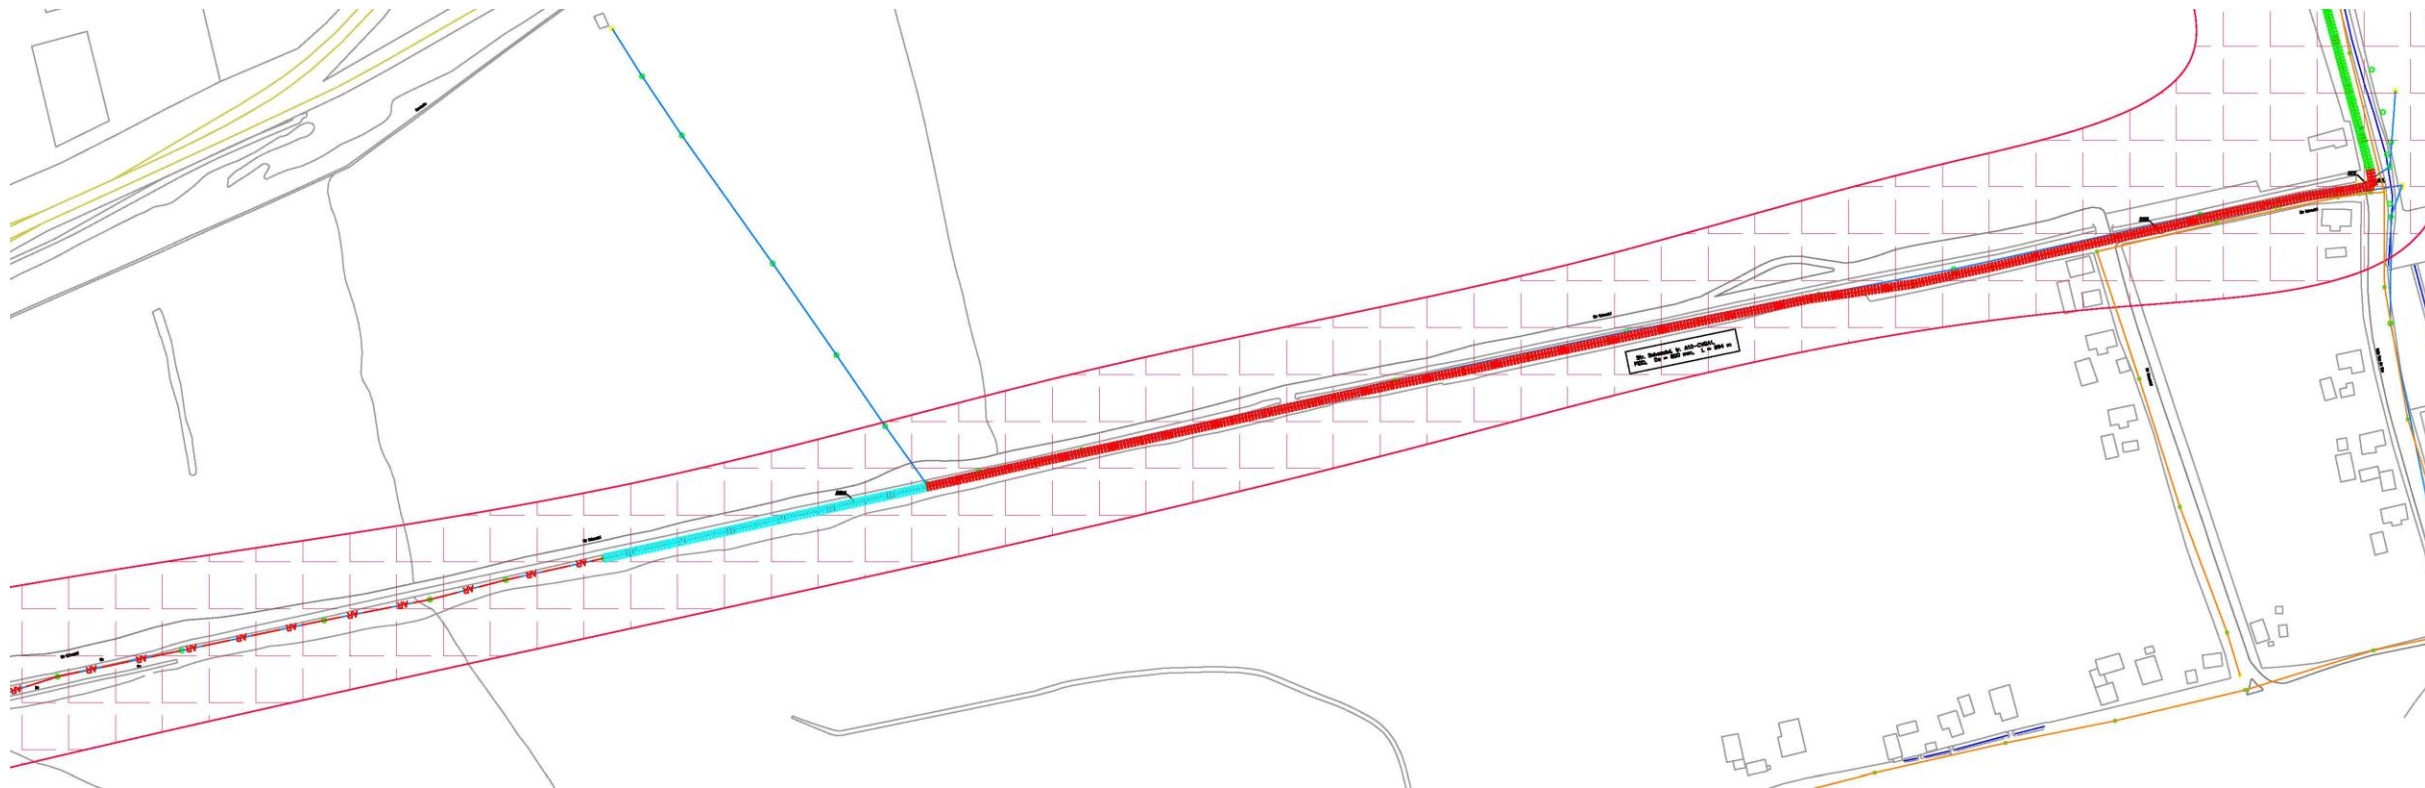


		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie															D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																									
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																									
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9		De 630 De 800	m	7527	4129			3398	55		m		0			0	#DIV/0!	buc.	24	7			17	29	
Lista Nr.	D-1.2-10																									

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatate	Proba presiune	CCTV	As-built
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
E-1.2-1	16	2	14	13		mp	16441	0			16441	0		mp	16441	0			16441	0				

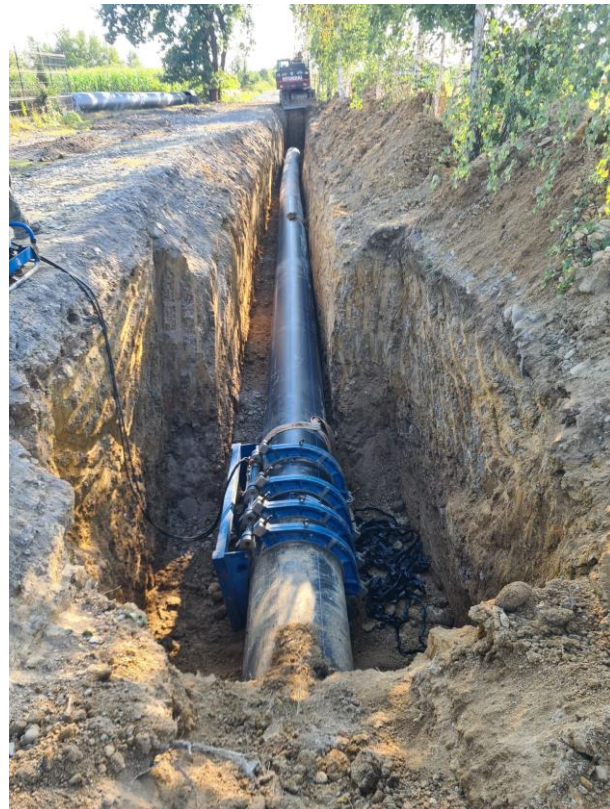


- **ZONA DE LUCRU 1.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL**
- **– Str. Barbu Stefanescu Delavrancea – PEID De110/63 mm**

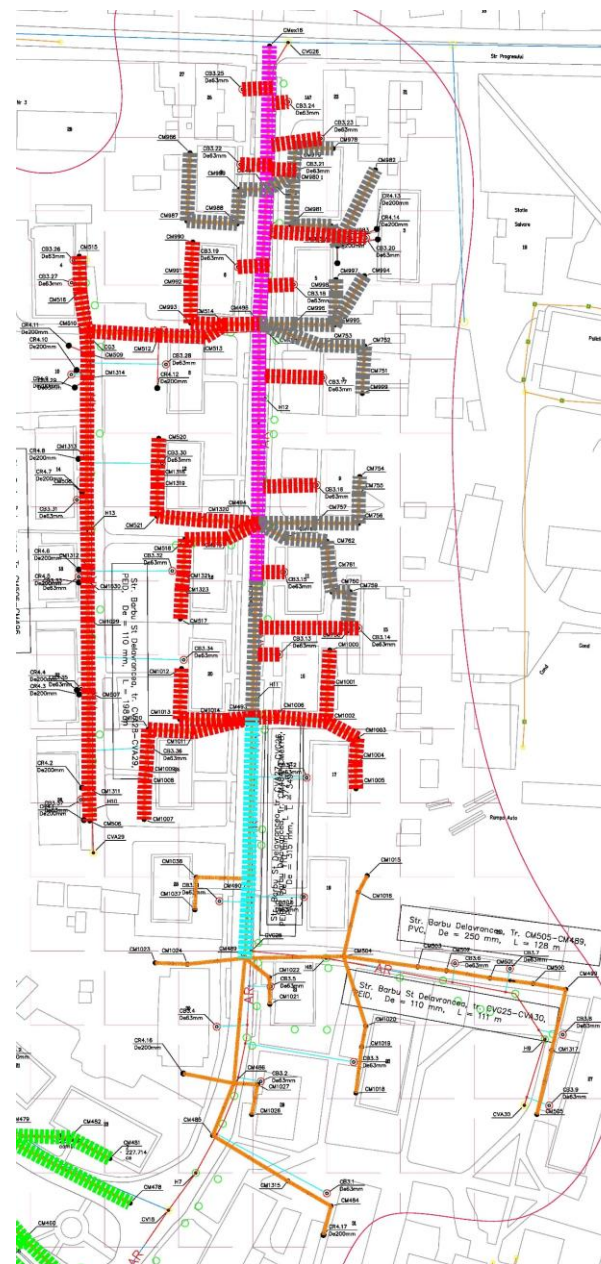

		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.3 - Reabilitarea retelei de distributie apa potabila																								
Sectiune	Str. Barbu St Delavrancea, tr. CVA27-CVG26, tr. CVA28-CVA29, tr. CVG25-CVA30	De 110	m	686	471			215	69	De 63 De 100	m	390	208			182	53	buc.	8	0			8	0	
Lista Nr.	D-1.3-2																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
DN 80	buc.	8	0			8	0		buc.	37	0			37	0	DN 20	buc.	210	0			210	0

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier							D12 - Refacerea sistemului rutier							Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-bui			
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS					Rest de executat	% executat	
		0	0	#DIV/0!		mp	1135	0			1135	0		mp	1135	0			1135	0					




RETELE DE APA SI APA UZATA BAIA MARE – MM-CL-06

Operator economic,
DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL
 Prin Lider Asociere, **DIMEX-2000 COMPANY S.R.L**

		D1 - Conducte de transport apa / Rețele de distribuție														D5 - Camine de vane și camine de vizitare										
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	
Obiect	1 - Reabilitarea și extinderea rețelei de apă din municipiul Baia Mare																									
Sub-Obiect	1.4 - Extindere conducte de transport apă potabilă																									
Sectiune	Conducta transport apă potabilă (Bdul București-Str. Europa), Tr. CVA34-CVG35		De 400	m	1549	758			791	49		m		0			0	#DIV/0!	buc.	4	4			0	100	
Lista Nr.	D-1.4-1																									

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier										D12 - Refacerea sistemului rutier										Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat								
E-1.4-01	3	0	3	0		mp	1580	0			1580	0		mp	1580	0			1580	0								

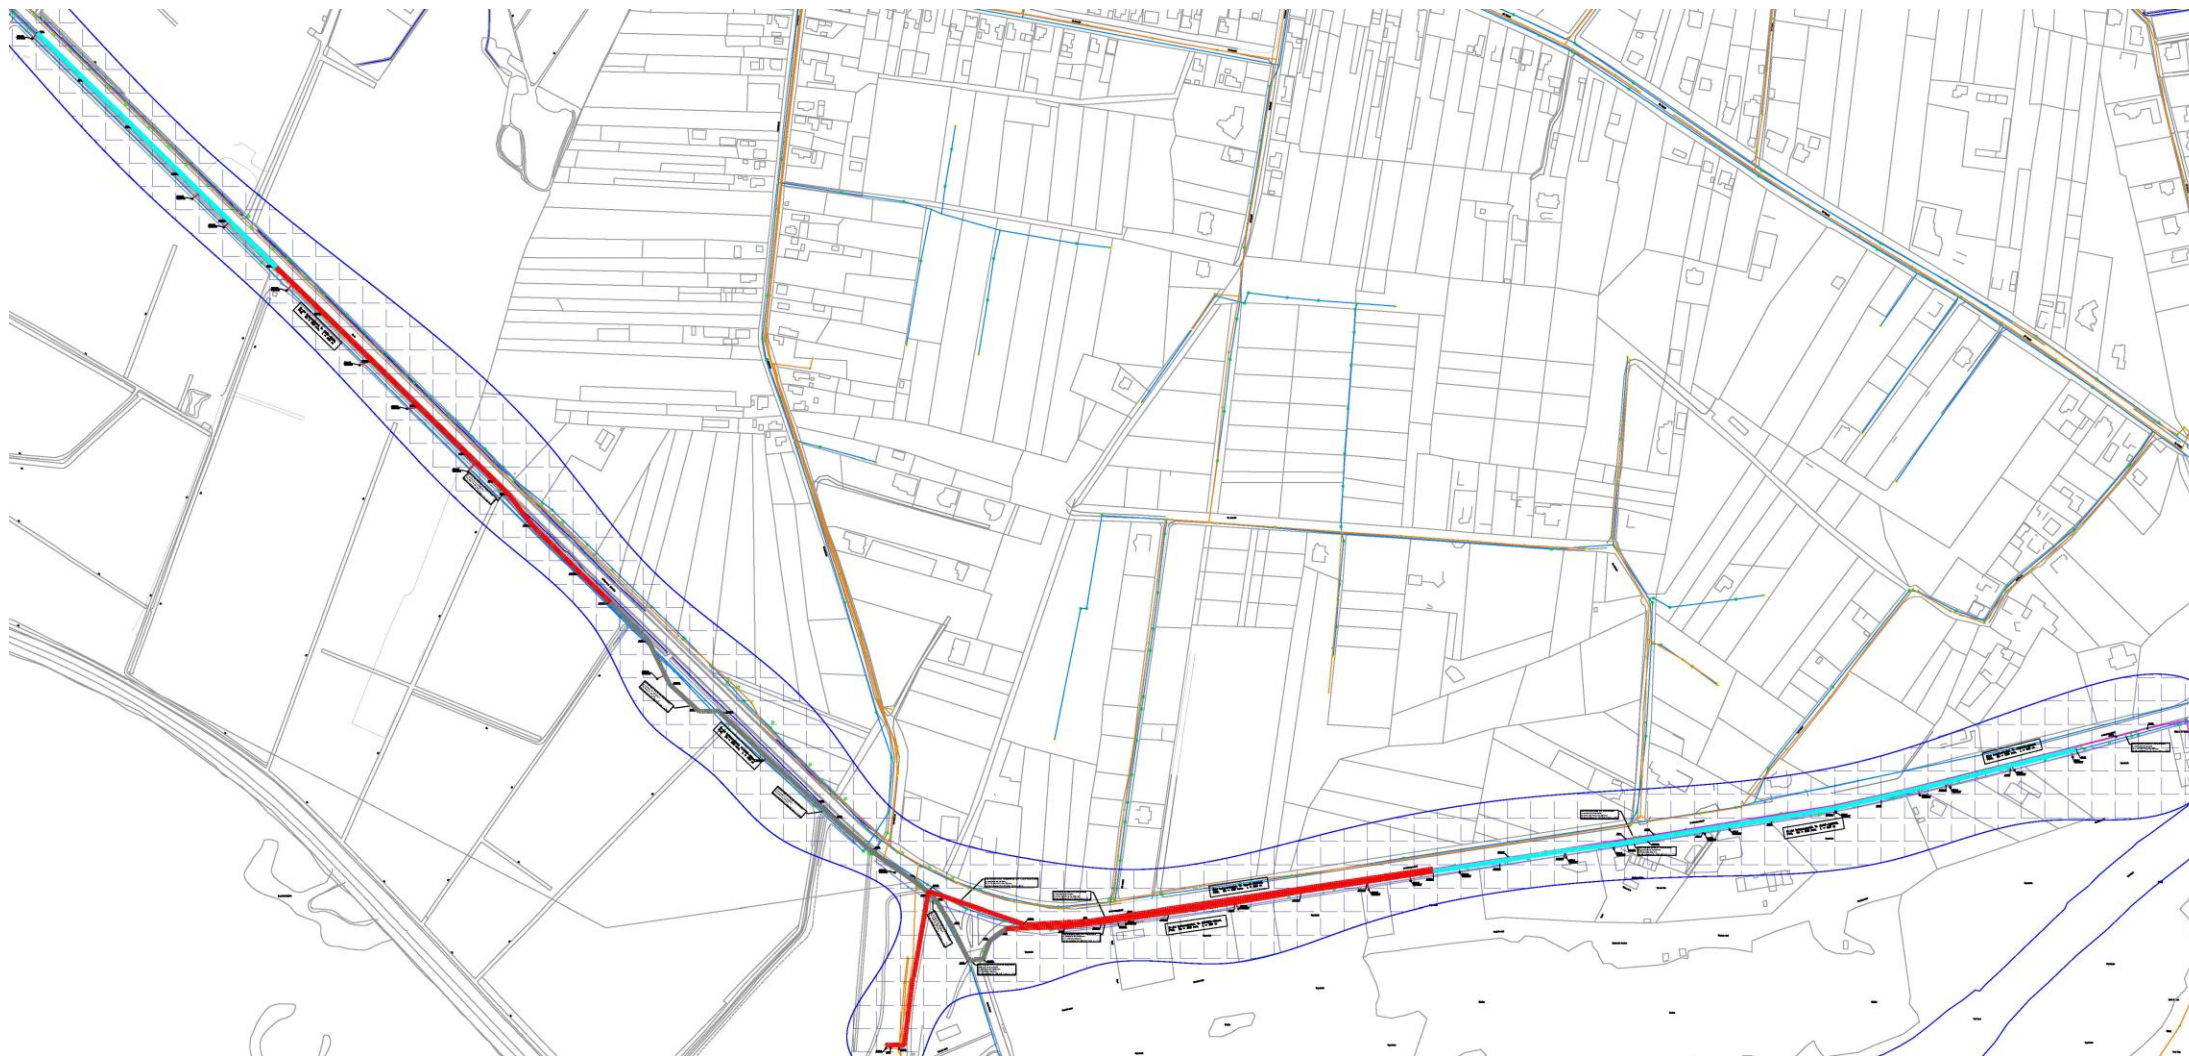


		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.1 - Extindere retea de canalizare																								
Sectiune	Bdul Independentei, Tr. CM1059-CMex1, Tr. CM21-CM29, Tr. CM47-CM1059, Tr.CM29-CMex1, Tr. CM28-SPAU2	De 500	m	12	0			12	0	De 250	m	2089	2337			-248	112	De 200	m	230	0			230	0
Lista Nr.	D-2.1-1																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare							D8 - Camine de racord							Traversari						
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.	51	54			-3	106	DN 800	buc.	23	0			23	0	E-2.1-1	7	9	-2	129

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	3103	0			3103	0		mp	3103	0			3103	0				



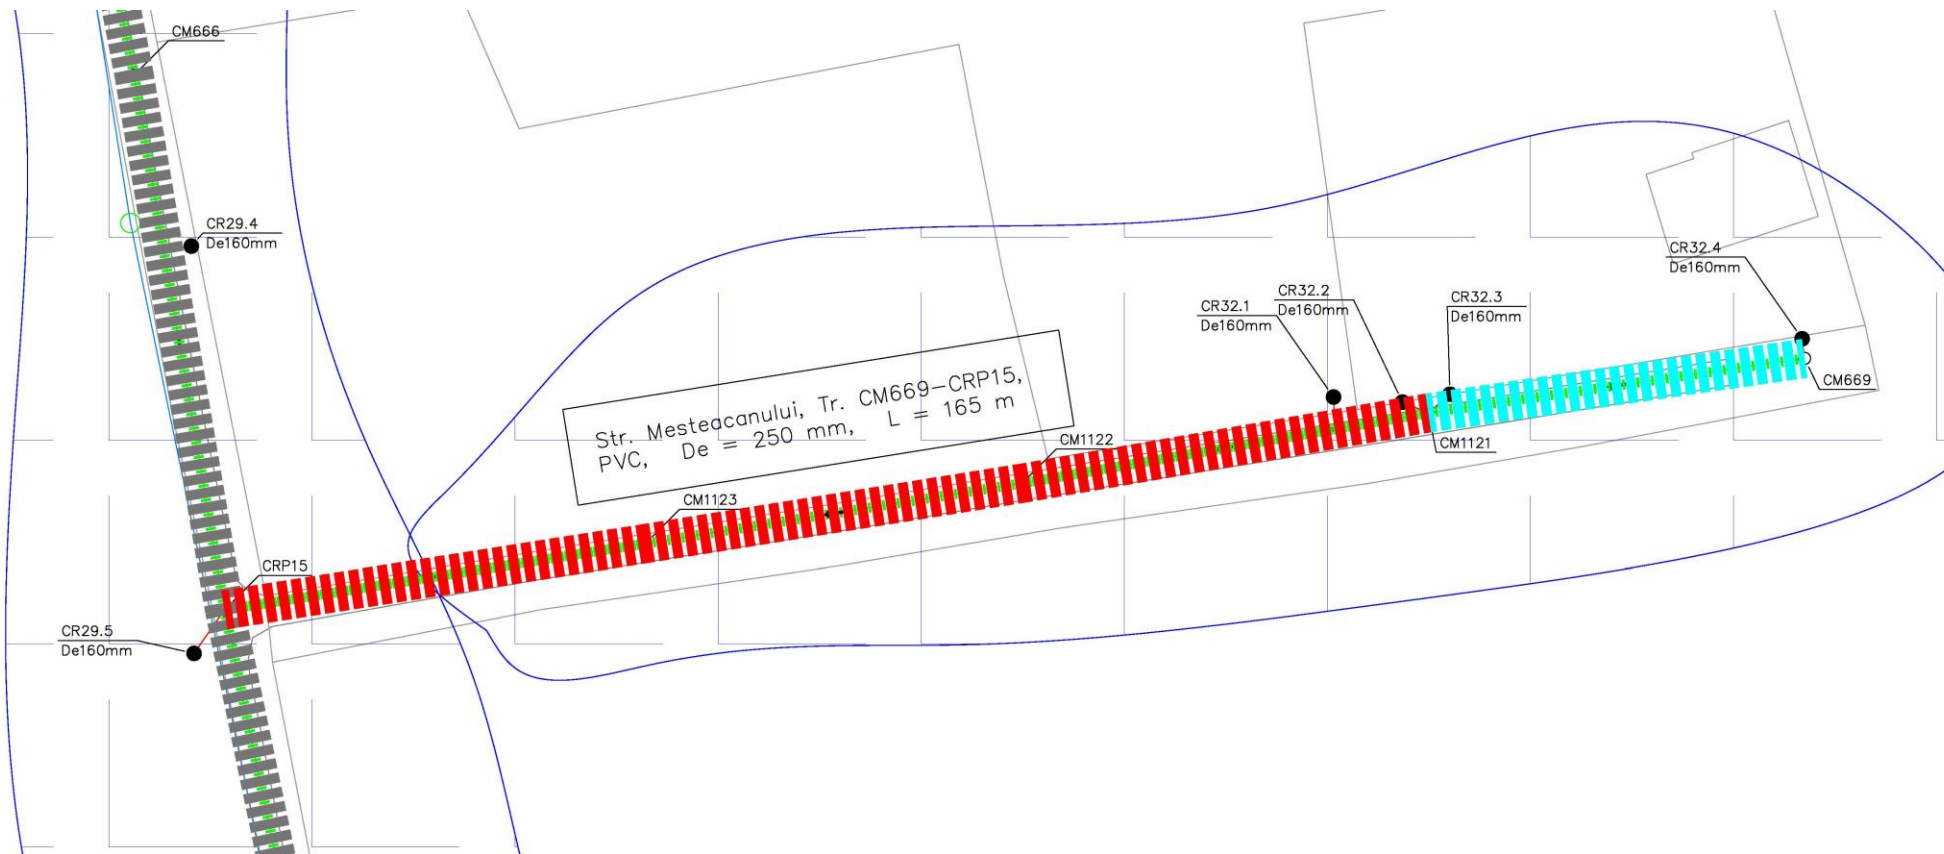

		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.1 - Extindere retea de canalizare																								
Sectiune	Str. Mesteacanolui, Tr. CM669-CRP15		m		0			0	#DIV/0!	De 250	m	165	190			-25	115	De 160	m	40	22			18	55
Lista Nr.	D-2.1-7																								


D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	4	4			0	100	D 315	buc.	4	4			0	100			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	237	0			237	0		mp	237	0			237	0				

- **ZONA DE LUCRU 2.2 – CONSTRUROM SA – Str. Mesteacanului**



- **ZONA DE LUCRU 2.3 – CONSTRUROM SA – Str. Bogdan Voda**

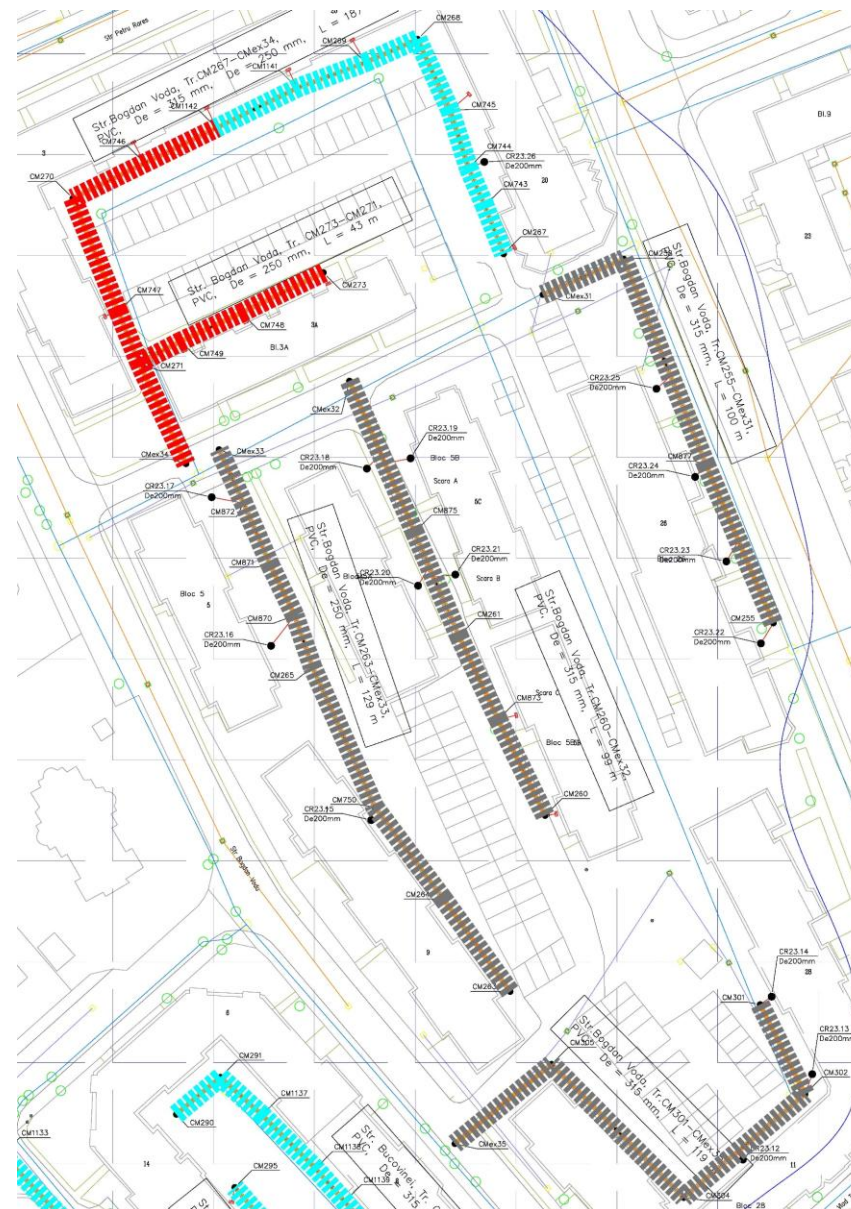


		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Str. Bogdan Voda, Tr. CM237-CM234, Tr. CM273-CM271, Tr. CM233-CMex45, Tr. CM239-CMex46, Tr. CM255-CMex31, Tr. CM260-CMex32, Tr. CM263-CMex33, Tr. CM267-CMex34, Tr. CM301-CMex35		m		0			0	#DIV/0!	De 250 De 315	m	939	1117			-178	119	De 200	m	380	72			308	19
Lista Nr.	D-2.2-11																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	48	57			-9	119	DN 1000	buc.	26	25			1	96			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	430	0			430	0		mp	430	0			430	0				



- **ZONA DE LUCRU 2.4 – CONSTRUROM SA – Str. Bucovinei**

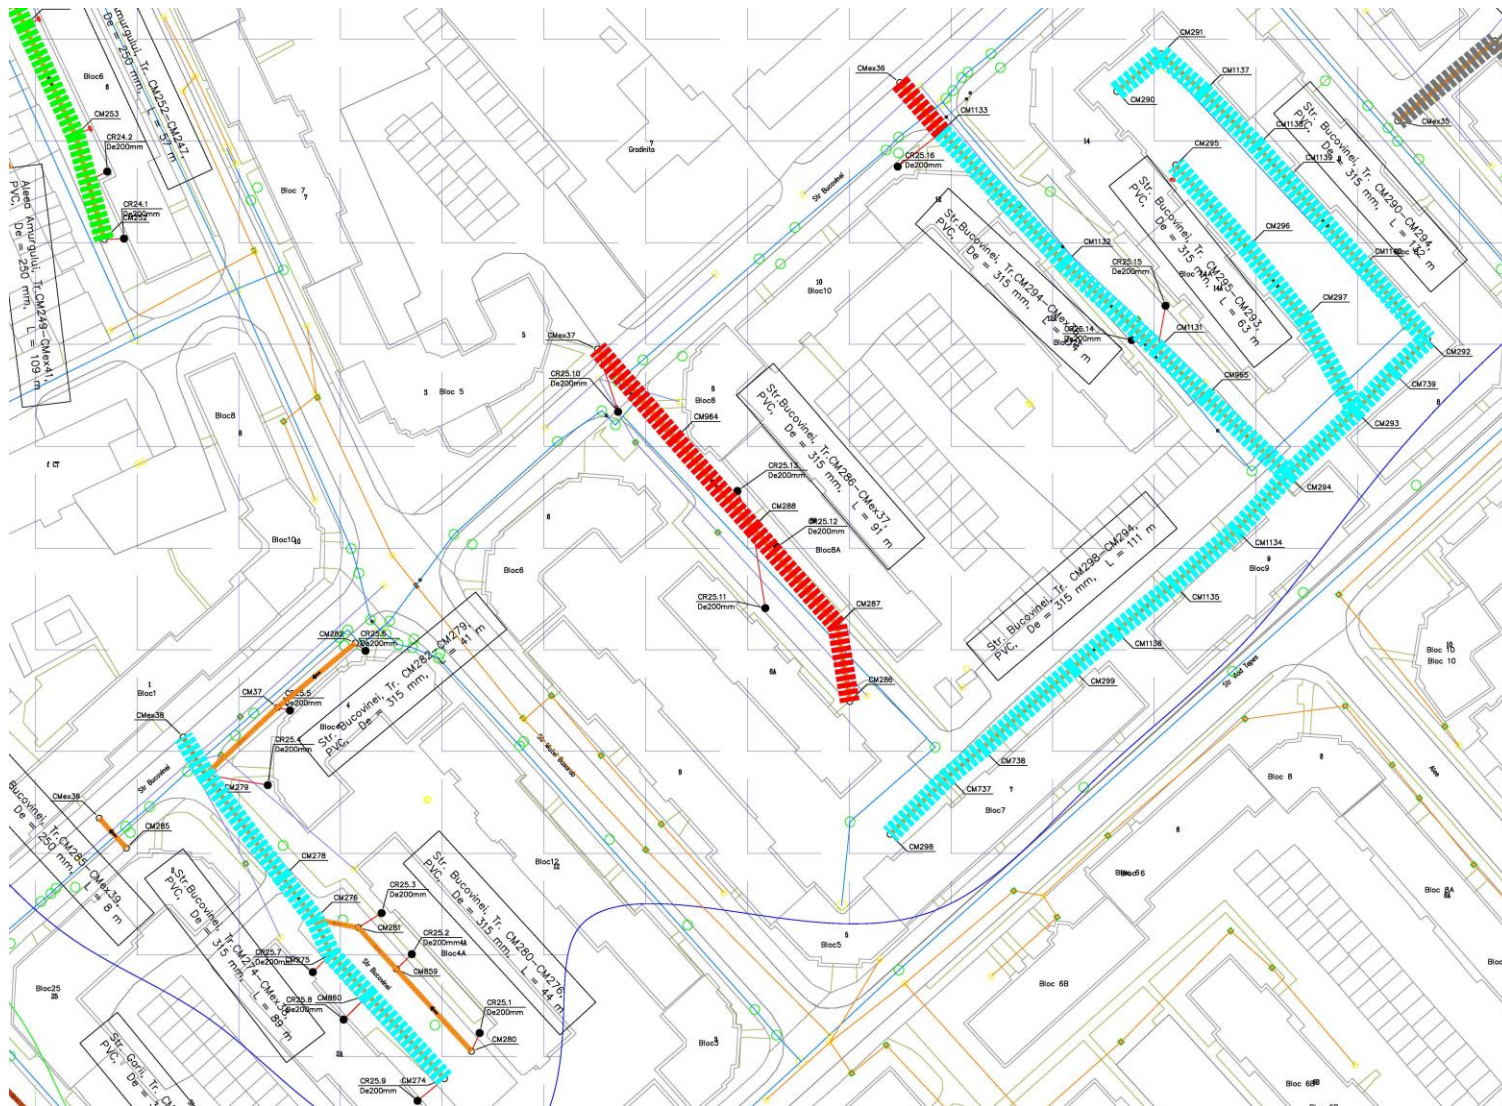


		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Bala Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Str. Bucovinei, Tr. CM280-CM276, Tr. CM282-CM279, Tr. CM290-CM294, Tr. CM295-CM293, Tr. CM298-CM294, Tr.CM274-CMex38, Tr.CM285-CMex39, Tr.CM286-CMex37, Tr.CM294-CMex36																								
Lista Nr.	D-2.2-12																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare							D8 - Camine de racord							Traversari						
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	40	40			0	100	DN 1000	buc.	16	0			16	0			0	0	#DIV/0!


D10 - Desfacerea sistemului rutier							D12 - Refacerea sistemului rutier										
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS				
	mp	833	0			833	0		mp	833	0			833	0		



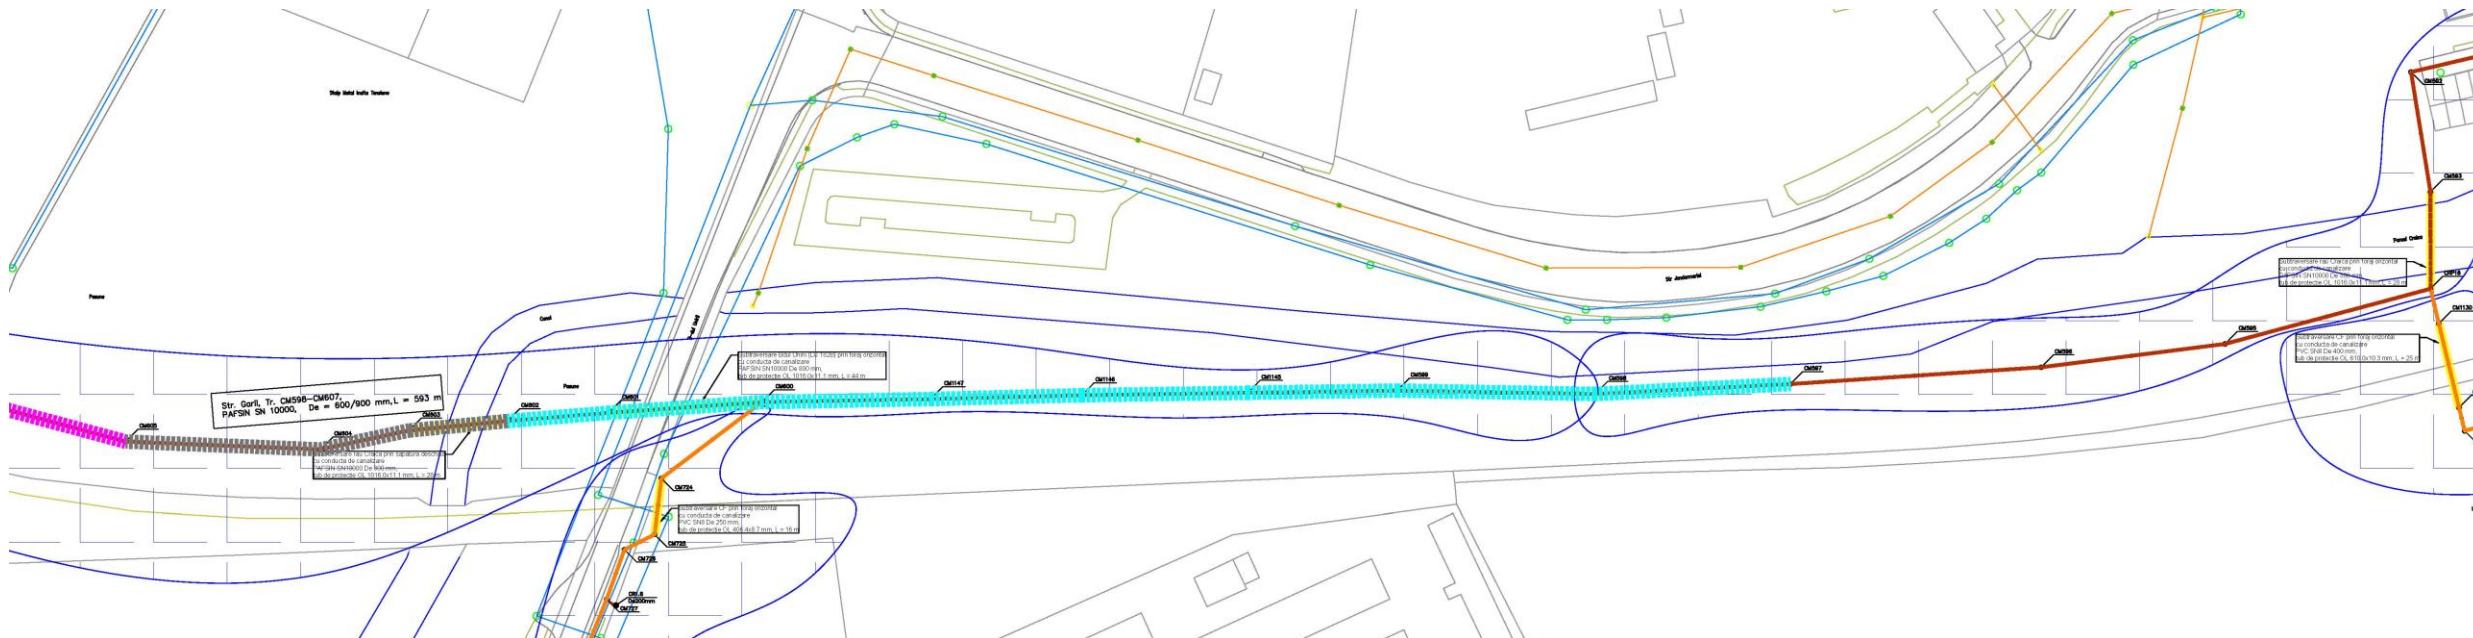

		D2 - Colectoare de canalizare								D5 - Camine de vane si camine de vizitare								Traversari				
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																					
Sub-Obiect	2.3 - Reabilitare colector de canalizare																					
Sectiune	Colector canalizare (Str. Paltinisului - Str. Garii), Tr. CM628-CMex23	DN 800	m	699	699			0	100		buc.	50	47			3	94	E-2.3-1	1	1	0	100
		De 600/900		1617	1304			313	81										3	2	1	66.7
		De 760/1140		818				818	0												0	#DIV/0!
		De 2100/1575		380				380	0												0	#DIV/0!
Lista Nr.	D-2.3-1			3514	2003	0	0	1511	57										4	3	1	75





D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba etanseitate	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	6715	0			6715	0		mp	6715	0			6715	0				

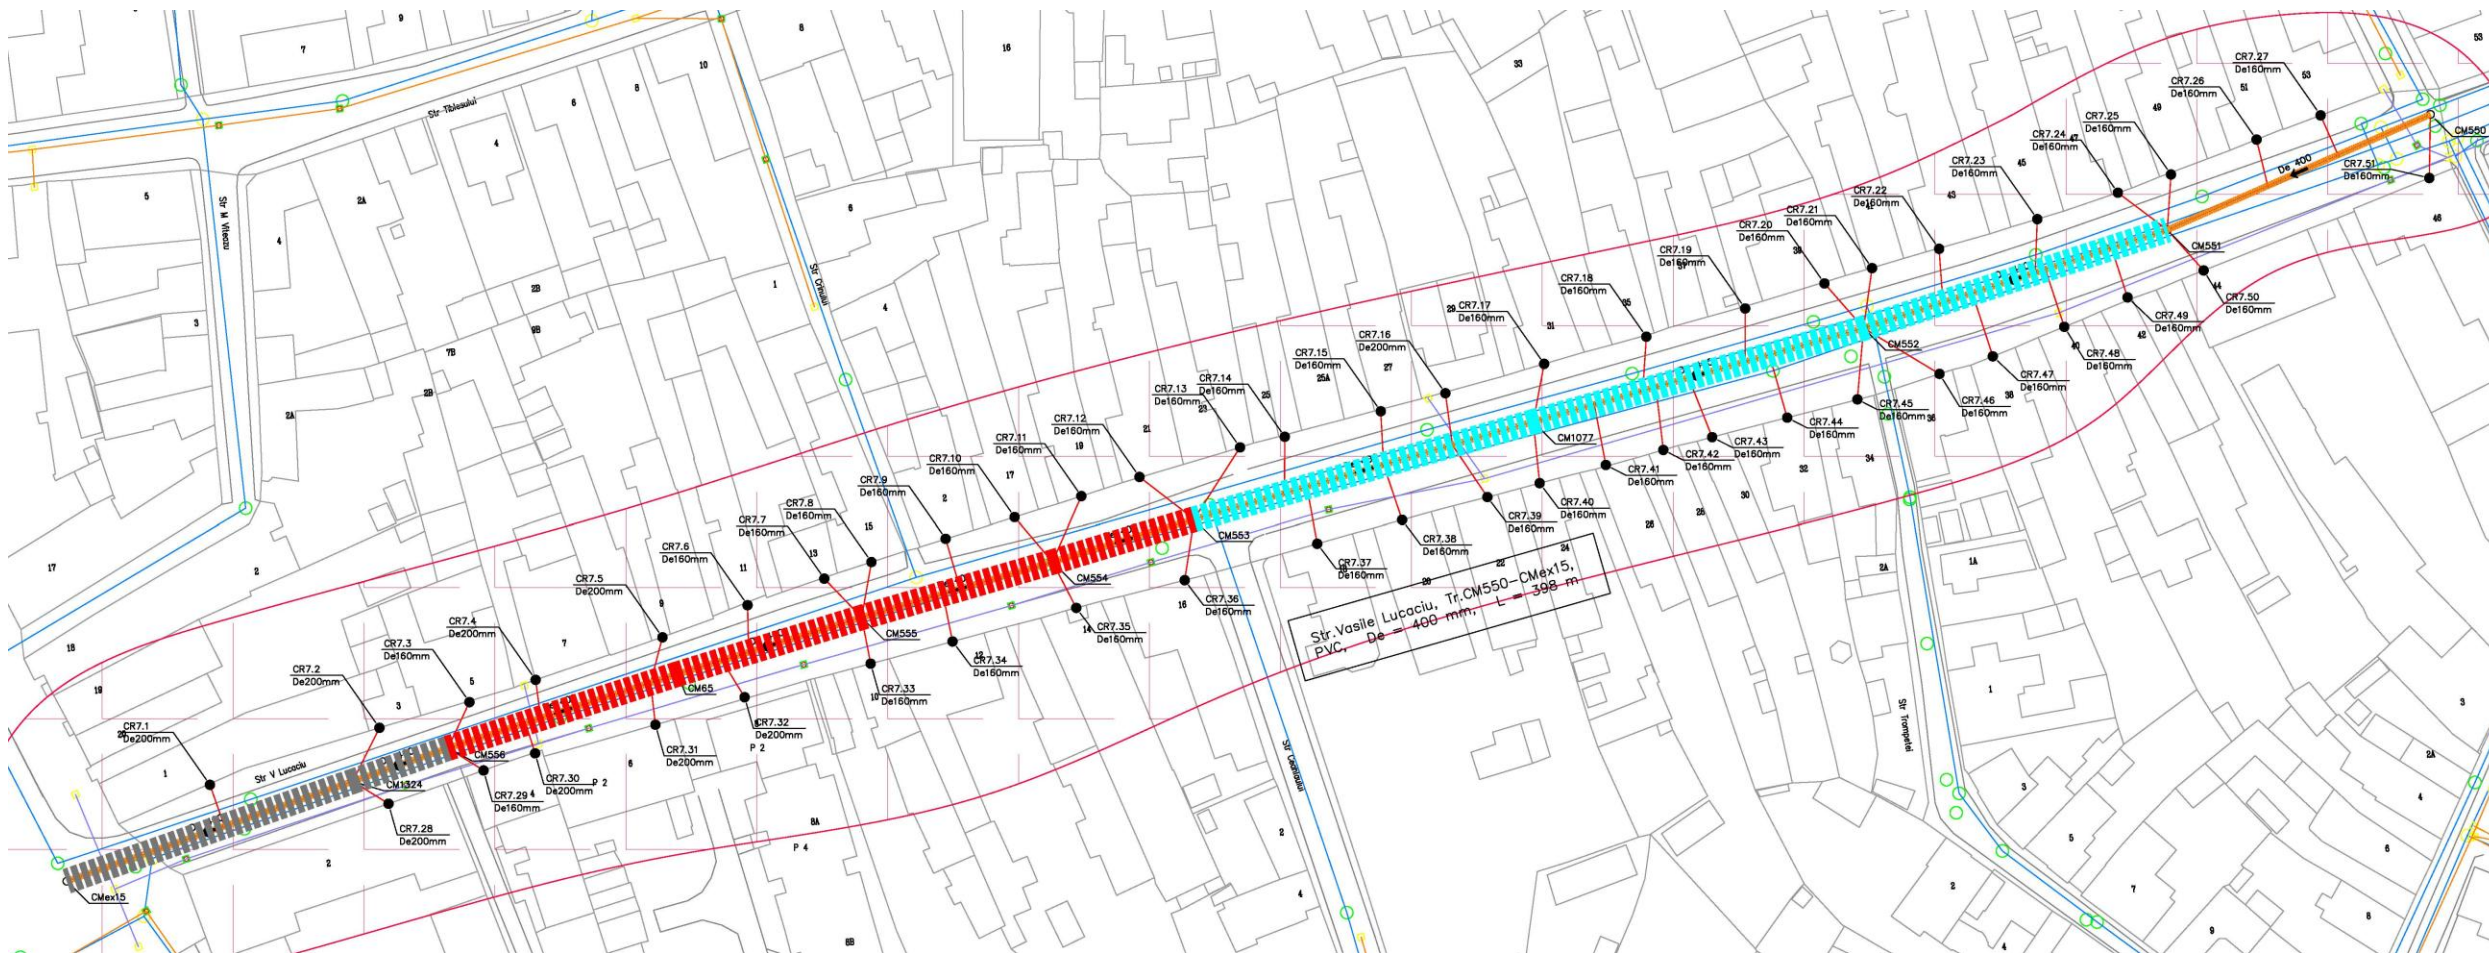


		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Str. Vasile Lucaciu, Tr. CM134-CM143, Tr. CM147-CM703, Tr. CM686-CMex3, Tr.CM550-CMex15	DN 600	m	595	271			324	46	De 200 De 400	m	518	163			355	31	De 160 De 200	m	600	300			300	50
Lista Nr.	D-2.2-24																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare							D8 - Camine de racord							Traversari						
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.	29	11			18	38	D 315 DN 800	buc.	60	30			30	50	E-2.2-1	5	0	5	0

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	2898	0			2898	0		mp	2898	0			2898	0				

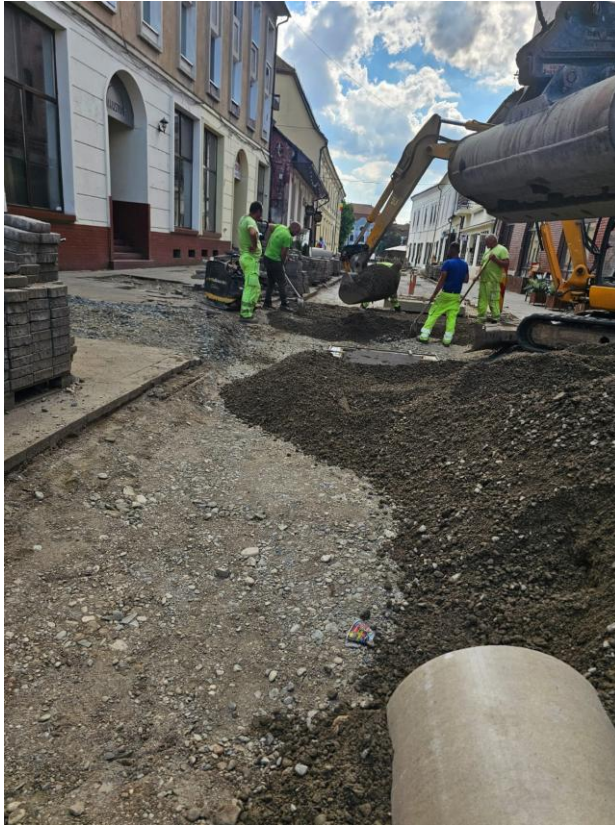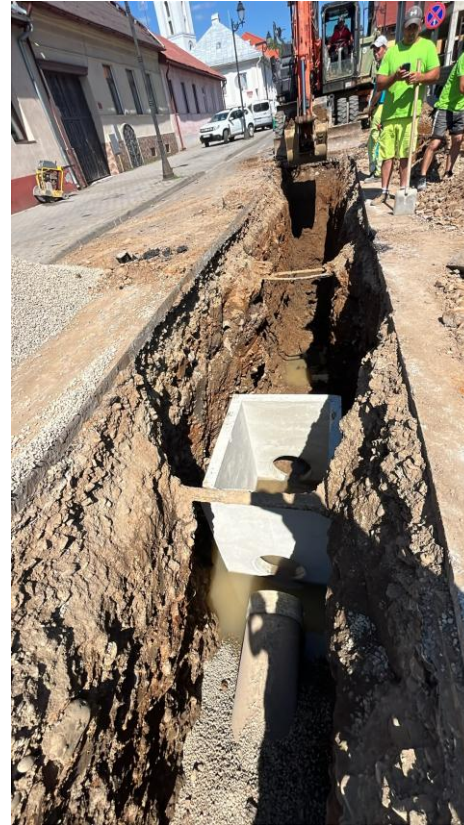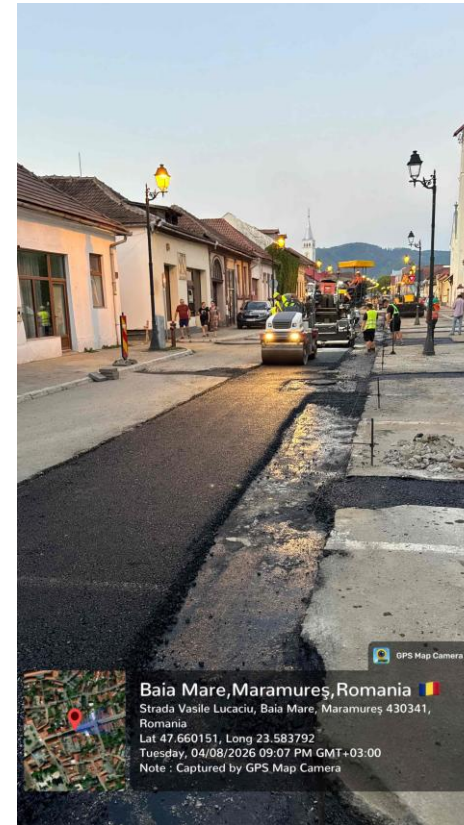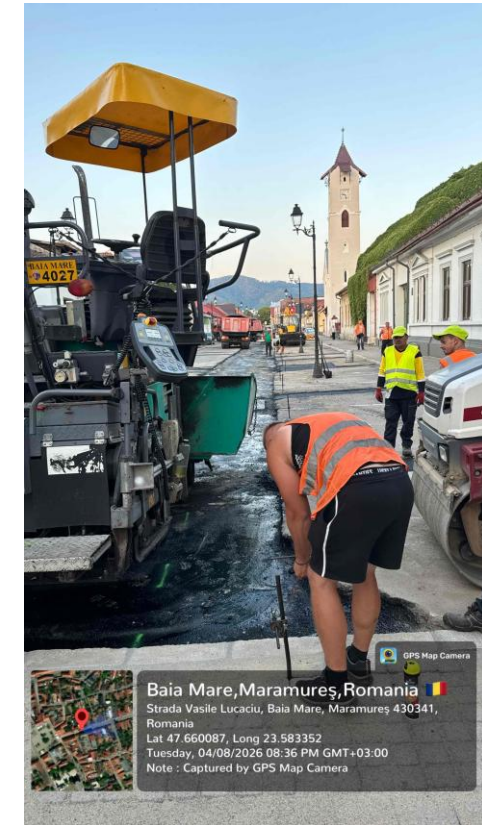

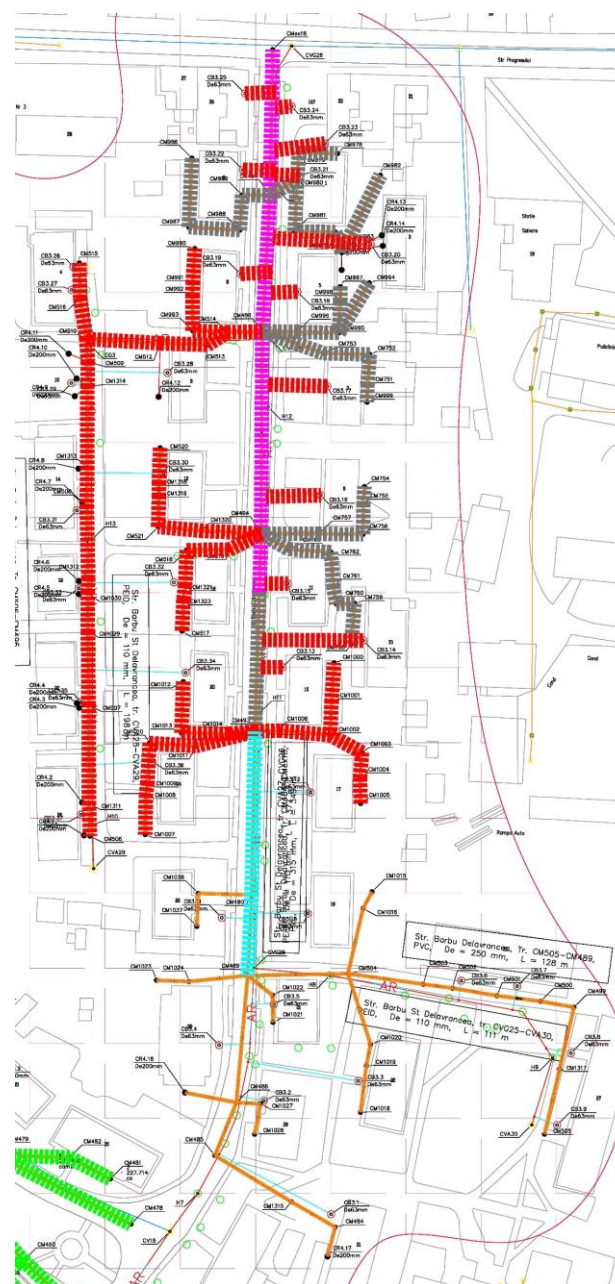

		D2 - Colectoare de canalizare																								
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																									
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																									
Sectiune	Str. Barbu Delavrancea, Tr. CM1000-CM1002, Tr. CM1005-CM493, Tr. CM1007-CM493, Tr. CM1012-CM493, Tr. CM1015-CM504, Tr. CM1018-CM504, Tr. CM1021-CM489, Tr. CM1023-CM489, Tr. CM1026-CM486, Tr. CM1037-CM490, Tr. CM484-CMex18, Tr. CM505-CM489, Tr. CM506-CM496, Tr. CM515-CM510, Tr. CM517-CM494, Tr. CM520-CM494, Tr. CM754-CM494, Tr. CM758-CM494, Tr. CM978-CM980, Tr. CM982-CM497, Tr. CM986-CM497, Tr. CM990-CM514, Tr. CM994-CM496, Tr. CM997-CM995, Tr. CM999-CM496			m		0			0	#DIV/0!	De 200 De 315	m	1438	789			649	55	De 200	m	170	0			170	0
Lista Nr.	D-2.2-7																									

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier						D12 - Refacerea sistemului rutier													
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
DN 1000	buc.	107	48			59	45	DN 1000	buc.	17	22			-5	129			0	0	#DIV/0!	mp	1230	0				1230	0	mp	1230	0				1230	0				

PROGRES GENERAL – MM-CL-06

DIMEX																		
	APA										CANALIZARE							
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI					PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT														
PROIECT	1294	9002	3536	1630	15462	74	151	41		PROIECT	2213	9123	2840	14176	593	226		
EXECUTAT	284	5479	1536	268	7567	16	2	9		EXECUTAT	1536	6429	508	8473	415	125		
PROCENT	21.95	60.9	43.4	16.4	48.9	21.6	1.3	22.0		PROCENT	69.4	70.5	17.9	59.8	70.0	55.3		
CONSTRUROM																		
	APA										CANALIZARE							
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI					PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT														
PROIECT		5694	1520	950	8164	43	87	21		PROIECT	2588	9649	3200	15437	468	266		
EXECUTAT		392	1583	369	2344	14	42	8		EXECUTAT	2019	9671	1258	12948	414	200		
PROCENT		6.9	104.1	38.8	28.7	32.6	48.3	38.1		PROCENT	78.0	100.2	39.3	83.9	88.5	75.2		
TOTAL																		
	APA										CANALIZARE							
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI					PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT														
PROIECT	1294	14696	5056	2580	23626	117	238	62		PROIECT	4801	18772	6040	29613	1061	492		
EXECUTAT	284	5871	3119	637	9911	30	44	17		EXECUTAT	3555	16100	1766	21421	829	325		
PROCENT	21.95	39.9	61.7	24.7	41.9	25.6	18.5	27.4		PROCENT	74.0	85.8	29.2	72.3	78.1	66.1		

PROGRES GENERAL PE OBIECTE – MM-CL-06

Obiect	1	Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	m	1294	284	-	284	21.95
Sub-Obiect	1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	m	13147	5479	392	5871	44.66
Sub-Obiect	1.3	Reabilitarea retelei de distributie apa potabila	m	4883	1536	656	2192	44.89
Sub-Obiect	1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	m	1549	-	758	758	48.93
Sub-Obiect	1.5	Extinderea retelei de distributie apa potabila	m	173	-	169	169	97.69
Sub-Obiect	1.6	Statie de pompare apa potabila	buc.	1	0	-	0	0.00
Obiect	2	Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	2.1	Extindere retea de canalizare	m	5393	362	4613	4975	92.25
Sub-Obiect	2.2	Reabilitare retea de canalizare	m	15864	6904	5773	12677	79.91
Sub-Obiect	2.3	Reabilitare colector de canalizare	m	3514	-		2003	57.00
Sub-Obiect	2.4	Statii de pompare apa uzata si conducta de refulare						
		<i>Statii de pompare apa uzata</i>	buc.	2	0	0	0	0.00
		<i>Conducte de refulare</i>	m	1649	0	690	690	41.84
Sub-Obiect	2.5	Reabilitare devorsor, B-dul Bucuresti	buc.	1	-	0	0	0.00

ZONE INCEPERE LUCRARI AUGUST-SEPTEMBRIE 2026:

- 1. Str. George Cosbuc – reabilitare retea de canalizare**
- 2. Str. Corbului – reabilitare retea de transport – PIED De800 mm**
- 3. B-dul. Bucuresti – reabilitare retea de canalizare**
- 4. B-dul. Unirii – reabilitare retea de transport si reabilitare retea canalizare**
- 5. Str. Dumbravei - reabilitare retea de canalizare**
