

***SEDINTA LUNARA DE PROGRES
MAI 2026***

***PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL
MARAMURES***

***MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni,
Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardusat***

***MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus,
Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardasat***

1. DETALII CONTRACT

Contract	Contractul de lucrari nr. 233 /10.10.2024: Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardasat		
Program	<i>PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES</i>		
Contractor	Asocierea VIDELI SRL – TERMOPRO EDIL SRL – WINTER COM SRL –PROIECT INVEST SRL, prin lider de asociere VIDELI SRL		
Valoarea Contractului LEI	99 961 651.11 fara TVA		
Data acordului	10.10.2024		
Data de incepere a contractului	08.01.2025	Durata contractului:	30 LUNI
Data planificata pentru finalizare	08.07.2027		

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardușat

2. DETALII PARTI IMPLICATE

Beneficiar final	SC VITAL SA
Adresa	Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 21, Jud, MARAMURES
Telefon	0262 215 150
E-mail	office@vitalmm.ro , uip@vitalmm.ro
Consultanta	Asistenta tehnica supervizare din partea Beneficiarului
Adresa	Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 21, et. 3, Jud. MARAMURES
Telefon	0791 328 794; 0791 328 795; 0740 016 763.
E-mail	supervizare@vitalmm.ro
Antreprenor	Asocierea VIDELI SRL – TERMOPRO EDIL SRL – WINTER COM SRL –PROIECT INVEST SRL, prin lider de asociere VIDELI SRL
Adresa	SATU MARE , B-dul VASILE LUCACIU , Nr. 16, Jud. SATU-MARE
Telefon	0261 750 518, 0742 468 601, 0744 297 214
E-Mail	cl11.videli@gmail.com

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnica, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

Situatia predariiilor de amplasament in cadrul Contractului de Lucari de CL- 11 este urmatoarea:

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
1	UAT Targu Lapus	1 / 02.04.2025	-
2	UAT Targu Lapus	2 / 24.04.2025	Zona cuprinsa intre Str. Zorilor si Str. Stadionului
3	UAT Miresu Mare	3 / 09.05.2025	Strazile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 31 (DJ 108E)
4	UAT Ulmeni	4 / 09.05.2025	Strazile: Petru Dulfu, Dr. Florian C, Ulmeanu, Plopsor
5	UAT Targu Lapus	4/ 20.05.2025	Damacuseni – str. Principala 2 cu ramificatiile str. 8, 9. 10 Rogoz – str. 2 apa si canal
6	UAT Miresu Mare	6 / 03.06.2025	Strazile: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, Strazile : 21, 22, 23, 24, 25,26,27, 28, 29, 30, 32
7	UAT Miresu Mare	7/ 13.06.2025	Strazile loc, Iadara: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
8	UAT Ulmeni	8/ 13.06.2025	Strazile loc Ulmeni: Depozitelor, Pietrari, Primaveraii, Somesului, Balastierei Strazile loc. Chelinta: DJ108E, Principala, 1, 3, 4, 8

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnica, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

CONTINUARE

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
9	UAT Miresu Mare – localitatile Iadara, Remeti pe Somes, Tulghes	9 / 18.07.2025	Strazile: 1, 2, 3, 4, 5 – localitatea Iadara Strazile : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - localitatea Remeti pe Somes. Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – localitatea Tulghes
10	UAT Arduat	10 / 22.07.2025	Strazile: Principala (DJ193), 1, 2, 3, 4
11	UAT Suciul de Sus	11 / 07.08.2025	Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – localitatea Suciul de Sus Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - localitatea Suciul de Jos
12	UAT Targu Lapus	12/ 25.02.2026	Targu Lapus - Retea Apa- Str. Mihai Eminescu, Str. Liviu Regreanu, Str. Pietei, Str. Horea, Str. Petru Rares ; Retea Canal - Str. Piata Eroilor, Str. Doinei, Str. Salcamului, Str. Petru Rares, Damacuseni – str. Principala 1 cu ramificatiile str. 2, 4; str. Principala 1DJ cu ramificatiile str. 2, 3, 4, 5,7; Rogoz – str. Principala 2, str. 2, 3; apa si canal Razoare – Retea de apa - str. DJ 109 F, Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

RETEA DE DISTRIBUTIE APA

Nr. Crt.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. Stadionului	876	110	41	24.04.2025	15.06.2025	876 (100%)	41 (100 %)
2	Str. 2-1	550	110	28	13.06.2025	22.06..2025	550 (100%)	28 (100%)
3	Str. 2-3	350	110	25	02.06.2025	10.06.2025	350 (100%)	25 (100%)
4	Str. Canalului	259	110	6	23.03.2026	27.03.2026	230(89%)	6(100%)
5	Str. Mihai Eminescu 1	270	110	22	22.05.2026	05.06.2026	270 (100%)	22 (100%)
6	Str. Mihai Eminescu 2	63	110	4	22.05.2026	25.05.2026	63 (100%)	4 (100%)
	TOTAL LUNGIME APA TARGU LAPUS	5 997	110	326			2 339 (39%)	125 (35%)

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Ardușat

RETEA DE CANALIZARE

Nr. Crt.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. Salcamului – extindere canal	106	250	4	19.03.2026	27.03.2026	106 (100%)	2 (100 %)
2	Str. Liliacului – reabilitare canal	253	250	13	30.04.2026	10.05.2026	253 (100%)	13 (100%)
3	Str. Mioritei – reabilitare canal	192	250	9	05.05.2026	10.05.2026	192 (100%)	9 (100%)
	TOTAL LUNGIME CANAL - EXTINDERE TARGU LAPUS	305	250	14			106 (35%)	4 (29%)
	TOTAL LUNGIME CANAL - REABILITARE TARGU LAPUS	5324	250	209			445 (8%)	22 (11%)

Str.Mioritei




Str. Mioritei



Str. Mihai Eminescu - apa



Str. Mihai Eminescu - apa

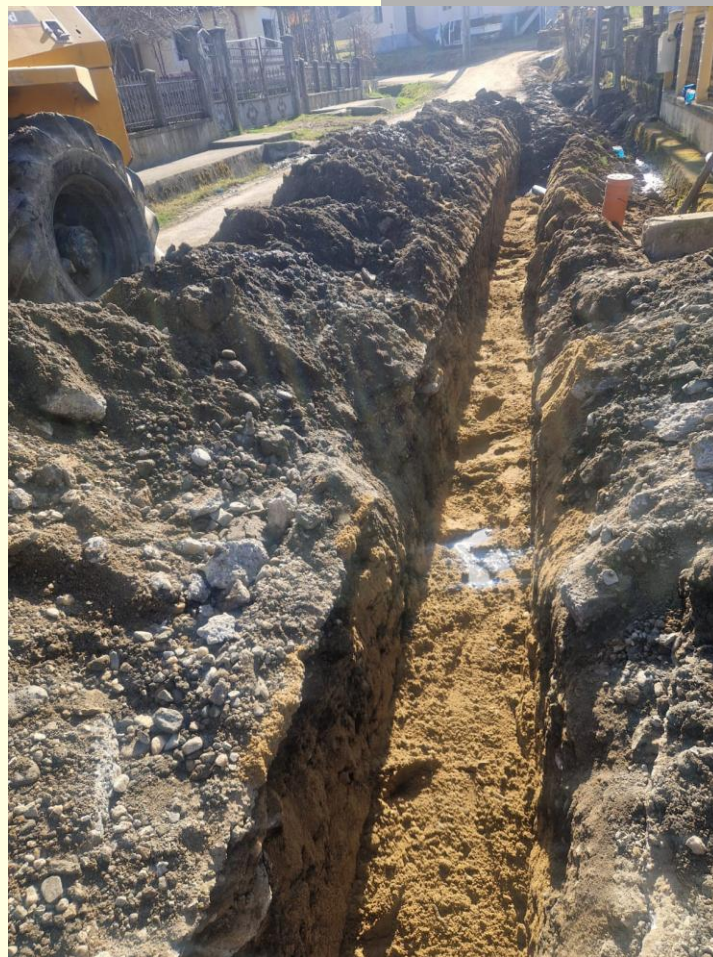

Str. Mihai Eminescu - apa



MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardușat

RETEA DE DISTRIBUTIE APA

N r. C r t.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
4	Str. 1 (Damacuseni) – extindere apa	296	110	21	20.05.20 25	02.06.202 5	296 M (100%)	21 (100 %)
5	Str. 2 (Damacuseni) – extindere apa	189	110	14	20.05.20 25	30.06.202 5	189 (100%)	14 (100%)
	Str. 4 (Damacuseni) – extindere apa	157	110	11	05.12.2025	10.03.2026	157 (100%)	11 (100%)
6	Str. 6 (Damacuseni) – extindere apa	174	110	12	20.10.2025	10.11.2025	174 (100 %)	12 (100%)
TOTAL LUNGIME APA DAMACUSENI		3 059	110	210			816 (27%)	58 (28%)


MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduzat

RETEA DE CANALIZARE RETEA DE CANALIZARE

Nr. Cr t.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1	294	250	9	04.06.2025	25.06.2025	293 (100%)	9 (100%)
2	Str. Principala 2	1138	250	101	02.07.2025	30.08.2025	1138 (92%)	101 (100%)
	Str. 3	89	250	6	09.03.2065	12.03.2026	89 (100%)	6 (100%)
3	Str. 5	93	250	3	09.03.2026	15.03.2026	60 (30%)	3 (100%)
4	Str. 6	174	250	10	15.10.2025	15.11.2025	174 (100%)	10 (100%)
5	Str. 7	276	250	12	15.10.2025	15.11.2025	275 (100%)	12 (100%)
6	Str. 8	205	250	15	15.10.2025	15.11.2025	205 (100%)	15 (100%)
7	Str.9	93	250	2	15.10.2025	31.10.2025	93 (100%)	2 (100%)
8	Str.10	88	250	2	04.11.2025	09.11.2025	88 (100%)	2 (100%)
TOTAL LUNGIME CANAL DAMACUSENI		6 883	250	389			2 415 (35%)	160 (41%)

STRĂZI EXECUTATE

STRĂZI NEXECUTATE

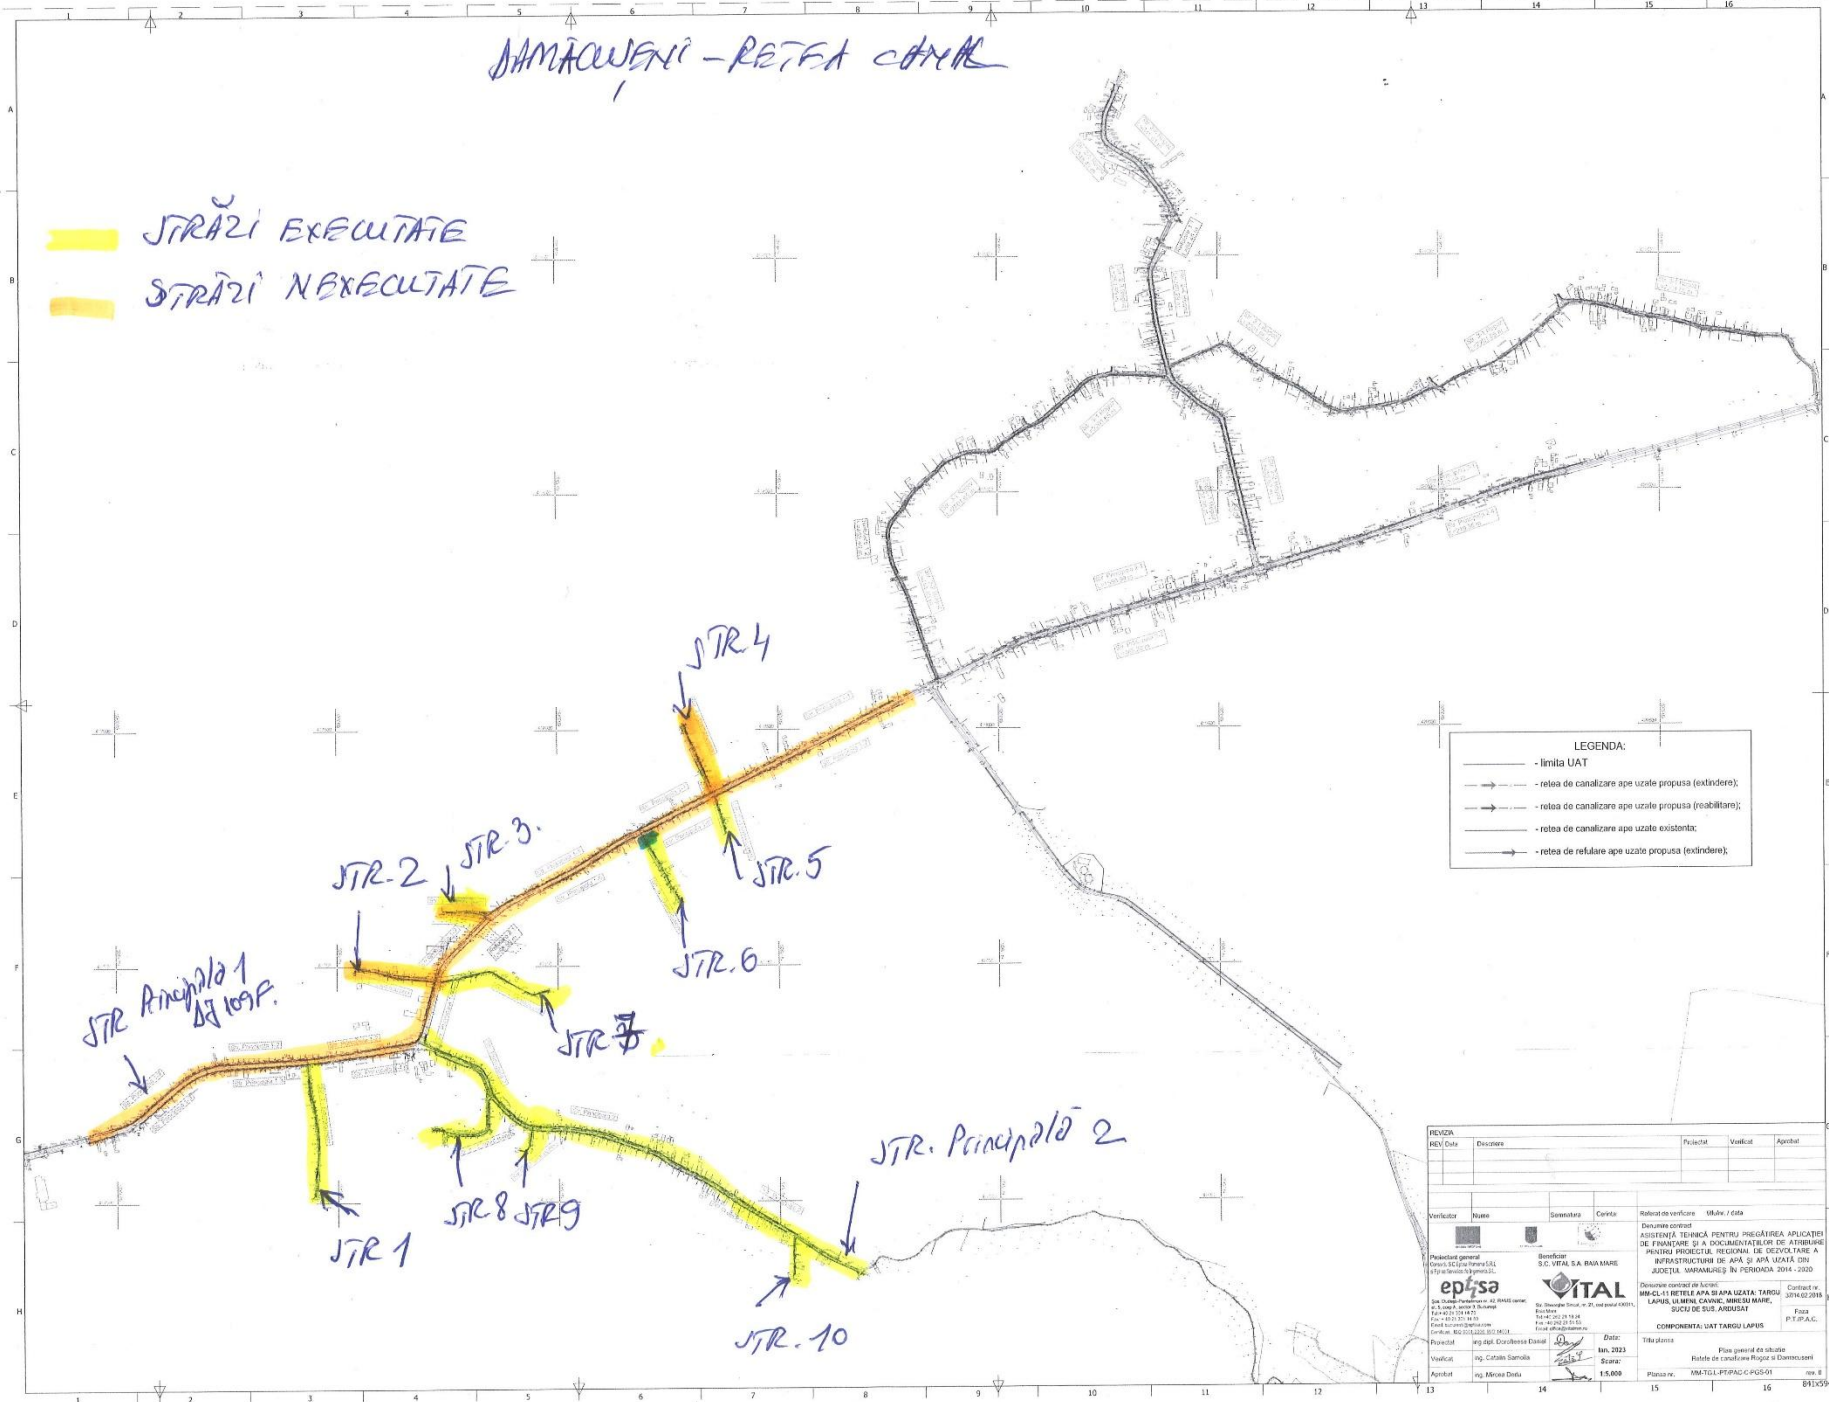[illegible]



SIR 6.

512.2

STR-4

07. 109F

JTR. 1

STRĂZI' MEXECUTATE

[illegible][illegible]

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
1	UAT Miresu Mare	3 / 09.05.2025	Strazile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 31 (DJ 108E)
2	UAT Miresu Mare	6 / 03.06.2025	Strazile: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, Strazile : 21, 22, 23, 24, 25,26,27, 28, 29, 30, 32
3	UAT Miresu Mare – localitatile Iadara, Remeti pe Somes, Tulghes	9 / 18.07.2025	Strazile: 1, 2, 3, 4, 5 – localitatea Iadara Strazile : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - localitatea Remeti pe Somes. Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – localitatea Tulghes

In baza acestor predari de amplasament la UAT Miresu Mare avem urmatorul progres fizic :

Nr. Cr t.	Nume strada MIRESU MARE	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1-Tuicani	110	233	22	11.06.2025	18.06.2025	233 (100%)	22 (100%)
2	Str. 2-Tuicani	110	249	19	12.06.2025	30.06.2025	249 (100%)	19 (100%)
3	Str. 3-Mitroii	110	781	41	03.06.2025	12.06.2025	781 (100%)	41 (100%)
4	Str. 4-Lazuti	110	577	31	13.06.2025	17.06.2025	577 (100%)	31 (100%)
5	Str. 5-Lazuti	110	396	20	17.06.2025	20.06.2025	396 (100%)	20 (100%)
6	Str. 6-Apries	110	618	40	09.05.2025	30.05.2025	618 (100%)	34 pe str. 6.1 si 6 pe str. 6.2 = 40 (100%)
		110	144		09.05.2025	30.05.2025	144 (100%)	
7	Str. 7-Dr. Fatcasan	110	119	7	23.06.2025	30.06.2025	119 (100%)	7 (100%)
8	Str. 8-Terenului	110	250	13	24.06.2025	15.06.2025	250 (100%)	13 (100%)
9	Str. 9-Terenului	110	327	17	09.05.2025	31.07.2025	327 (100%)	17 (100%)
10	Str.10-Somesului	110	202	11	25.07.2025	31.07.2025	202 (100%)	11 (100%)
11	Str.11-Roman	110	126	10	27.07.2025	03.08.2025	126 (100%)	10 (100%)
12	Str.12-Inatului	110	324	22	22.07.2025	10.08.2025	324 (100%)	22 (100%)
13	Str.13-Malinului	110	325	17	20.07.2025	04.08.2025	325 (100%)	17 (100%)
14	Str.14-Dupa Sat	110	445	29	17.07.2025	10.08.2025	445 (100%)	29 (100%)
15	Str. 17	110	520	32	01.08.2025	15.08.2025	520 (100%)	32 (100%)

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduhat

continuare

Nr. Crt.	Nume strada MIRESU MARE	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
16	Str. 18	110	257	14	07.08.2025	10.08.2025	257 (100%)	14 (100%)
17	Str. 19	110	93	6	20.07.2025	22.07.2025	93 (100%)	6 (100%)
18	Str. 20-Vaii	110	114	6	12.06.2025	17.06.2025	114 (100%)	6 (100%)
19	Str. 21-N. Grigorescu	110	69	4	12.06.2025	17.06.2025	69 (100%)	4 (100%)
20	Str. 22-Florilor	110	220	15	12.06.2025	14.06.2025	220 (100%)	15 (100%)
21	Str. 23-Sperantei	110	313	16	12.06.2025	20.06.2025	313 (100%)	16 (100%)
22	Str. 24-Plopilor	110	102	6	05.06.2025	09.06.2025	102 (100%)	6 (100%)
23	Str. 25-Corha	110	570	30	11.06.2025	12.06.2025	570 (100%)	30 (100%)
24	Str. 26-Corha	110	81	5	18.06.2025	25.06.2025	81 (100%)	5 (100%)
25	Str. 27	110	240	13	04.06.2025	05.06.2025	240 (100%)	13 (100%)
26	Str. 28	110	57	3	15.07.2025	31.07.2025	57 (100%)	3 (100%)
27	Str. 29	110	108	6	24.08.2025	25.08.2025	108 (100%)	6 (100%)
28	Str. 30 (DJ 182B) spre Somcuta Mare	110	1436	144	09.05.2025	31.12.2025	1436 (100%)	144 (100%)
		110	1415				1415 (100%)	

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduhat

continuare

Nr. Crt.	Nume strada MIRESU MARE	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
29	Str. 31 (DJ 108E) spre Remeti pe Somes	1275	110	240	09.05.2025	30.04.2026	1275(100%)	130 (52%)
		1294	110				1294 (100%)	
		920	110				920 (100%)	
		899	110				899 (100%)	
		411	110				0	
TOTAL LUNGIME APA MIRESU MARE		15 510	110	850			14 396 (92%)	740 (87%)



MIRESU MARE


— străzi executate
 — străzi în execuție
 — străzi ce urmează a fi executate.

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
1	UAT Miresu Mare	7/ 13.06.2025	Strazile loc, Iadara: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
2	UAT Miresu Mare – localitatile Iadara, Remeti pe Somes, Tulghes	9 / 18.07.2025	Strazile: 1, 2, 3, 4, 5 – localitatea Iadara Strazile : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - localitatea Remeti pe Somes. Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – localitatea Tulghes


Nr. Crt.	IADARA Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1 - Florilor -Iadara	110	510	26	01.07.2025	30.07.2025	510 (100%)	26 (100%)
2	Str. 2 - Florilor -Iadara	110	111	6	04.07.2025	10.07.2025	111 (100%)	6 (100%)
3	Str. 3 - Unirii -Iadara	110	409	21	10.07.2025	15.07.2025	409 (100%)	21 (100%)
4	Str. 4	110	316	16	10.07.2026	15.07.2026	316 (100%)	16 (100%)
5	Str. 5 - Unirii -Iadara	110	407	21	14.07.2025	20.07.2025	407 (100%)	21 (100%)
6	Str. 6 – Pipera- Iadara	806	110	41	17.07.2025	31.07.2025	806 (100%)	41 (100%)
7	Str. 7	110	387	20	28.08.2025	03.09.2025	387 (100%)	20 (100%)
8	Str. 8	649	110	33	15.07.2025	31.07.2025	649 (100%)	33 (100%)
9	Str. 9	110	397	20	13.06.2025	15.07.2025	397 (100%)	20 (100%)
10	Str. 10	110	800	40	16.06.2025	25.08.2025	800 (100%)	40 (100%)
11	Str. 11	110	700	33	17.06.2025	26.07.2025	700 (100%)	33 (100%)
12	Str. 12	110	682	34	13.06.2025	26.07.2025	682 (100%)	34 (100%)
13	Str. 13	110	112	6	14.06.2025	17.06.2025	112 (100%)	6 (100%)
14	Str. 16	110	1833	92	13.06.2025	04.07.2025	1833 (100%)	92 (100%)
15	Str. 17	110	310	16	14.06.2025	26.06.2025	310 (100%)	16 (100%)
16	Str. 18	110	293	15	16.06.2025	26.06.2025	293 (100%)	15 (100%)
TOTAL LUNGIME IADARA		8 722	110	440			8 722 (100%)	440 (100%)

străzi executate

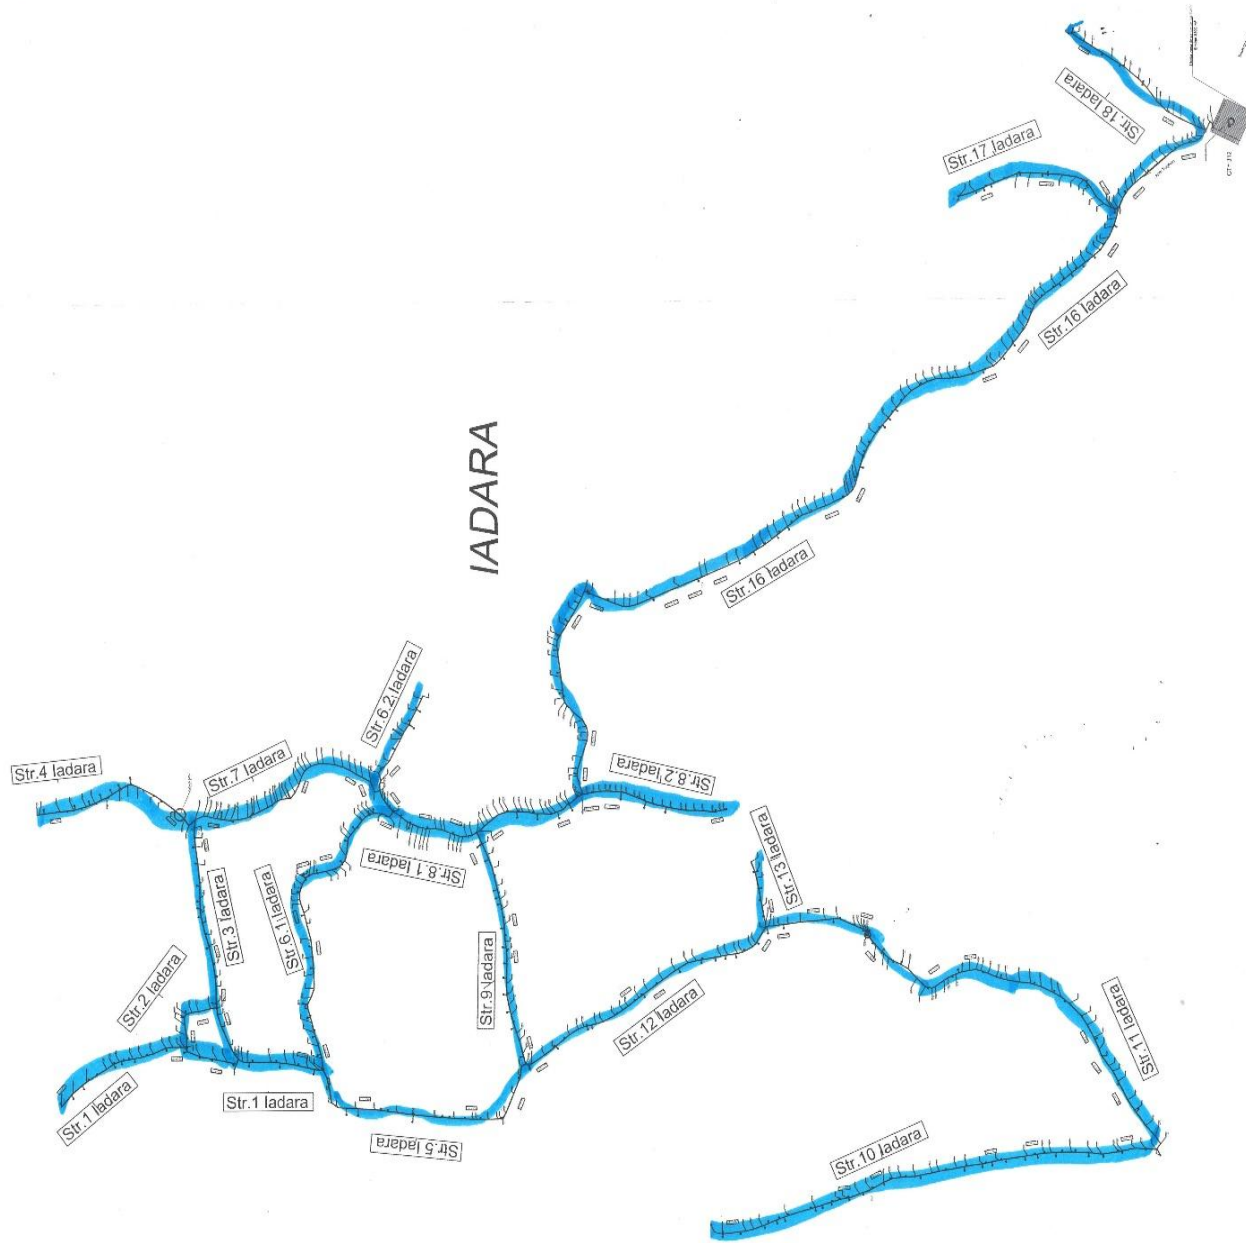

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduzat

Nr. Cr t.	REMETI PE SOMES Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1	110	530	73	11.05.2026	15.06.2026	150 (28%)	
			455					
			419					
2	Str. 2	110	1262	68	25.03.2026	20.04.2026	1262(100%)	10
3	Str. 3	110	435	40	18.03.2025	31.03.026	435 (100%)	12
			79				79 (100%)	10
4	Str. 4	110	227	24	12.03.2025	17.03.026	227 (100%)	12
5	Str. 5	110	136	15	17.03.2025	25.03.026	136 (100%)	15
6	Str. 6	110	69	5	18.03.2025	18.03.2025	69 (100%)	5
7	Str. 7	110	1108	64	02.12.2025	19.04.2026	1108 (100%)	20
8	Str. 8	110	157	19	05.12.2025	19.04.2026	157 (100%)	11
9	Str. 9	110	1654	-	30.03.2025	20.05.2026	1654 (100%)	1
TOTAL LUNGIME APA REMETI PE SOMES			6 531	308			5 277 (81%)	96 (31%)

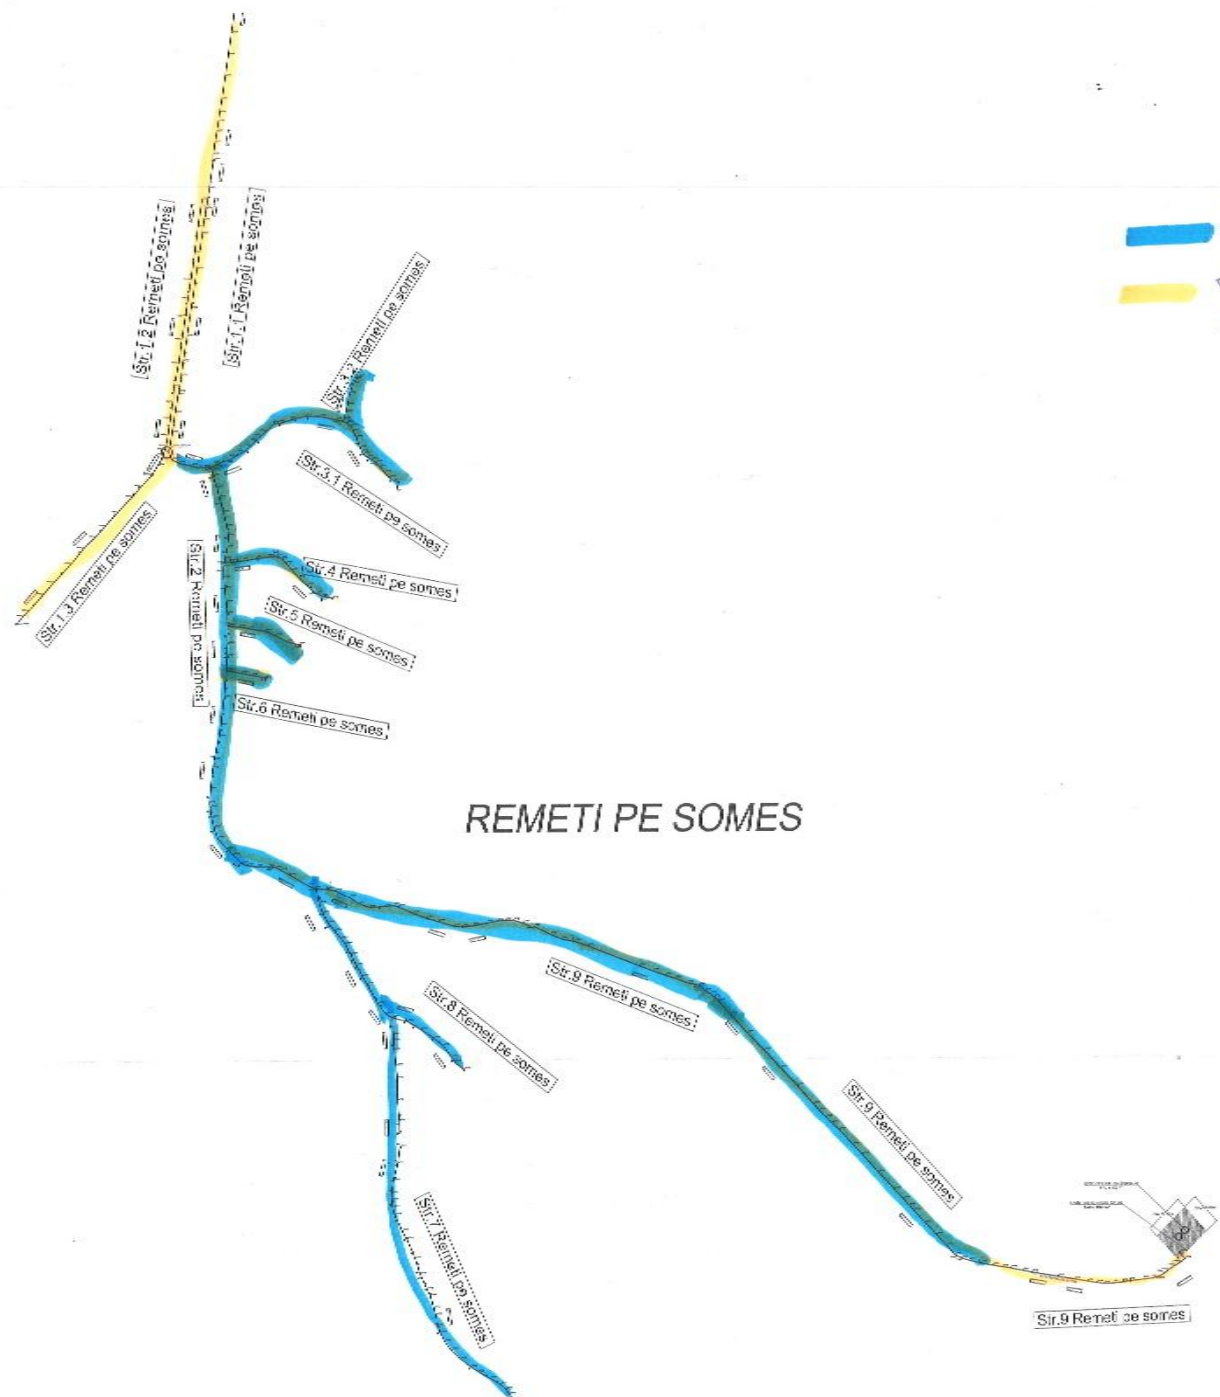

REMETI PE SOMES

— străzi executate.
— străzi ce urmează
să fie executate.

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Ardușat

Nr. Crt	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Balastierei – extindere retea	63	104	14	13.06.2025	14.06.2025	104 (53%)	14 (100%)
2	Petre Dulfu – extindere retea	110	1875	110	09.05.2025	30.11.2025	1 875 (100%)	70 (100%)
3	Pietrari – extindere retea	63	128	8	16.06.2025	20.06.2025	128 (100%)	8 (100%)
4	Plopsor- extindere retea	63	116	6	09.05.2025	30.05.2025	116 (100%)	6 (100%)
5	Primaverii – extindere retea	110	303	16	15.06.2025	17.06.2025	303 (100%)	16 (100%)
6	Somesului- extindere retea	63	127	6	23.06.2025	17.07.2025	127 (100%)	6 (100%)
TOTAL EXTINDERE APA			2 653	160			2 653 (100%)	160 (100%)
1	Balastierei – reabilitare retea	63	279	6	15.06.2025	22.06.2025	279 (100%)	6 (100%)
		110	45				45 (100%)	
2	Depozitelor– reabilitare retea	63	166	10	13.06.2025	14.07.2025	166 (100%)	10 (100%)
		110	524				524 (100%)	
3	F. C. Ulmeanu– reabilitare retea	110	368	10	09.06.2025	25.07.2025	368 (100%)	10 (100%)
4	Pietrari– reabilitare retea	63	34	1	16.06.2025	20.06.2025	34 (100%)	1 (100%)
TOTAL REABILITARE APA			1 416	27			1 416 (100%)	27 (100%)
TOTAL LUNGIME APA ULMENI		110; 63	4 069	187			4069 (100%)	157 (87%)

ULMENI

- Strazi executate
- Strazi în executie
- Strazi în de înmădare
d/î executate



MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduzat

N r. C rt	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamen te (buc)
1	Rezervor-Chelinta	110	816	-	16.06.2025	20.06.2025	816 (100%)	0
2	Strada 1	75	427	21			0	0
3	Strada 3	75	557	29	25.05.2026	20.06.2026	120 (22%)	15
4	Strada 4	63	71	6	26.05.2026	28.05.2026	71 (100%)	6
5	Strada 8	63	287	17	18.05.2026	22.05.2026	287 (100%)	17
6	str. DJ108E	63	1602	265	07.10.2025	30.07.2026	1550 (96%)	150 (57%)
		110	3059				1400 (42%)	
7	str. Principala	110	643	39	24.06.2025	10.07.2025	643 (100%)	39 (100%)
TOTAL LUNGIME APA CHELINTA		63, 75, 110	7 462	377			4 887 (65%)	189 (50%)

Str. 1 - apa



Str. 1 - apa



Str. 1 - apa



Str. 4 - apa



Str. 8 - apa



Str. 8 - apa



MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardu sat

In concluzie la nivel de CL-11 pana in data de 31.08.2025 s-au realizat urmatoarele:

N r. C rt .	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungi me conduc ta contra ct (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioad a finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
	TOTAL LUNGIME APA TARGU LAPUS	5 997	110	326			2 006 (35%)	47 (14%)
	TOTAL LUNGIME CANAL TARGU LAPUS	5629	110	120			336 (5.9%)	15 (100%)
	TOTAL LUNGIME APA DAMACUSENI	3 059	110	210			816 (23%)	58 (28%)
	TOTAL LUNGIME CANAL DAMACUSENI	6 883	250	389			2 238 (33%)	152 (39%)
	TOTAL LUNGIME APA MIRESU MARE	15 510	110	850			15 510 (100%)	740 (87%)
	TOTAL LUNGIME IADARA	8 722	110	440			8 722 (100%)	440 (100%)
	TOTAL LUNGIME REMETI PE SOMES	6 531	110	308			3 836 (96%)	96 (31%)
	TOTAL LUNGIME APA ULMENI	4 069	110, 63, 25	187			4 069 (100%)	127 (88%)
	TOTAL LUNGIME APA CHELINTA	7 462	63, 75, 110	377			4 259 (57%)	189 (50%)
	TOTAL LUNGIME APA CL-11	87 684	63, 75, 110	5 232			37 229 (42%)	1 622 (31%)
	TOTAL LUNGIME CANAL CL-11	20 205	250	1004			2 574 (12%)	149 (15%)
