

**“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
in judetul Maramures”**

CONTRACT DE LUCRARI - MM-CL-06

“RETELE DE APA SI APA UZATA BAIA MARE”

Beneficiar: **VITAL S.A**

Antreprenor: **Asocierea DIMEX-2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL**

Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L



OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	L = 1324 m, PEID PE100 PN10; De 1000 mm
Sub-obiect 1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	L = 13926 m, PEID PE100 PN10; De 315 mm ÷ 800 mm
Sub-obiect 1.3	Reabilitare retelei de distributie apa potabila	L = 4994 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm ÷ 400 mm
Sub-obiect 1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 1644 m, PEID PE100 PN10; De 400 mm
Sub-obiect 1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila	L = 173 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.6	Statie de pompare apa potabila	Grup pompare (2A+1R), Qgr = 10 l/s, Hp=30 m, P= 9,0 kW; Dimensiuni constructie: 5,5 x 2,4 x 2,7 m
OBIECT 2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea de canalizare	L = 5531 m, PVC SN8; De 250 mm; PAFSIN SN10000 De 500 mm
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea de canalizare	L = 16995 m, PVC SN8; De 250 mm ÷ De 400 mm; PAFSIN SN10000 De 300 mm ÷ De 800 mm
Sub-obiect 2.3	Reabilitare colector de canalizare	L = 3634 m, PAFSIN SN10000 De 300 mm, ovoid De 600/900 mm, De 760/1140 mm; clopot De 2100/1575 mm
Sub-obiect 2.4	Statie de pompare apa uzata SPAU1	1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 10,0 m, P = 1,65 kW, Lref = 490 m, PEID, De 110 mm
	Statie de pompare apa uzata SPAU2	3A+1R, Q = 21.0 l/s, Hp = 14,0 m, P = 9,0 kW, Lref = 1350 m, PEID, De 280 mm
Sub-obiect 2.5	Reabilitare Devensor	Dimensiuni: L= 20 m, l= 7 m, H= 5 m

PVPPA - 11.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
1.Str. Victoriei		MM-BM-C1-C-03	17.03.2025 - 15.07.2025		Construrom
1.Str. Victoriei	MM-BM-A2-C-11		23.03.2026-30.04.2026	30.04.2026-22.05.2026	Construrom
2.Str. Unirii	MM-BM-A2-C-12	MM-BM-C1-C-05	18.05.2026-19.06.2026		Construrom
3.Str. Grigore Ureche	MM-BM-A2-C-26	MM-BM-C1-C-30	17.03.2025 - 09.05.2025	09.05.2025 - 06.06.2025	Construrom
4.Str. Fructelor		MM-BM-C1-C-29	12.05.2025 - 27.06.2025		Construrom
5.Str. Colonia Topitorilor	MM-BM-A2-C-01		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
6.Str. Cerbului	MM-BM-A2-C-20 MM-BM-A2-C-21		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
7.Str. Privighetorii si Dealul Crucii	MM-BM-A2-C-25	s	17.03.2025 - 30.06.2025	30.06.2025-30.04.2026	Dimex
8.Str. Barbu Stefanescu Delavrancea	MM-BM-A2-C-23	MM-BM-C1-C-24	17.03.2025 - 24.06.2025	24.06.2025-04.02.2026	DIMEX
9.Str. Rozelor		MM-BM-C1-C-23	17.03.2025 - 15.04.2025	15.04.2025 - 27.06.2025	Dimex
PVPPA - 31.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Garii		MM-BM-C1-C-06 MM-BM-C2-C-07 MM-BM-C2-C-08 MM-BM-C2-C-11	14.07.2025-31.07.2025	31.07.2025-01.12.2025	Construrom
Str. Garii	MM-BM-A2-C-18		12.05.2025 - 22.08.2025		Construrom
Aleea Jupiter		MM-BM-C1-C-06	28.07.2025 - 05.08.2025	05.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Neptun		MM-BM-C1-C-07	21.07.2025-22.08.2025	22.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Saturn		MM-BM-C1-C-07			Construrom
Aleea Uranus		MM-BM-C1-C-07	25.07.2025-05.08.2025	05.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Amurgului		MM-BM-C1-C-08	-		Construrom
Str. Matei Basarab		MM-BM-C1-C-08			Construrom
Str. Petru Rares		MM-BM-C1-C-08	23.10.2025 - 15.12.2025		Construrom
Str. Bogdan Voda		MM-BM-C1-C-08	-		Construrom
Str. Bucovinei		MM-BM-C1-C-09	-		Construrom
2.Str. Pasunii		MM-BM-C1-C-17	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
3.Str. Rapsodiei		MM-BM-C1-C-18	07.05.2025 - 25.07.2025		Dimex
PVPPA - 30.05.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Horea		MM-BM-C1-C-26	23.06.2025-29.09.2025		Dimex
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18 MM-BM-C1-C-25	07.05.2025 - 29.08.2025	29.08.2025-01.12.2025	Dimex
Paltinislui	MM-BM-A2-C-09	MM-BM-C1-C-13	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
Forestierului (Sudului)	MM-BM-A2-C-10	MM-BM-C1-C-14			Dimex
Forestierului (Sudului)	MM-BM-A2-C-06		07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
PVPPA - 13.06.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Culturii	MM-BM-A2-C-16		28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Gheorghe Sincai			28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Vasile Lucaciu		MM-BM-C1-C-27 MM-BM-C1-C-28	-		Dimex
PVPPA - 14.08.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Hortensiei		MM-BM-C1-C-23	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
Aleea Dobrogei		MM-BM-C1-C-10	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
PVPPA - 10.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18	12.09.2025-15.11.2025		Dimex
B-dul Republicii		MM-BM-C1-C-04	12.09.2025-15.11.2025		Dimex

PVPPA - 30.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Colector canalizare - Tronson RE-LINING (Ob. 2.3)					Dimex + Construrom
PVPPA - 29.10.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Colonia Topitorilor (tronson CV-ex - CVG1)	MM-BM-A2-C-01		16.10.2025-22.12.2025	22.12.2025-31.07.2026	Dimex
PVPPA - 27.01.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Matei Basarab		MM-BM-C1-C-8	PRIMARIE		Construrom
Aleea Amurgului		MM-BM-C1-C-8	PRIMARIE		Construrom
Str. Petru Rares		MM-BM-C1-C-8	23.10.2025-15.12.2025		Construrom
Str. Garii		MM-BM-C-C1-12	16.10.2025 - 22.12.2025	22.12.2025-15.03.2026	Construrom
Str. Murelor		MM-BM-C-C1-19	18.02.2026		Construrom
Str. Codrului, str. Paltinului, str. Mesteacanului		MM-BM-C-C1-20	18.02.2026		Construrom
Str. Castanilor		MM-BM-C-C1-21	18.02.2026		Construrom
PVPPA - 04.02.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Supratraversare Rau Firiza	MM-BM-A2-C-01		-		Dimex
Str. 8 Martie	MM-BM-A2-C-02		22.04.2026-31.08.2026		Construrom
Str. Vasile Lucaciu		MM-BM-C1-C-27	PRIMARIE		Dimex
PVPPA - 25.02.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Colonia Topitorilor	MM-BM-A1-C1-01 MM-BM-A1-C1-02		PRIMARIE		Dimex
Str. Bucovinei		MM-BM-C1-C-09	23.03.2026-30.08.2026		Construrom
Str. Bogdan Voda		MM-BM-C1-C-08	23.03.2026-30.08.2026		Construrom
PVPPA - 09.03.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Privighetorii (SPAP)	MM-BM-A9-C-01		17.03.2025-09.05.2025	09.05.2025-30.04.2026	DIMEX
PVPPA - 16.04.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Bld. Independentei		MM-BM-C1-C-01 MM-BM-C1-C-02	27.04.2026-31.08.2026		Construrom
PVPPA - 19.05.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Bld. Bucuresti reabilitare retea canal		MM-BM-C1-C-22 MM-BM-C2-C-57			Construrom
Bld. Bucuresti extinderea retea transport apa	MM-BM-A2-C-27 MM-BM-A4-C-34 MM-BM-A4-C-35		18.05.2026-19.06.2026		Construrom
Str. Mihai Eminescu reabilitare retea transport apa	MM-BM-A2-C-08 MM-BM-A4-C-10				Dimex
PVPPA - 29.05.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Muncii	MM-BM-A2-C-17 MM-BM-A4-C-21				Dimex
Str. Sebesului	MM-BM-A2-C-07 MM-BM-A4-C-08				Dimex

Zone de lucru – Obiect 1

- **ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barajului – PEID De1000 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Colonia Topitorilor – PEID De800 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Paltinisului – PEID De630 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.4 – CONSTRUROM SA – Str. Victoriei – PEID De800 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.5 – CONSTRUROM SA – B-dul Bucuresti – Str. Europa – PEID De400 mm**

Zone de lucru – Obiect 2

- **ZONA DE LUCRU 2.1 – CONSTRUROM SA – B-dul Independentei**
- **ZONA DE LUCRU 2.2 – CONSTRUROM SA – Str. Paltinului**
- **ZONA DE LUCRU 2.3 – CONSTRUROM SA – Str. Bogdan Voda**
- **ZONA DE LUCRU 2.4 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Vasile Lucaciu (Centru Vechi)**
- **ZONA DE LUCRU 2.5 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barbu Stefanescu Delavrancea**
- **ZONA DE LUCRU 2.6 – CONSTRUROM SA – Str. Garii – colector PAFSIN – ovoid 600/900**

- **ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL**
– **Str. Barajului – PEID De1000 mm**





		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.1 - Reabilitare conducta de aductiune apa bruta																								
Sectiune	Conducta aductiune apa bruta (str. Barajului si str. Colonia Topitorilor), tr. CVex1-CVA22	De 1000	m	1294	167			1127	13		m		0			0	#DIV/0!		buc.	3	0			3	0
Lista Nr.	D-1.1-1																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatate	Proba presiune	CCTV	As-built
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
E-1.1-1	2	0	2	0		mp	3142	0			3142	0		mp	3142	0			3142	0				

- **ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barajului – PEID De1000 mm**

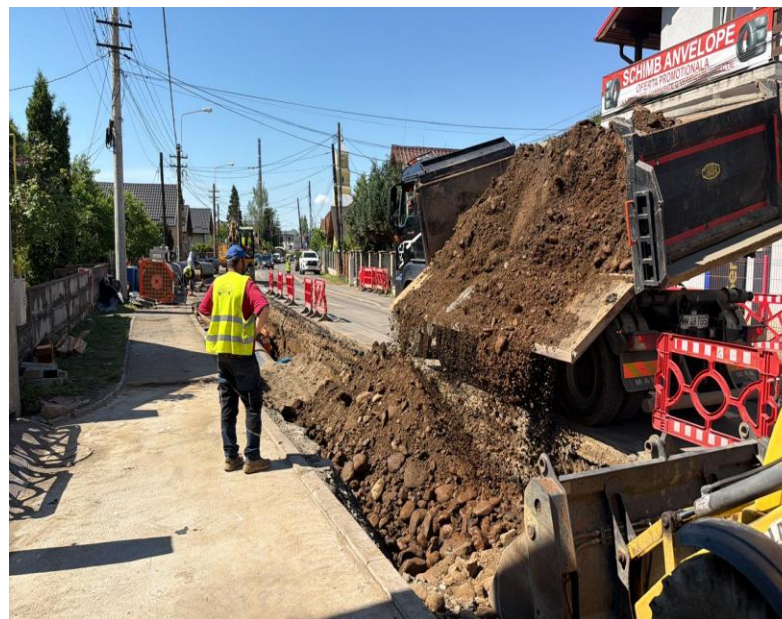

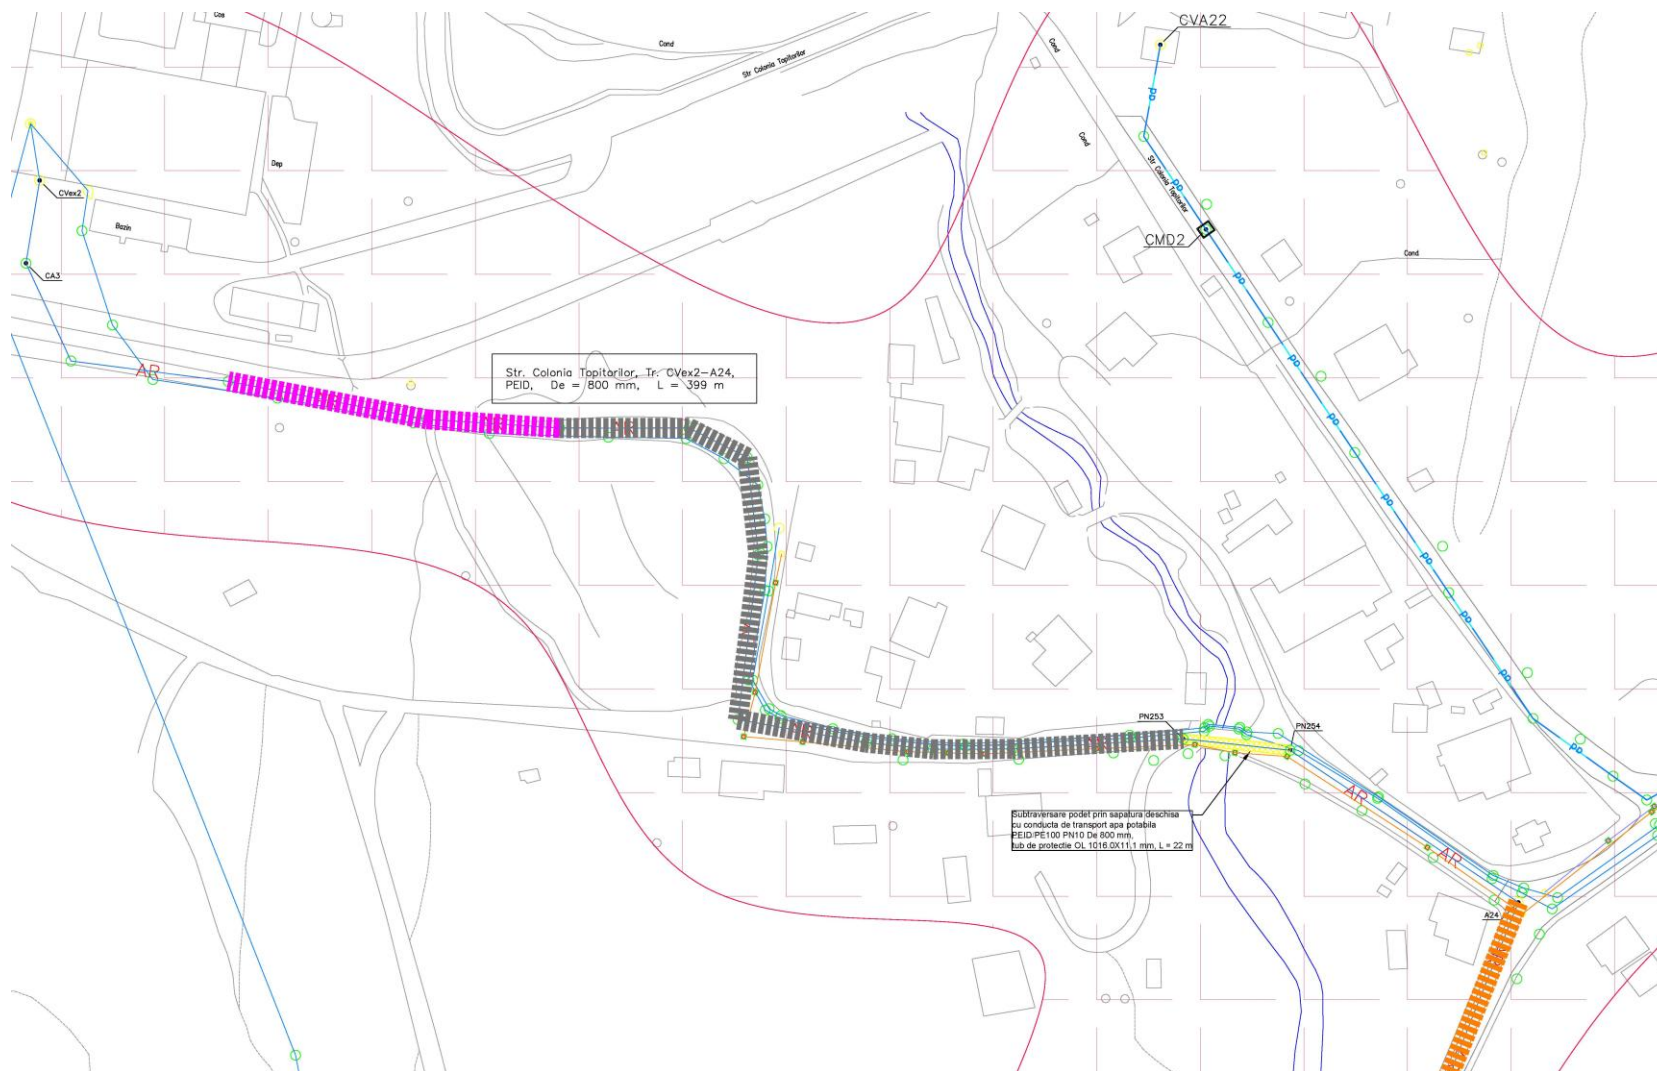

		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie												D5 - Camine de vane si camine de vizitare											
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9	De 630 De 800	m	7527	3722			3805	49		m		0			0	#DIV/0!	buc.	24	6				18	25
Lista Nr.	D-1.2-10																								

D6-2 - Hidranti de incendiu							D7 - Camine de bransament							D7-3 - Contoare debit									
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-bui		
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat						
E-1.2-1	16	2	14	13		mp	16441	0			16441	0		mp	16441	0			16441	0						





		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie												D5 - Camine de vane si camine de vizitare											
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9	De 630 De 800	m	7527	3722			3805	49		m		0			0	#DIV/0!	buc.	24	6				18	25
Lista Nr.	D-1.2-10																								

D6-2 - Hidranti de incendiu							D7 - Camine de bransament							D7-3 - Contoare debit									
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
E-1.2-1	16	2	14	13		mp	16441	0			16441	0		mp	16441	0			16441	0				






		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Str. Victoriei-Bdul Bucuresti), tr. CVA12-CVG14	De 400 De 500 De 800	m	3514	392			3122	11	De 63 De 100	m	120	0			120	0	buc.	18	3				15	17
Lista Nr.	D-1.2-7																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
DN 100	buc.	5	0			5	0		buc.	12	0			12	0	DN 25 DN 40 DN 80	buc.	15	0			15	0

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
E-1.2-1	4	0	4	0		mp	12876	0			12876	0		mp	12876	0			12876	0				



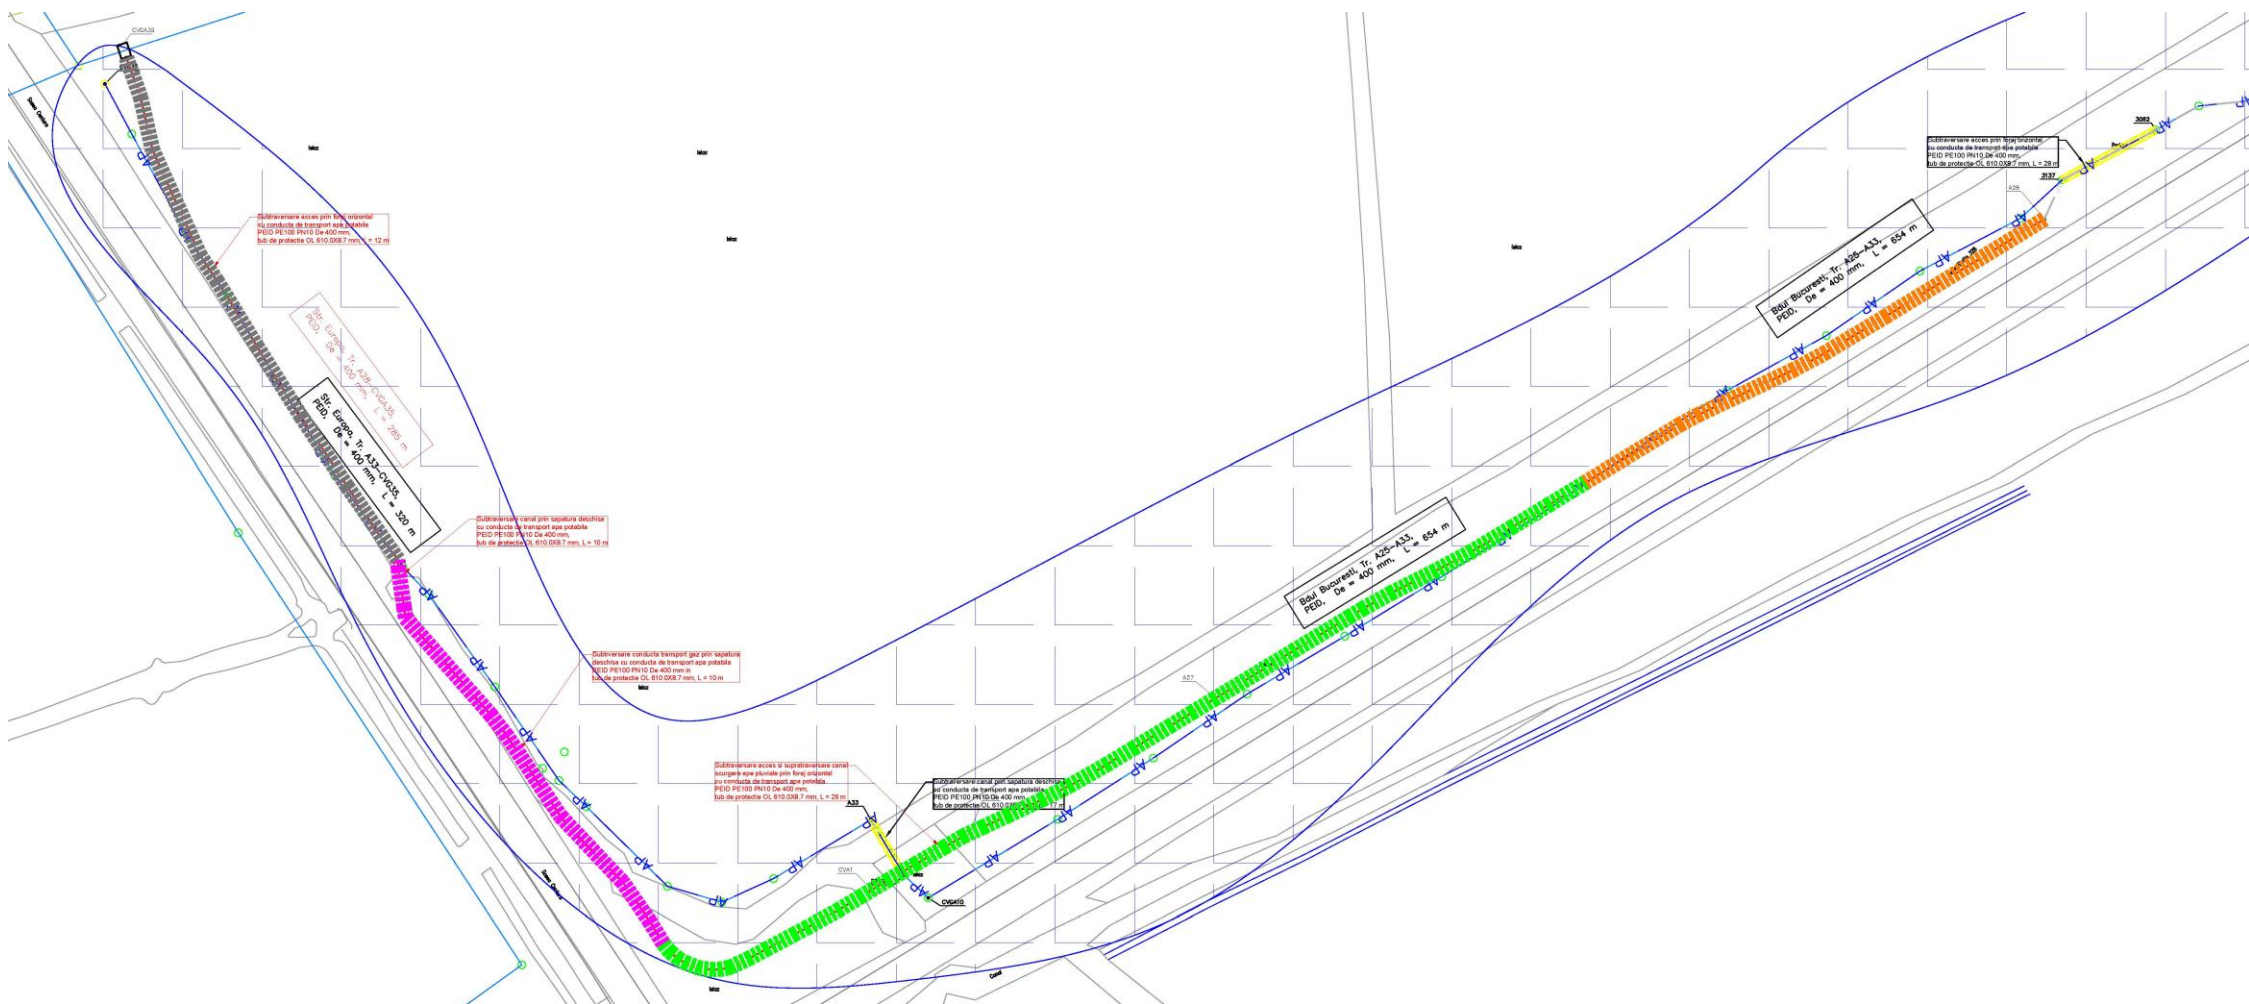

		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.4 - Extindere conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Bdul Bucuresti-Str. Europa), Tr. CVA34-CVG35	De 400	m	1549	661			888	43		m		0			0	#DIV/0!		buc.	4	3			1	75
Lista Nr.	D-1.4-1																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!

Traversari					D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-bu		
Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat	Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat						
E-1.4-01	3	0	3	0		mp	1580	0			1580	0		mp	1580	0			1580	0						



- **ZONA DE LUCRU 2.1 – CONSTRUROM SA – B-dul Independentei**




		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.1 - Extindere retea de canalizare																								
Sectiune	Bdul Independentei, Tr. CM1059-CMex1, Tr. CM21-CM29, Tr. CM47-CM1059, Tr. CM29-CMex1, Tr. CM28-SPAU2	De 500	m	12	0			12	0	De 250	m	2089	491			1598	24	De 200	m	230	0			230	0
Lista Nr.	D-2.1-1																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.	51	15			36	29	DN 800	buc.	23	0			23	0	E-2.1-1	7	5	2	71

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	3103	0			3103	0		mp	3103	0			3103	0				



- **ZONA DE LUCRU 2.2 – CONSTRUROM SA – Str. Paltinului**

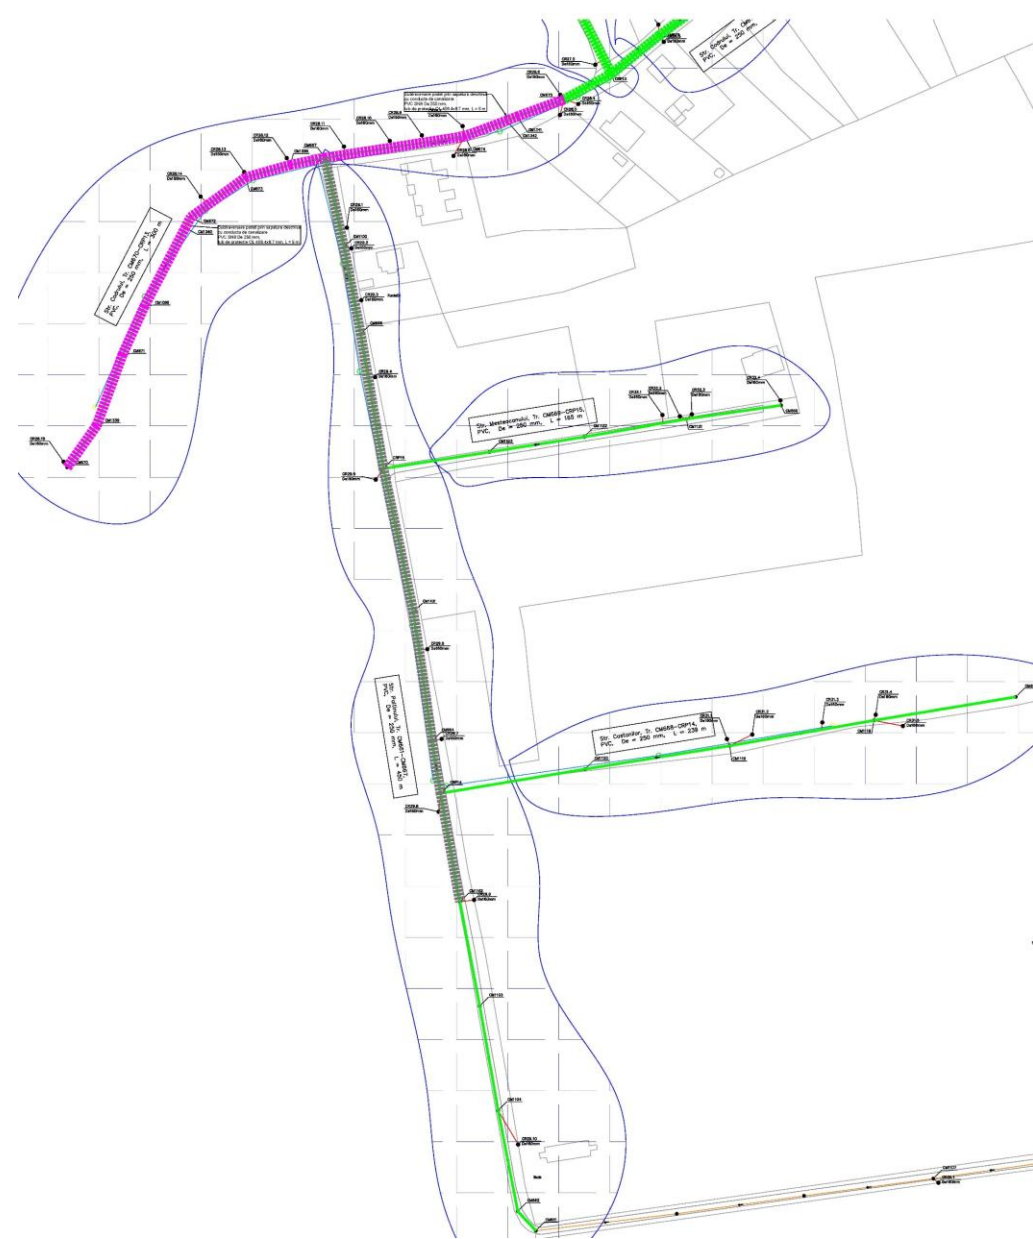

		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.1 - Extindere retea de canalizare																								
Sectiune	Str. Paltinului, Tr. CM661-CM667																								
Lista Nr.	D-2.1-10																								
	m			0				0	#DIV/0!	De 250	m	450	310			140	69	De 160	m	100	0			100	0

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	11	9			2	82	D 315	buc.	10	0			10	0			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	773	0			773	0		mp	773	0			773	0				



- **ZONA DE LUCRU 2.3 – CONSTRUOM SA – Str. Bogdan Voda**




		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Str. Bogdan Voda, Tr. CM237-CM234, Tr. CM273-CM271, Tr. CM233-CMex45, Tr. CM239-CMex46, Tr. CM255-CMex31, Tr. CM260-CMex32, Tr. CM263-CMex33, Tr. CM267-CMex34, Tr. CM301-CMex35		m		0			0	#DIV/0!	De 250 De 315	m	939	573			366	61	De 200	m	380	58			322	15
Lista Nr.	D-2.2-11																								

D5 - Camine de vane si camine de vizitare							D8 - Camine de racord							Traversari						
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	48	26			22	54	DN 1000	buc.	26	23			3	88			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	430	0			430	0		mp	430	0			430	0				



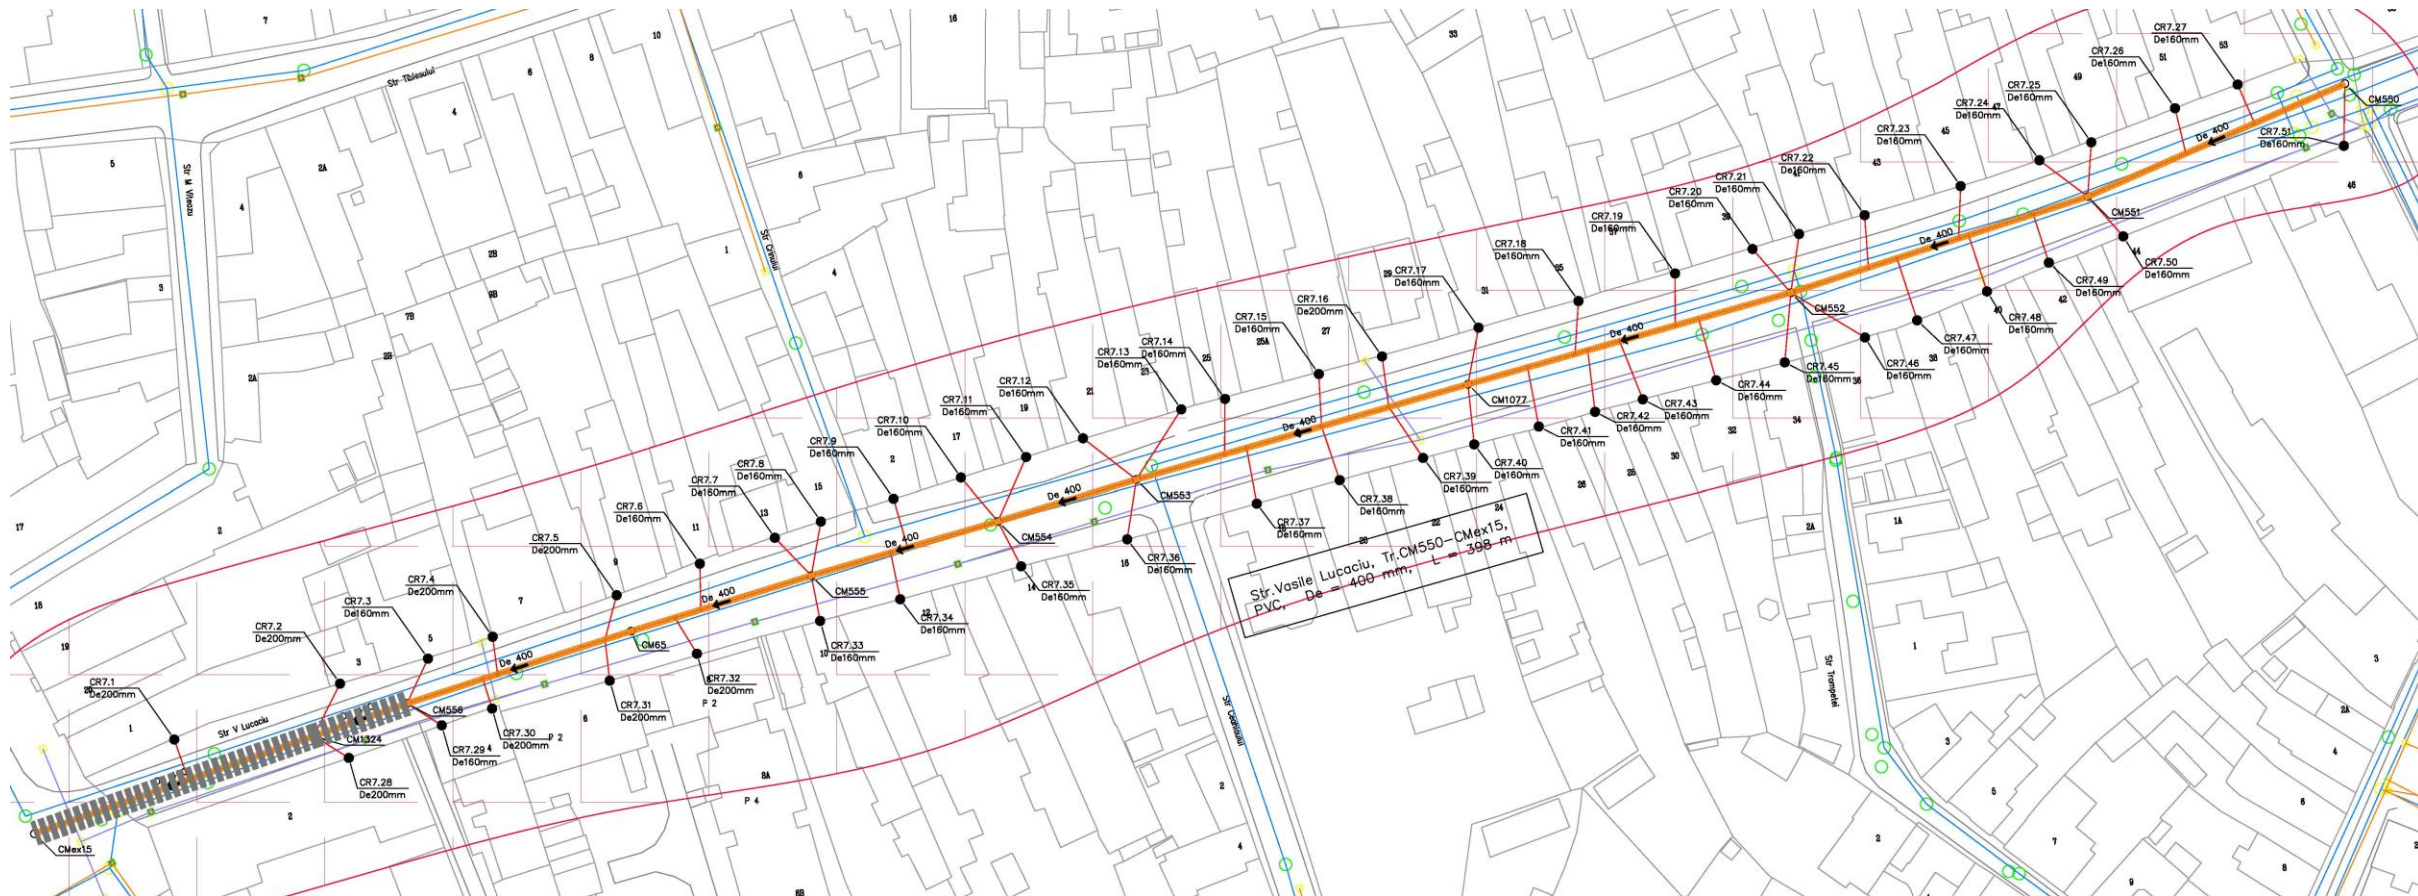

		D2 - Colectoare de canalizare																								
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																									
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																									
Sectiune	Str. Vasile Lucaciu, Tr. CM134-CM143, Tr. CM147-CM703, Tr. CM686-CMex3, Tr.CM550-CMex15		DN 600	m	595	66			529	11	De 200 De 400	m	518	0			518	0	De 160 De 200	m	600	0			600	0
Lista Nr.	D-2.2-24																									

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.	29	2			27	7	D 315 DN 800	buc.	60	0			60	0	E-2.2-1	5	0	5	0


D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	2898	0			2898	0		mp	2898	0			2898	0				



		D2 - Colectoare de canalizare															
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																
Sectiune	Str. Barbu Delavrancea, Tr. CM1000-CM1002, Tr. CM1005-CM493, Tr. CM1007-CM493, Tr. CM1012-CM493, Tr. CM1015-CM504, Tr. CM1018-CM504, Tr. CM1021-CM489, Tr. CM1023-CM489, Tr. CM1026-CM486, Tr. CM1037-CM490, Tr. CM484-CMex18, Tr. CM505-CM489, Tr. CM506-CM496, Tr. CM515-CM510, Tr. CM517-CM494, Tr. CM520-CM494, Tr. CM754-CM494, Tr. CM758-CM494, Tr. CM978-CM980, Tr. CM982-CM497, Tr. CM986-CM497, Tr. CM990-CM514, Tr. CM994-CM496, Tr. CM997-CM995, Tr. CM999-CM496		m		0			0	#DIV/0!	De 200 De 315	m	1438	555			883	39
Lista Nr.	D-2.2-7																

D5 - Camine de vane si camine de vizitare							D8 - Camine de racord							Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat
DN 1000	buc.	107	32			75	30	DN 1000	buc.	17	5			12	29		0	0
																		#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier							D12 - Refacerea sistemului rutier										
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat		
	mp	1230	0			1230	0		mp	1230	0			1230	0		

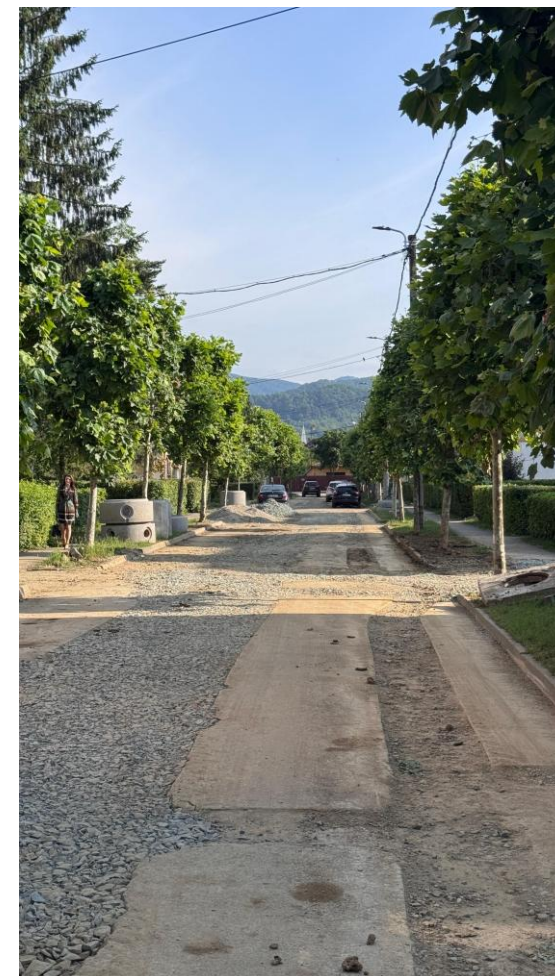



		D2 - Colectoare de canalizare							D5 - Camine de vane si camine de vizitare							Traversari						
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																					
Sub-Obiect	2.3 - Reabilitare colector de canalizare																					
Sectiune	Colector canalizare (Str. Paltinisului - Str. Garii), Tr. CM628-CMex23	DN 800	m	699	699			0	100		buc.	50	40			10	80	E-2.3-1	1	1	0	100
		De 600/900		1617	994			623	61								3		1	2	33.3	
		De 760/1140		818				818	0											0	#DIV/0!	
		De 2100/1575		380				380	0											0	#DIV/0!	
		Lista Nr.		D-2.3-1		3514	1693	0	0	1821	48										4	2

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba etanseitate	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	6715	0			6715	0		mp	6715	0			6715	0				



PROGRES GENERAL – MM-CL-06

DIMEX																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT	1294	9002	3536	1630	15462	74	151	41		PROIECT	2213	9123	2840	14176	593	226
EXECUTAT	167	5072	1470	60	6769	15	2	9		EXECUTAT	1331	6032	208	7571	390	78
PROCENT	12.91	56.3	41.6	3.7	43.8	20.3	1.3	22.0		PROCENT	60.1	66.1	7.3	53.4	65.8	34.5
CONSTRUROM																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT		5694	1520	950	8164	43	87	21		PROIECT	2588	9649	3200	15437	468	266
EXECUTAT		392	1480	369	2241	11	42	8		EXECUTAT	1709	6027	1097	8833	292	169
PROCENT		6.9	97.4	38.8	27.4	25.6	48.3	38.1		PROCENT	66.0	62.5	34.3	57.2	62.4	63.5
TOTAL																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT	1294	14696	5056	2580	23626	117	238	62		PROIECT	4801	18772	6040	29613	1061	492
EXECUTAT	167	5464	2950	429	9010	26	44	17		EXECUTAT	3040	12059	1305	16404	682	247
PROCENT	12.91	37.2	58.3	16.6	38.1	22.2	18.5	27.4		PROCENT	63.3	64.2	21.6	55.4	64.3	50.2

PROGRES GENERAL PE OBIECTE – MM-CL-06

Obiect	1	Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	m	1294	167	-	167	12.91
Sub-Obiect	1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	m	13147	5072	392	5464	41.56
Sub-Obiect	1.3	Reabilitarea retelei de distributie apa potabila	m	4883	1470	650	2120	43.42
Sub-Obiect	1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	m	1549	-	661	661	42.67
Sub-Obiect	1.5	Extinderea retelei de distributie apa potabila	m	173	-	169	169	97.69
Sub-Obiect	1.6	Statie de pompare apa potabila	buc.	1	0	-	0	0.00
Obiect	2	Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	2.1	Extindere retea de canalizare	m	5393	362	2198	2560	47.47
Sub-Obiect	2.2	Reabilitare retea de canalizare	m	15864	6302	4544	10846	68.37
Sub-Obiect	2.3	Reabilitare colector de canalizare	m	3514	-		1693	48.18
Sub-Obiect	2.4	Statii de pompare apa uzata si conducta de refulare						
		<i>Statii de pompare apa uzata</i>	buc.	2	0	0	0	0.00
		<i>Conducte de refulare</i>	m	1649	0	0	0	0.00
Sub-Obiect	2.5	Reabilitare deversor, B-dul Bucuresti	buc.	1	-	0	0	0.00

ZONE INCEPERE LUCRARI IUNIE-IULIE 2026:

- 1. Str. Sebesului – reabilitare retea de transport – PIED De800 mm**
- 2. Str. Corbului – reabilitare retea de transport – PIED De800 mm**
- 3. B-dul. Bucuresti – reabilitare retea de canalizare**
- 4. B-dul. Unirii – reabilitare retea de transport si reabilitare retea canalizare**
- 5. Str. Bucovinei – extindere retea canalizare**
- 6. Str. Mesteacanului - extindere retea canalizare**
- 7. Str. Castanilor - extindere retea canalizare**
