

**“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
in judetul Maramures”**

CONTRACT DE LUCRARI - MM-CL-06

“RETELE DE APA SI APA UZATA BAIA MARE”

Beneficiar: **VITAL S.A**

Antreprenor: **Asocierea DIMEX-2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL**

Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L



RETELE DE APA SI APA UZATA BAI A MARE – MM-CL-06

Operator economic,

DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL

Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	L = 1324 m, PEID PE100 PN10; De 1000 mm
Sub-obiect 1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	L = 13926 m, PEID PE100 PN10; De 315 mm ÷ 800 mm
Sub-obiect 1.3	Reabilitare retelei de distributie apa potabila	L = 4994 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm ÷ 400 mm
Sub-obiect 1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 1644 m, PEID PE100 PN10; De 400 mm
Sub-obiect 1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila	L = 173 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.6	Statie de pompare apa potabila	Grup pompare (2A+1R), Qgr = 10 l/s, Hp=30 m, P= 9,0 kW; Dimensiuni constructie: 5,5 x 2,4 x 2,7 m
OBIECT 2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN MUNICIPIUL BAI A MARE		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea de canalizare	L = 5531 m, PVC SN8; De 250 mm; PAFSIN SN10000 De 500 mm
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea de canalizare	L = 16995 m, PVC SN8; De 250 mm ÷ De 400 mm; PAFSIN SN10000 De 300 mm ÷ De 800 mm
Sub-obiect 2.3	Reabilitare colector de canalizare	L = 3634 m, PAFSIN SN10000 De 300 mm, ovoid De 600/900 mm, De 760/1140 mm; clopot De 2100/1575 mm
Sub-obiect 2.4	Statie de pompare apa uzata SPAU1	1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 10,0 m, P = 1,65 kW, Lref = 490 m, PEID, De 110 mm
	Statie de pompare apa uzata SPAU2	3A+1R, Q = 21.0 l/s, Hp = 14,0 m, P = 9,0 kW, Lref = 1350 m, PEID, De 280 mm
Sub-obiect 2.5	Reabilitare Deversor	Dimensiuni: L= 20 m, l= 7 m, H= 5 m

PVPPA - 11.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
1.Str. Victoriei	MM-BM-A2-C-11	MM-BM-C1-C-03	17.03.2025 - 15.07.2025		Construrom
2.Str. Unirii	MM-BM-A2-C-12	MM-BM-C1-C-05			Construrom
3.Str. Grigore Ureche	MM-BM-A2-C-26	MM-BM-C1-C-30	17.03.2025 - 09.05.2025	09.05.2025 - 06.06.2025	Construrom
4.Str. Fructelor		MM-BM-C1-C-29	12.05.2025 - 27.06.2025		Construrom
5.Str. Colonia Topitorilor	MM-BM-A2-C-01		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
6.Str. Cerbului	MM-BM-A2-C-20 MM-BM-A2-C-21		17.03.2025 - 30.06.2025		Dimex
7.Str. Privighetorii si Dealul Crucii	MM-BM-A2-C-25	MM-BM-C1-C25	17.03.2025 - 30.06.2025	30.06.2025-30.04.2026	Dimex
8.Str. Barbu Stefanescu Delavrancea	MM-BM-A2-C-23	MM-BM-C1-C-24	17.03.2025 - 24.06.2025	24.06.2025-04.02.2026	DIMEX
9.Str. Rozelor		MM-BM-C1-C-23	17.03.2025 - 15.04.2025	15.04.2025 - 27.06.2025	Dimex
PVPPA - 31.03.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Garii		MM-BM-C1-C-06 MM-BM-C2-C-07 MM-BM-C2-C-08 MM-BM-C2-C-11	14.07.2025-31.07.2025	31.07.2025-01.12.2025	Construrom
Str. Garii	MM-BM-A2-C-18		12.05.2025 - 22.08.2025		Construrom
Aleea Jupiter		MM-BM-C1-C-06	28.07.2025 - 05.08.2025	05.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Neptun		MM-BM-C1-C-07	21.07.2025-22.08.2025	22.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Saturn		MM-BM-C1-C-07			Construrom
Aleea Uranus		MM-BM-C1-C-07	25.07.2025-05.08.2025	05.08.2025-01.12.2025	Construrom
Aleea Amurgului		MM-BM-C1-C-08	-		Construrom
Str. Matei Basarab		MM-BM-C1-C-08	-		Construrom
Str. Petru Rares		MM-BM-C1-C-08	23.10.2025 - 15.12.2025		Construrom
Str. Bogdan Voda		MM-BM-C1-C-08	-		Construrom
Str. Bucovinei		MM-BM-C1-C-09	-		Construrom
2.Str. Pasunii		MM-BM-C1-C-17	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
3.Str. Rapsodiei		MM-BM-C1-C-18	07.05.2025 - 25.07.2025		Dimex
PVPPA - 30.05.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Horea		MM-BM-C1-C-26	23.06.2025-29.09.2025		Dimex
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18 MM-BM-C1-C-25	07.05.2025 - 29.08.2025	29.08.2025-01.12.2025	Dimex
Paltinisului	MM-BM-A2-C-09 MM-BM-A2-C-10	MM-BM-C1-C-13 MM-BM-C1-C-14	07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex
Forestierului (Sudului)	MM-BM-A2-C-06		07.05.2025 - 22.08.2025		Dimex

PVPPA - 13.06.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Culturii	MM-BM-A2-C-16		28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Gheorghe Sincai			28.07.2025-24.10.2025		Dimex
Vasile Lucaci		MM-BM-C1-C-27 MM-BM-C1-C-28	-		Dimex
PVPPA - 14.08.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Hortensiei		MM-BM-C1-C-23	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
Aleea Dobrogei		MM-BM-C1-C-10	14.08.2025-21.11.2025		Dimex
PVPPA - 10.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Vasile Alecsandri		MM-BM-C1-C-18	12.09.2025-15.11.2025		Dimex
B-dul Republicii		MM-BM-C1-C-04	12.09.2025-15.11.2025		Dimex
PVPPA - 30.09.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Colector canalizare - Tronson RE-LINING (Ob. 2.3)					Dimex + Construrom
PVPPA - 29.10.2025	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Colonia Topitorilor (tronson CV-ex - CVG1)	MM-BM-A2-C-01		16.10.2025-22.12.2025	22.12.2025-31.07.2026	Dimex
PVPPA - 27.01.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Matei Basarab		MM-BM-C1-C-8	PRIMARIE		Construrom
Aleea Amurgului		MM-BM-C1-C-8	PRIMARIE		Construrom
Str. Petru Rares		MM-BM-C1-C-8	23.10.2025-15.12.2025		Construrom
Str. Garii		MM-BM-C1-C-12	16.10.2025 - 22.12.2025	22.12.2025-15.03.2026	Construrom
Str. Murelor		MM-BM-C1-C-19	18.02.2026		Construrom
Str. Codrului, str. Paltinului, str. Mesteacanului		MM-BM-C1-C-20	18.02.2026		Construrom
Str. Castanilor		MM-BM-C1-C-21	18.02.2026		Construrom
PVPPA - 04.02.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Supratraversare Rau Firiza	MM-BM-A2-C-01		-		Dimex
Str. 8 Martie	MM-BM-A2-C-02		22.04.2026-31.08.2026		Construrom
Str. Vasile Lucaci		MM-BM-C1-C-27	PRIMARIE		Dimex
PVPPA - 25.02.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Colonia Topitorilor	MM-BM-A1-C1-01 MM-BM-A1-C1-02		PRIMARIE		Dimex
Str. Bucovinei		MM-BM-C1-C-09	23.03.2026-30.08.2026		Construrom
Str. Bogdan Voda		MM-BM-C1-C-08	23.03.2026-30.08.2026		Construrom
PVPPA - 09.03.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Str. Privighetorii (SPAP)	MM-BM-A9-C-01		17.03.2025-09.05.2025	09.05.2025-30.04.2026	DIMEX
PVPPA - 16.04.2026	planse APA	plansa CANAL	Autorizatie spargere	Prelungire	Prestator
Bld. Independentei		MM-BM-C1-C-01 MM-BM-C1-C-02	27.04.2026-31.08.2026		Construrom

Zone de lucru – Obiect 1

- **ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barajului – PEID De1000 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Colonia Topitorilor – PEID De800 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. 8 Martie – PEID De800 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.4 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Paltinisului – PEID De630 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.5 – CONSTRUROM SA – Str. Victoriei – PEID De800 mm**
- **ZONA DE LUCRU 1.6 – CONSTRUROM SA – B-dul Bucuresti – Str. Europa – PEID De400 mm**

Zone de lucru – Obiect 2

- **ZONA DE LUCRU 2.1 – CONSTRUROM SA – Strada Codrului**
- **ZONA DE LUCRU 2.2 – CONSTRUROM SA – Str. Bogdan Voda**
- **ZONA DE LUCRU 2.3 – CONSTRUROM SA – Str. Petru Rares**
- **ZONA DE LUCRU 2.4 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barbu Stefanescu Delavrancea**
- **ZONA DE LUCRU 2.5 – CONSTRUROM SA – Str. Garii – colector PAFSIN – ovoid 600/900**

- **ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL**
- **Str. Barajului – PEID De1000 mm**



		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.1 - Reabilitare conducta de aductiune apa bruta																								
Sectiune	Conducta aductiune apa bruta (str. Barajului si str. Colonia Topitorilor), tr. CVex1-CVA22	De 1000	m	1294	115			1179	9		m		0			0	#DIV/0!		buc.	3	0			3	0
Lista Nr.	D-1.1-1																								


D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit								Traversari				
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!	E-1.1-1	2	0	2	0

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatate	Proba presiune	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	3142	0			3142	0		mp	3142	0			3142	0				

- **ZONA DE LUCRU 1.1 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Baraiului – PEID De1000 mm**



- **ZONA DE LUCRU 1.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Colonia Topitorilor– PEID De800 mm**

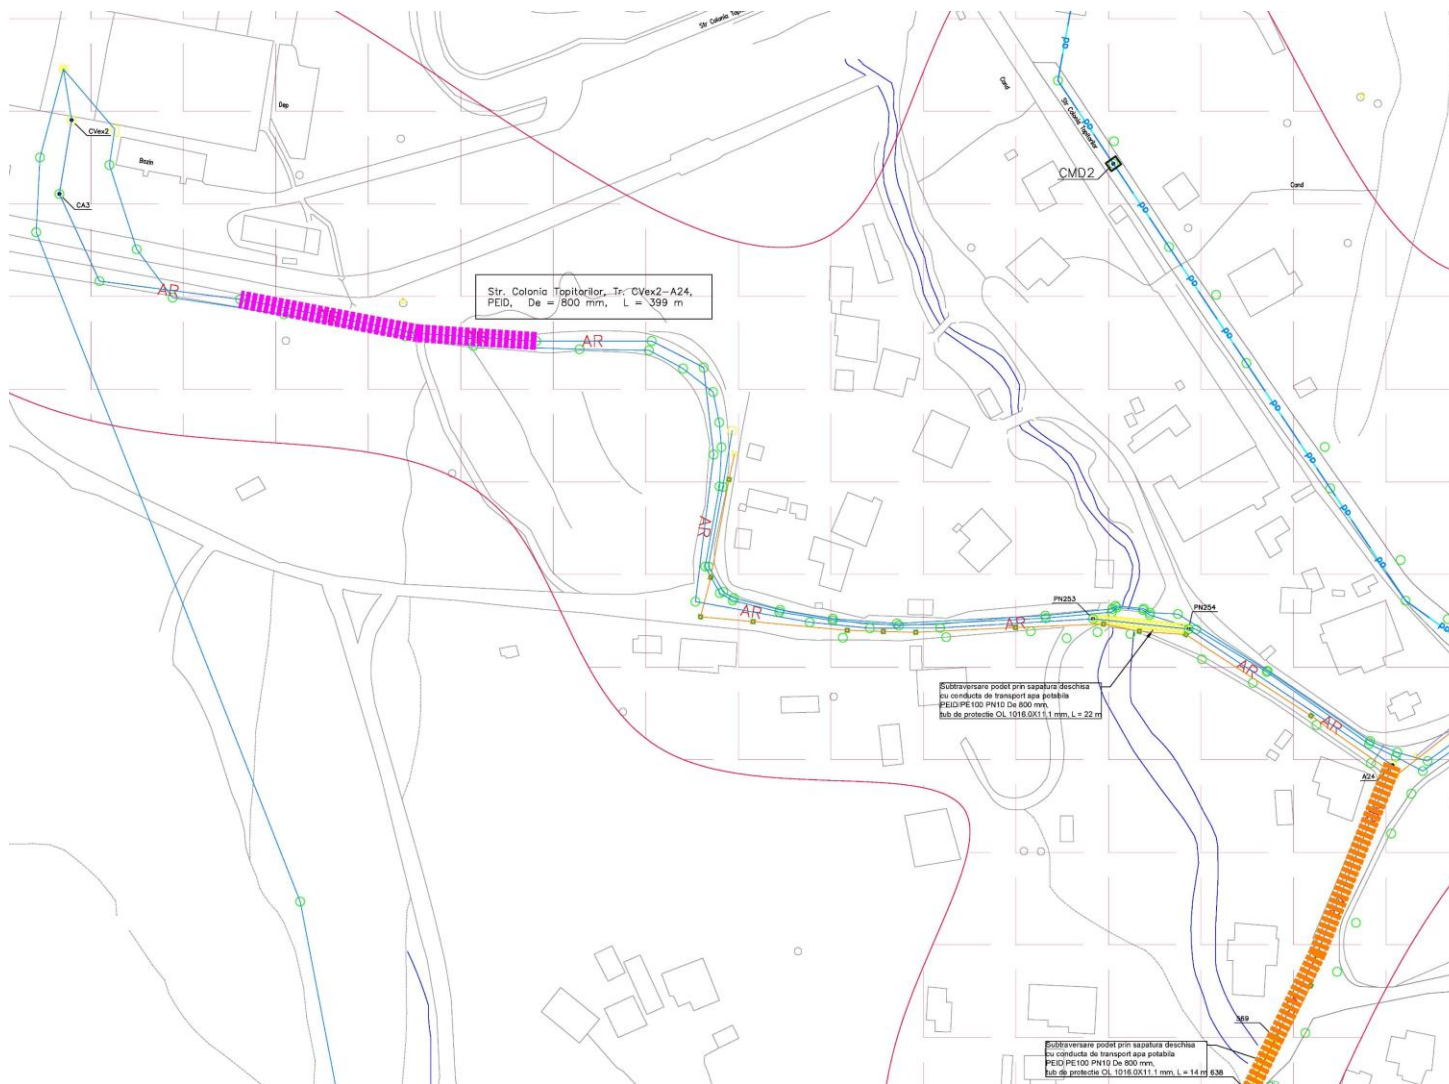

		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie												D5 - Camine de vane si camine de vizitare											
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9	De 630 De 800	m	7527	3211			4316	43		m		0			0	#DIV/0!	buc.	24	6				18	25
Lista Nr.	D-1.2-10																								


D6-2 - Hidranti de incendiu							D7 - Camine de bransament							D7-3 - Contoare debit							Traversari							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!	E-1.2-1	16	2	14	13

D10 - Desfacerea sistemului rutier							D12 - Refacerea sistemului rutier							Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS				
	mp	16441	0			16441	0		mp	16441	0			16441	0		

- **ZONA DE LUCRU 1.2 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Colonia Topitorilor– PEID De800 mm**



- **ZONA DE LUCRU 1.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. 8 Martie – PEID De800 mm**

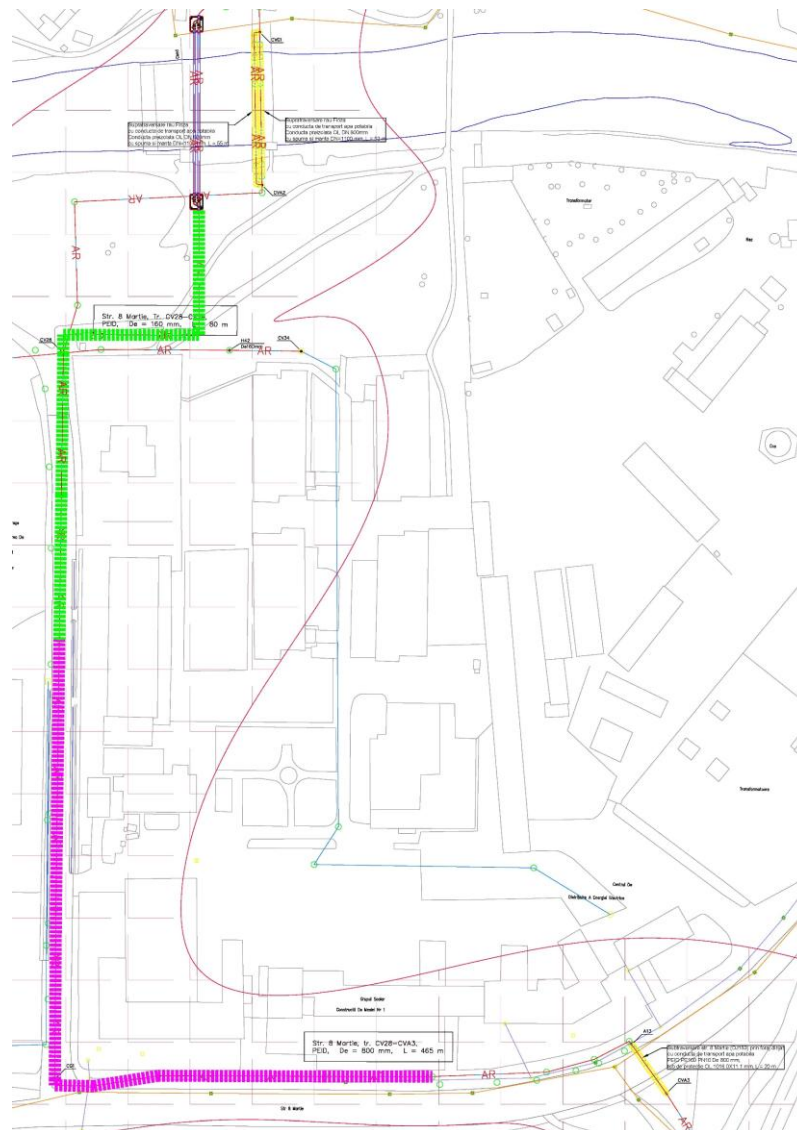

RETELE DE APA SI APA UZATA BAI A MARE – MM-CL-06

Operator economic,

DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL


Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L


		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie												D5 - Camine de vane si camine de vizitare											
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9	De 630 De 800	m	7527	3211			4316	43		m		0			0	#DIV/0!	buc.	24	6				18	25
Lista Nr.	D-1.2-10																								

D6-2 - Hidranti de incendiu							D7 - Camine de bransament							D7-3 - Contoare debit							Traversari							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!	E-1.2-1	16	2	14	13

D10 - Desfacerea sistemului rutier							D12 - Refacerea sistemului rutier							Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS				
	mp	16441	0			16441	0		mp	16441	0			16441	0		

- **ZONA DE LUCRU 1.3 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. 8 Martie – PEID De800 mm**

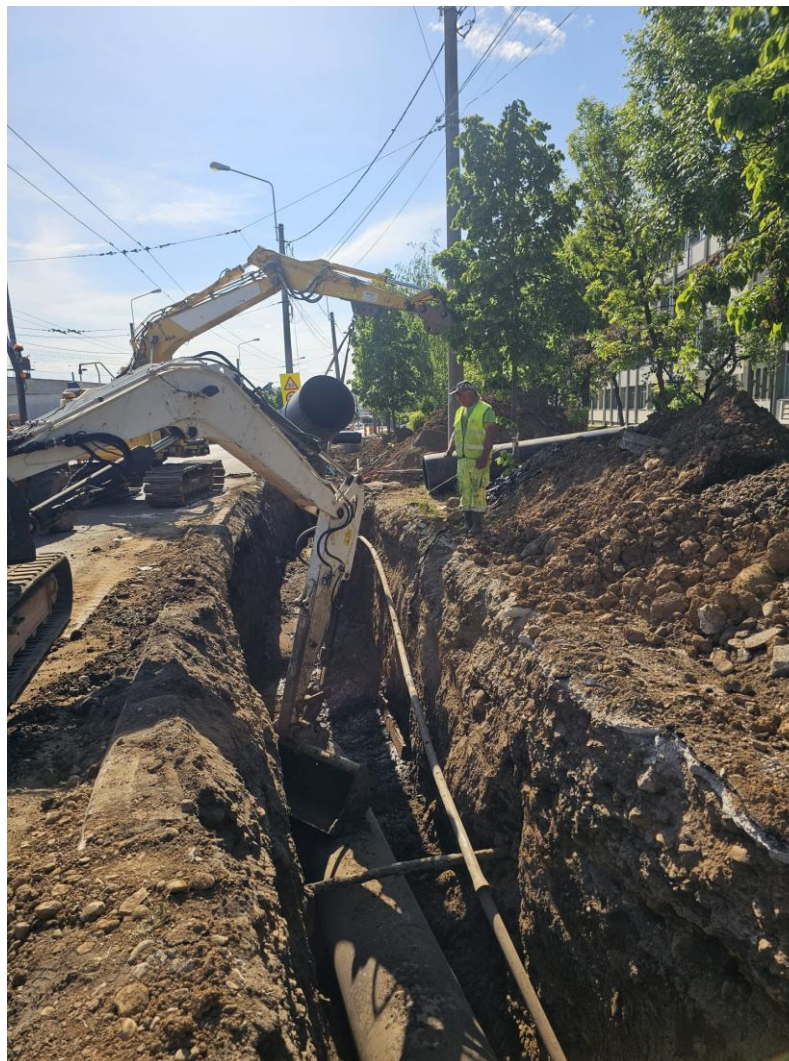

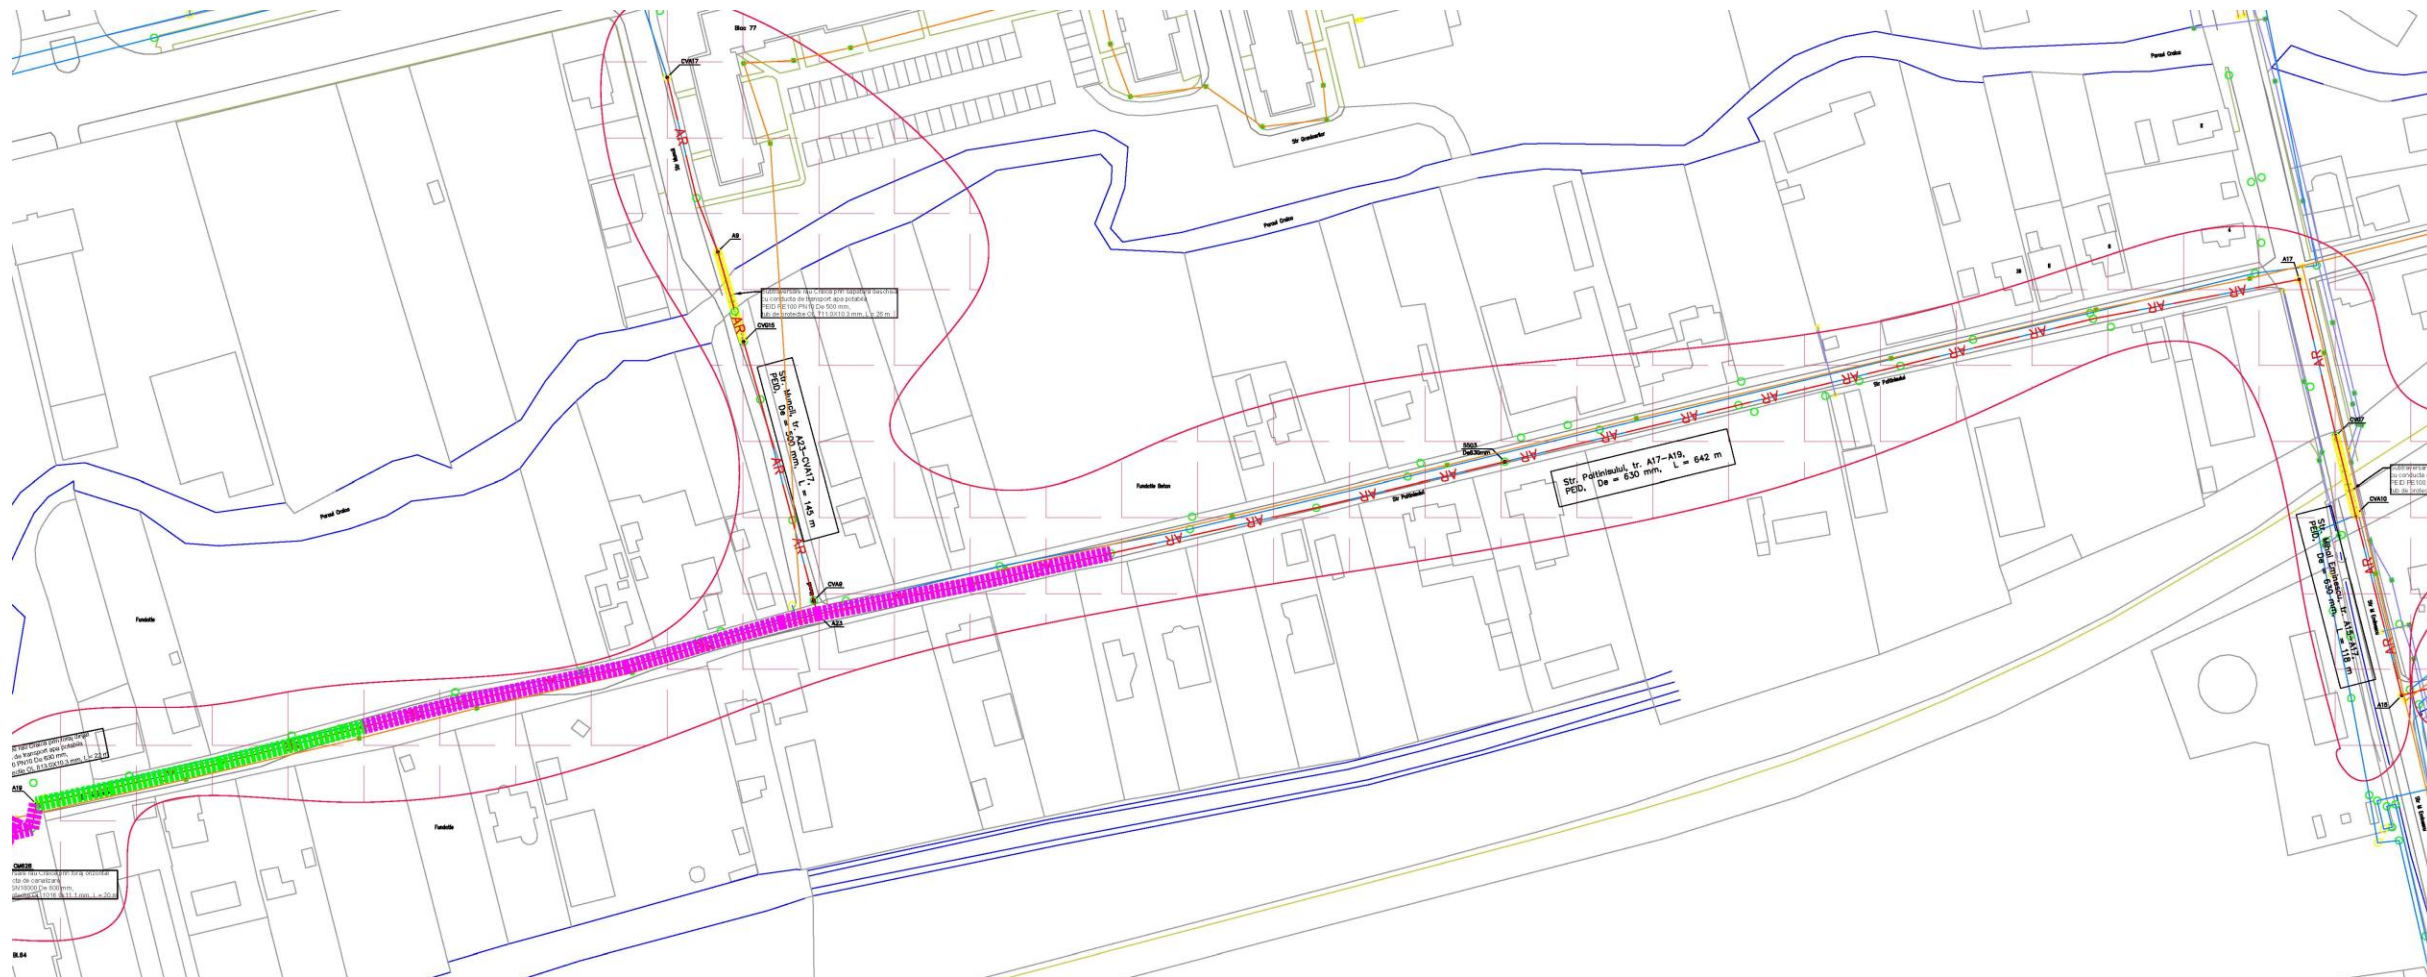

		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Uzina de apa - Str. Paltinisului), tr. CVex2-CVG9	De 630 De 800	m	7527	3211			4316	43		m		0			0	#DIV/0!	buc.	24	6				18	25
Lista Nr.	D-1.2-10																								


D6-2 - Hidranti de incendiu							D7 - Camine de bransament							D7-3 - Contoare debit							Traversari							
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!	E-1.2-1	16	2	14	13

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	16441	0			16441	0		mp	16441	0			16441	0				

- **ZONA DE LUCRU 1.4 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Paltinisului – PEID De630 mm**



- **ZONA DE LUCRU 1.5 – CONSTRUROM SA – Str. Victoriei – PEID De800 mm**

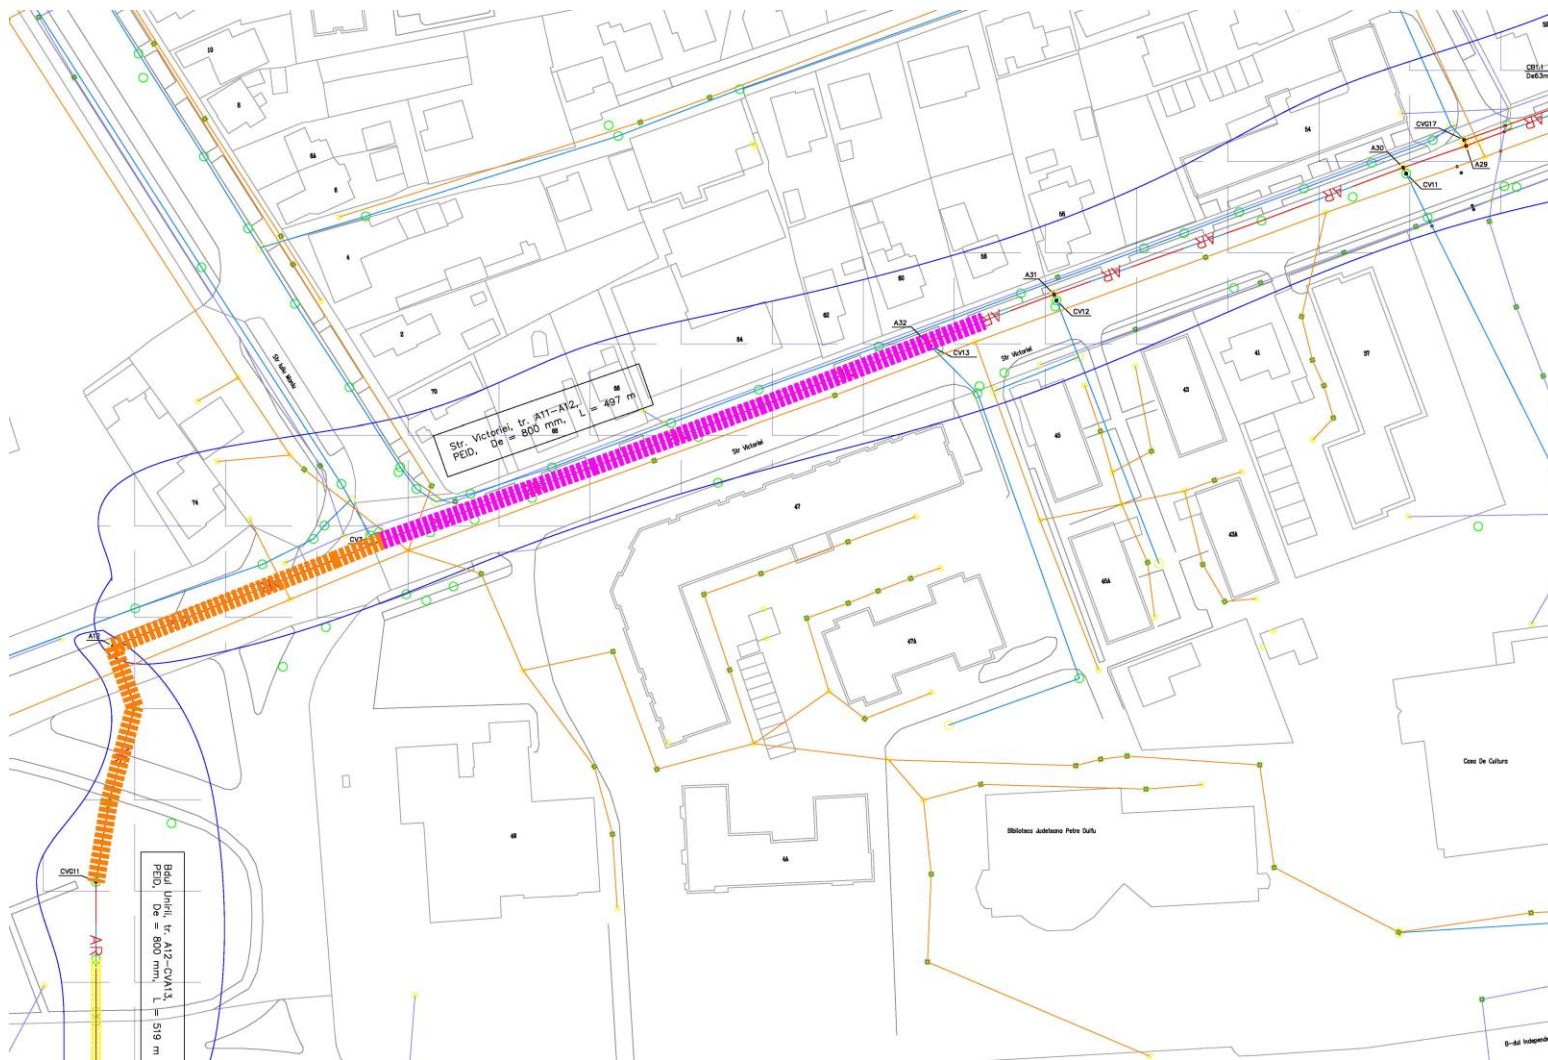


		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.2 - Reabilitare conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Str. Victoriei-Bdul Bucuresti), tr. CVA12-CVG14	De 400 De 500 De 800	m	3514	252			3262	7	De 63 De 100	m	120	0			120	0		buc.	18	2			16	11
Lista Nr.	D-1.2-7																								

D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit								Traversari				
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 100	buc.	5	0			5	0		buc.	12	0			12	0	DN 25 DN 40 DN 80	buc.	15	0			15	0	E-1.2-1	4	0	4	0

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	12876	0			12876	0		mp	12876	0			12876	0				

- ZONA DE LUCRU 1.5 – CONSTRUROM SA – Str. Victoriei – PEID De800 mm



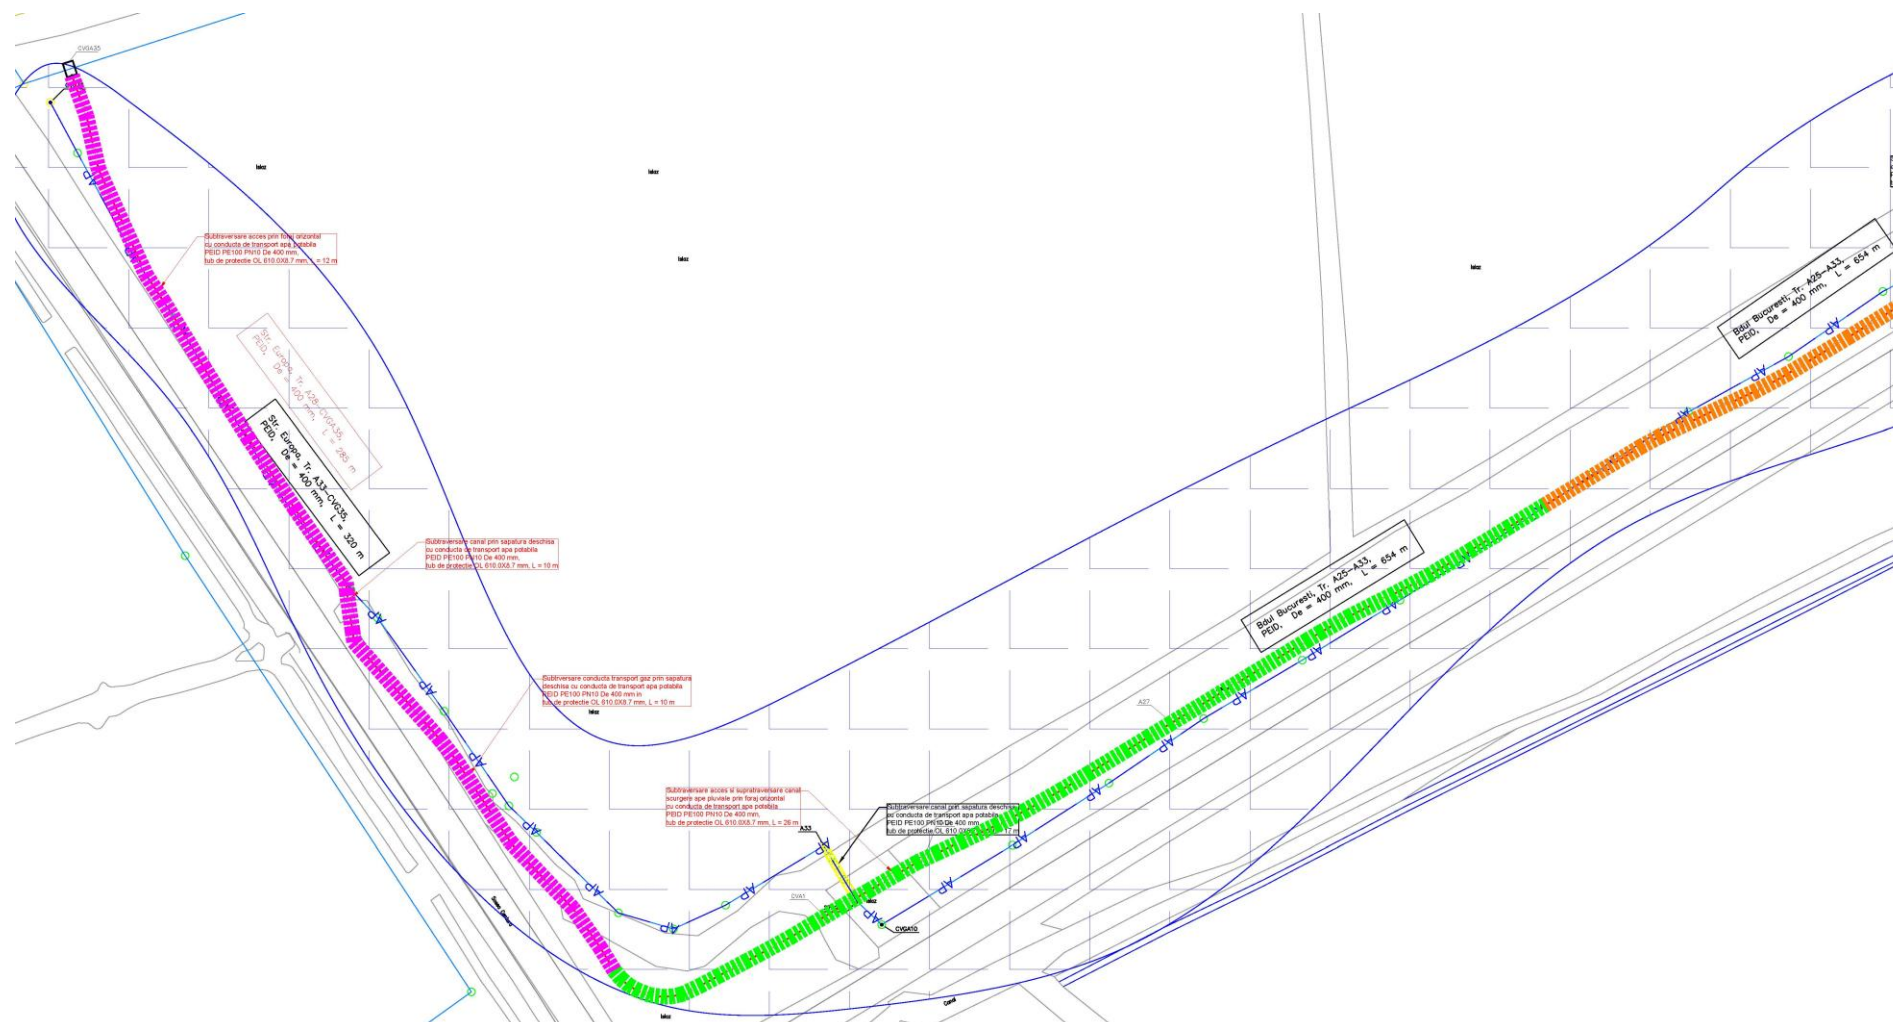

		D1 - Conducte de transport apa / Retele de distributie														D5 - Camine de vane si camine de vizitare									
		Conducte din tuburi PEID PE100 PN10 SDR17	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vane	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Obiect	1 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare																								
Sub-Obiect	1.4 - Extindere conducte de transport apa potabila																								
Sectiune	Conducta transport apa potabila (Bdul Bucuresti-Str. Europa), Tr. CVA34-CVG35	De 400	m	1549	505			1044	33		m		0			0	#DIV/0!		buc.	4	2			2	50
Lista Nr.	D-1.4-1																								


D6-2 - Hidranti de incendiu								D7 - Camine de bransament								D7-3 - Contoare debit								Traversari				
DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de bransament	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	DN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
	buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!		buc.		0			0	#DIV/0!	E-1.4-01	3	0	3	0

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba presiune	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	1580	0			1580	0		mp	1580	0			1580	0				

- **ZONA DE LUCRU 1.6 – CONSTRUROM SA – B-dul Bucuresti – Str. Europa – PEID De400 mm**



- **ZONA DE LUCRU 2.1 – CONSTRUROM SA – Str. Codrului**

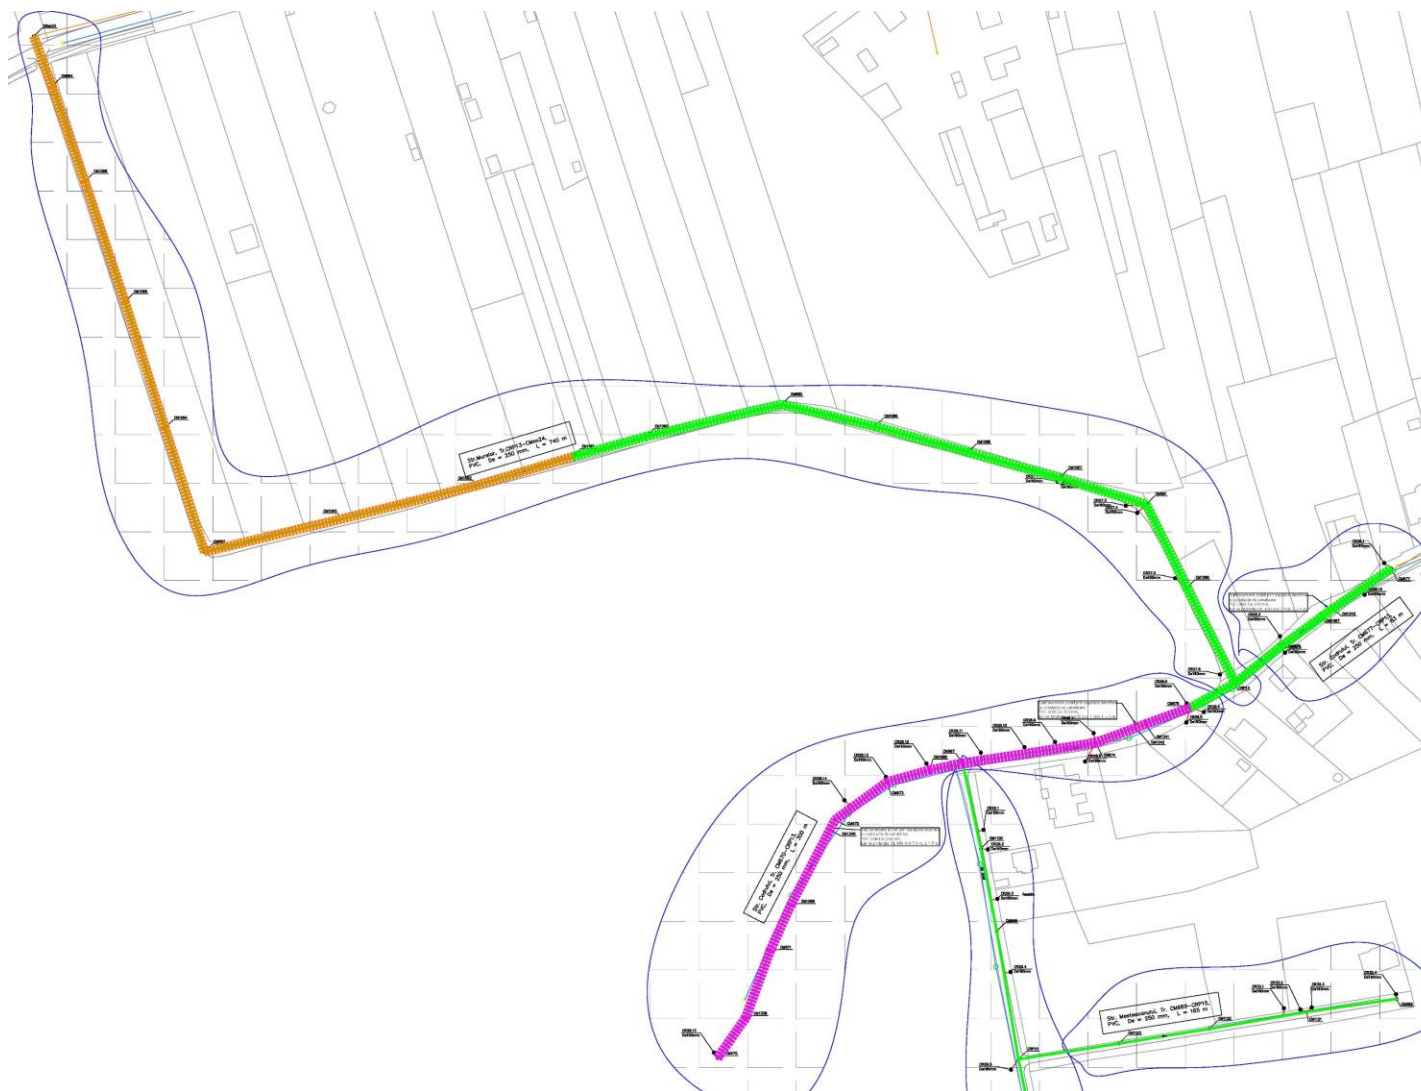


		D2 - Colectoare de canalizare																								
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																									
Sub-Obiect	2.1 - Extindere retea de canalizare																									
Sectiune	Str. Codrului, Tr. CM670-CRP13, Tr. CM677-CRP13			m		0			0	#DIV/0!	De 250	m	368	343			25	93	De 160	m	160	26			134	16
Lista Nr.	D-2.1-3																									

D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	17	15			2	88	D 315	buc.	16	5			11	31	E-2.1-1	3	3	0	100

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Note constatare	Proba etanseitate	CCTV	As-built
	mp	617	0			617	0		mp	617	0			617	0				



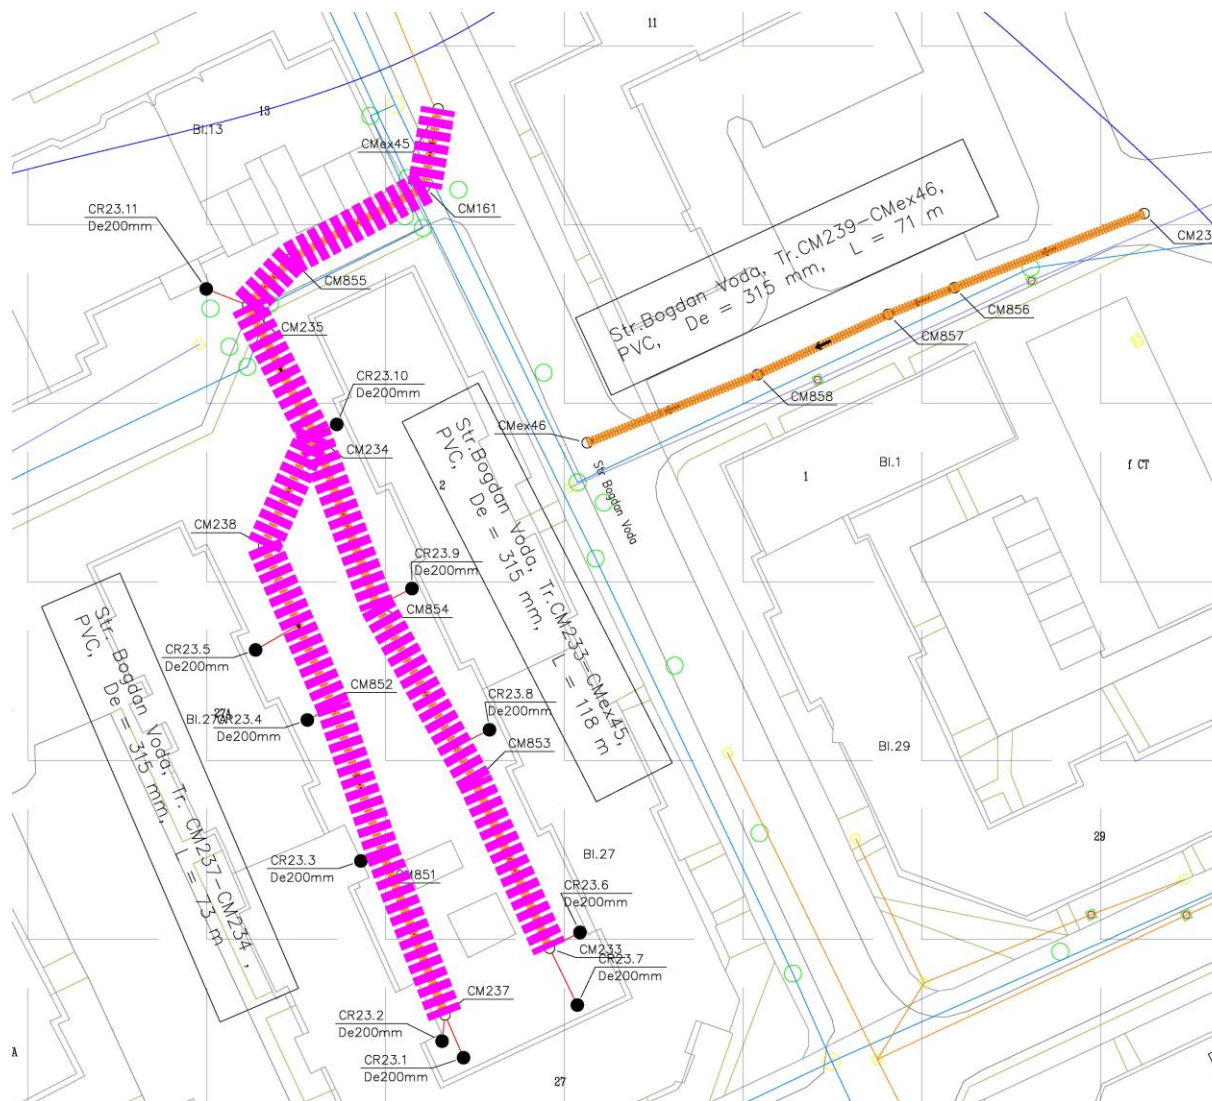

RETELE DE APA SI APA UZATA BAI A MARE – MM-CL-06

Operator economic,

DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL


Prin Lider Asociere, DIMEX-2000 COMPANY S.R.L

		D2 - Colectoare de canalizare																								
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																									
Sectiune	Str. Bogdan Voda, Tr. CM237-CM234, Tr. CM273-CM271, Tr.CM233-CMex45, Tr.CM239-CMex46, Tr. CM255-CMex31, Tr. CM260-CMex32, Tr. CM263-CMex33, Tr. CM267-CMex34, Tr. CM301-CMex35			m		0			#DIV/0!	De 250 De 315	m	939	193			746	21	De 200	m	380	0			380	0	
Lista Nr.	D-2.2-11																									

D5 - Camine de vane si camine de vizitare							D8 - Camine de racord							Traversari						
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	48	10			38	21	DN 1000	buc.	26	1			25	4			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier							D12 - Refacerea sistemului rutier												
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS					Rest de executat	% executat
	mp	430	0			430	0		mp	430	0			430	0				



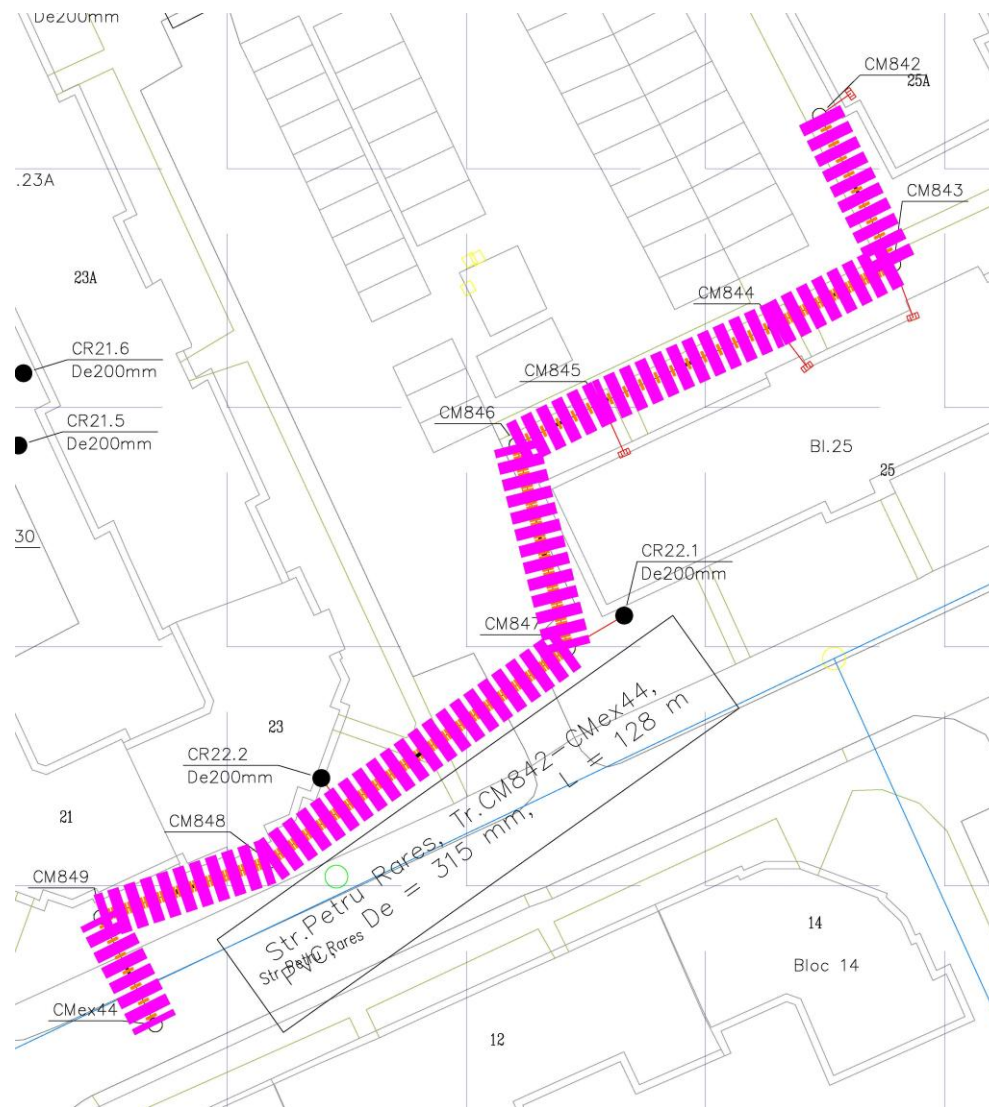

RETELE DE APA SI APA UZATA BAIJA MARE – MM-CL-06

Operator economic,

DIMEX 2000 COMPANY SRL – CONSTRUROM SA – ROMTIM INSTAL SRL

Prin Lider Asociere, **DIMEX-2000 COMPANY S.R.L**

		D2 - Colectoare de canalizare																							
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Conducte de racord din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																								
Sectiune	Str. Petru Rares, Tr.CM842-CMex44		m		0			0	#DIV/0!	De 315	m	128	128			0	100	De 200	m	60	0			60	0
Lista Nr.	D-2.2-20																								


D5 - Camine de vane si camine de vizitare								D8 - Camine de racord								Traversari				
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
DN 1000	buc.	8	8			0	100	DN 1000	buc.	2	0			2	0			0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier											
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	100	0			100	0		mp	100	0			100	0				

- ZONA DE LUCRU 2.3 – CONSTRUROM SA – Str. Petru Rares



- **ZONA DE LUCRU 2.4 – DIMEX 2000 COMPANY SRL**
- **Str. Barbu Stefanescu Delavrancea**

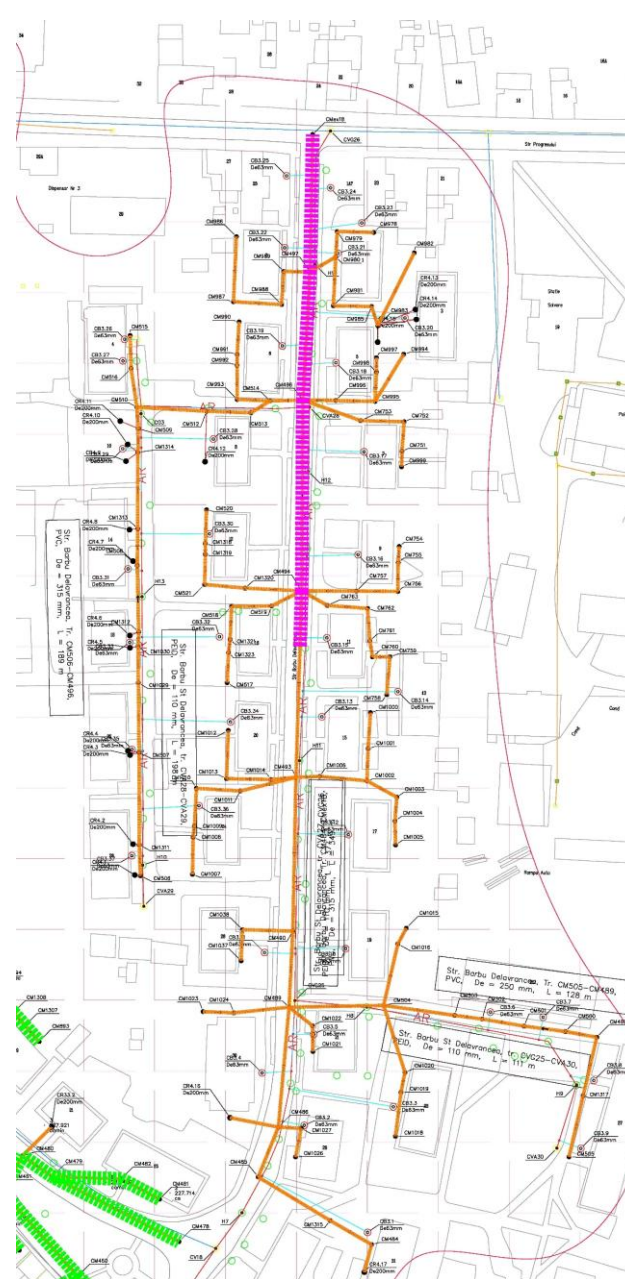

		D2 - Colectoare de canalizare															
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Colectoare de canalizare din tuburi PVC-KG SN8	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat
Sub-Obiect	2.2 - Reabilitare retea de canalizare																
Sectiune	Str. Barbu Delavrancea, Tr. CM1000-CM1002, Tr. CM1005-CM493, Tr. CM1007-CM493, Tr. CM1012-CM493, Tr. CM1015-CM504, Tr. CM1018-CM504, Tr. CM1021-CM489, Tr. CM1023-CM489, Tr. CM1026-CM486, Tr. CM1037-CM490, Tr. CM484-CM486, Tr. CM505-CM489, Tr. CM506-CM496, Tr. CM515-CM510, Tr. CM517-CM494, Tr. CM520-CM494, Tr. CM754-CM494, Tr. CM758-CM494, Tr. CM978-CM980, Tr. CM982-CM497, Tr. CM986-CM497, Tr. CM990-CM514, Tr. CM994-CM496, Tr. CM997-CM995, Tr. CM999-CM496		m		0			0	#DIV/0!	De 200 De 315	m	1438	150			1288	10
Lista Nr.	D-2.2-7																

D5 - Camine de vane si camine de vizitare							D8 - Camine de racord							Traversari			
Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	Camine de racord	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat
DN 1000	buc.	107	4			103	DN 1000	buc.	17	0			17		0	0	#DIV/0!

D10 - Desfacerea sistemului rutier							D12 - Refacerea sistemului rutier										
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat				
	mp	1230	0			1230		mp	1230	0			1230				

- **ZONA DE LUCRU 2.4 – DIMEX 2000 COMPANY SRL – Str. Barbu Stefanescu Delavrancea**



- **ZONA DE LUCRU 2.5 – CONSTRUROM SA – Str. Garii – colector PAFSIN – ovoid 600/900**



- ZONA DE LUCRU 2.5 – CONSTRUROM SA – Str. Garii – colector PAFSIN – ovoid 600/900



		D2 - Colectoare de canalizare								D5 - Camine de vane si camine de vizitare								Traversari				
		Colectoare de canalizare din tuburi PAFSIN	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Camine de vizitare	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Lista Nr.	Buc.	Executat	Rest de executat	% executat
Obiect	2 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare																					
Sub-Obiect	2.3 - Reabilitare colector de canalizare																					
Sectiune	Colector canalizare (Str. Paltinisului - Str. Garii), Tr. CM628-CMex23	DN 800	m	699	699			0	100		buc.	50	37			13	74	E-2.3-1	1	1	0	100
		De 600/900		1617	912			705	56										3	0	3	0
		De 760/1140		818				818	0												0	#DIV/0!
		De 2100/1575		380				380	0												0	#DIV/0!
Lista Nr.	D-2.3-1			3514	1611	0	0	1903	46										4	1	3	25

D10 - Desfacerea sistemului rutier								D12 - Refacerea sistemului rutier								Note constatare	Proba etanseitate	CCTV	As-built
Desfacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat	Refacere sistem rutier	U.M.	Cant.	Executat	NR	NCS	Rest de executat	% executat				
	mp	6715	0			6715	0		mp	6715	0			6715	0				

PROGRES GENERAL – MM-CL-06

DIMEX																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT	1294	9002	3536	1630	15462	74	151	41		PROIECT	2213	9123	2840	14176	593	226
EXECUTAT	115	4561	1065	60	5801	15	2	9		EXECUTAT	1265	5627	208	7100	360	73
PROCENT	8.89	50.7	30.1	3.7	37.5	20.3	1.3	22.0		PROCENT	57.2	61.7	7.3	50.1	60.7	32.3
CONSTRUROM																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT		5694	1520	950	8164	43	87	21		PROIECT	2588	9649	3200	15437	468	266
EXECUTAT		252	1324	369	1945	9	42	8		EXECUTAT	1627	4846	1026	7499	252	143
PROCENT		4.4	87.1	38.8	23.8	20.9	48.3	38.1		PROCENT	62.9	50.2	32.1	48.6	53.8	53.8
TOTAL																
	APA										CANALIZARE					
	PEID				TOTAL	CAMINE VANE	CAMINE BRANSAMENT	HIDRANTI			PAFSIN	PVC	RACORD	TOTAL	CAMINE VIZITARE	CAMINE RACORD
	ADUCTIUNE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE	BRANSAMENT												
PROIECT	1294	14696	5056	2580	23626	117	238	62		PROIECT	4801	18772	6040	29613	1061	492
EXECUTAT	115	4813	2389	429	7746	24	44	17		EXECUTAT	2892	10473	1234	14599	612	216
PROCENT	8.89	32.8	47.3	16.6	32.8	20.5	18.5	27.4		PROCENT	60.2	55.8	20.4	49.3	57.7	43.9

PROGRES GENERAL PE OBIECTE – MM-CL-06

Obiect	1	Reabilitarea si extinderea retelei de apa din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	m	1294	115	-	115	8.89
Sub-Obiect	1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	m	13147	4561	252	4813	36.61
Sub-Obiect	1.3	Reabilitarea retelei de distributie apa potabila	m	4883	1065	650	1715	35.12
Sub-Obiect	1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	m	1549	-	505	505	32.60
Sub-Obiect	1.5	Extinderea retelei de distributie apa potabila	m	173	-	169	169	97.69
Sub-Obiect	1.6	Statie de pompare apa potabila	buc.	1	0	-	0	0.00
Obiect	2	Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata din municipiul Baia Mare	UM	INDICATORI	REALIZAT			PROCENT
					DIMEX	CONSTRUROM	TOTAL	
Sub-Obiect	2.1	Extindere retea de canalizare	m	5393	362	1397	1759	32.62
Sub-Obiect	2.2	Reabilitare retea de canalizare	m	15864	5831	4164	9995	63.00
Sub-Obiect	2.3	Reabilitare colector de canalizare	m	3514	-		1611	45.85
Sub-Obiect	2.4	Statii de pompare apa uzata si conducta de refulare						
		<i>Statii de pompare apa uzata</i>	buc.	2	0	0	0	0.00
		<i>Conducte de refulare</i>	m	1649	0	0	0	0.00
Sub-Obiect	2.5	Reabilitare deversor, B-dul Bucuresti	buc.	1	-	0	0	0.00

ZONE INCEPERE LUCRARI MAI-IUNIE 2026:

- 1. Str. Vasile Lucaciu – reabilitare retea canalizare**
- 2. Str. George Cosbuc – reabilitare retea canalizare**
- 3. Str. Corbului – reabilitare retea transport**
- 4. B-dul. Independentei – extindere retea de canalizare**
- 5. B-dul. Unirii – reabilitare retea de transport si reabilitare retea canalizare**
- 6. Str. Paltinului – extindere retea canalizare**
- 7. Str. Mesteacanului - extindere retea canalizare**
- 8. Str. Castanilor - extindere retea canalizare**
