

Contract de Lucrari

Nr.232/10.10.2024

MM-CL-07 — Retele de apa si apa uzata: Tautii
Magheraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti

Valoarea Contractului: **124.476.986,58 lei, exclusiv TVA**

Beneficiar: **Vital SA**

Antreprenor: **Asocierea Euskadi si Antrepriza Montaj Instalatii SRL**



Datele Contractului

- Semnare Contract: 10.10.2024
- Ordin Începere: 08.01.2025
- Durata Contractului : 30 luni
- Perioada de Garantie : 60 luni

Antreprenor : **Asocierea Euskadi SA si Antrepriza Montaj Instalatii SRL**

Subcontractori : **Euskaltel SRL
Radvior-Com SRL
Tautii Iuga SRL
Xallo Tehnic SRL**

Centralizatorul Investitiei

Lucrari UAT BAIA SPRIE

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT Baia Sprie		
Sub-obiect 1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	L = 488 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	L = 3203 m, PEID PE100 PN10; De 400 mm
Sub-obiect 1.3	Reabilitare retelei de distributie apa potabila	L = 4771 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 4210 m, PEID PE100 PN10+16; De 110+160+280 mm
Sub-obiect 1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila	L = 3962 m, PEID PE100 PN10; De 110+125+160 mm
Sub-obiect 1.6	Statie de pompare apa	Grup pompare (2A+1R), Qp = 10 l/s, Hp=45 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 10 l/s, Hp=125 mCA; Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
		Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=60 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=70 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m
Sub-obiect 1.7	Monitorizare si control hidraulic sistem apa	8 buc
Sub-obiect 1.8	Gospodarii de apa Baia Sprie	2 buc

OBIECT 2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE DIN UAT BAIA SPRIE		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea de canalizare	L = 11207 m, PVC SN8; De 250 mm;
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea de canalizare	L = 6607 m, PVC SN8; Dn 250 mm+Dn 315 mm;
Sub-obiect 2.3	Statie de pompare apa uzata	SPAU1: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 10,0 m, Lref = 146 m, PEID, De 110 mm SPAU2: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 20,0 m, Lref = 291 m, PEID, De 110 mm SPAU3: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 12,0 m, Lref = 146 m, PEID, De 110 mm SPAU4: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 15,0 m, Lref = 258 m, PEID, De 110 mm SPAU5: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 10,0 m, Lref = 187 m, PEID, De 110 mm SPAU6: 1A+1R, Q = 6.0 l/s, Hp = 26,0 m, Lref = 526 m, PEID, De 110 mm

Lucrari UAT SISESTI

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT Sisesti		
Sub-obiect 1.1	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 1996 m, PEID PE100 PN10; De 280 mm
Sub-obiect 1.2	Extinderea retelei de distributie apa potabila	L = 21595 m, PEID PE100 PN10; De 110+250+280 mm
Sub-obiect 1.3	Statie de pompare apa potabila	Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=60 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=70 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m
Sub-obiect 1.4	Monitorizare si control hidraulic sistem apa Sisesti	1 buc

Lucrari TAUTII MAGHERAUS

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT TM-1 - EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-1.1	Extindere retelei de distributie apa potabila Tautii Magheraus	L = 5.464 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT TM-2 -EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-1.2	Statie de pompare apa potabila Tautii Magheraus	1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 8.34 l/s, Hp=30 m
Sub-obiect TM-1.3	Extindere retelei de distributie apa potabila Merisor	L = 345 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.4	Extindere retelei de distributie apa potabila Busag	L = 79 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila Baita	L = 1.301 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.6	Statie de pompare apa potabila Baita	1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.2 l/s, Hp=44 m, 1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.4 l/s, Hp=29 m, 1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.4 l/s, Hp=38 m,
Sub-obiect TM-1.7	Monitorizare si control hidraulic sistem apa Tautii Magheraus	1 buc
OBIECT TM-2 -EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-2.1	Extindere retea de canalizare Tautii Magheraus	L = 4.683 m, PVC SN8; De 250 mm
Sub-obiect TM-2.2	Statie de pompare apa uzata Tautii Magheraus	1 buc - 1A+1R, Q = 1.31 l/s, Hp = 5,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 169 m, PEID, De 110 mm, 1 buc - 1A+1R, Q = 0.87 l/s, Hp = 7,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 220 m, PEID, De 110 mm
Sub-obiect TM-2.3	Conducte de refulare SPAU Tautii Magheraus	L = 389 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-2.4	Extindere retea de canalizare Busag	L = 502 m, PVC SN8; De 250 mm
Sub-obiect TM-2.5	Statie de pompare apa uzata Busag	1 buc - 1A+1R, Q = 1.22 l/s, Hp = 7,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 368 m, PEID, De 110 mm
Sub-obiect TM-2.6	Conducte de refulare SPAU Busag	L = 368 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm

Lucrari UAT RECEA

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - Retele de distributie apa potabila in localitatea Recea		
Sub-obiect 1.1	Extindere retea alimentare apa	L = 1184 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT 2 - Retele de distributie apa in localitatea Mocira		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea alimentare apa	L = 777 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea alimentare apa	L = 1943 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT 3 – Retele de canalizare menajera in localitatea Recea		
Sub-obiect 3.1	Infiintare retea de canalizare	L = 8489 m, PVC SN8; De 250 mm
OBIECT 4 – Retele de canalizare menajera in localitatea Mocira		
OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
Sub-obiect 4.1	Infiintare retea de canalizare	L = 9191 m, PVC SN8; De 250 mm
OBIECT 5 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Recea		
Sub-obiect 5.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 6398 m, PEID PE100 PN6; De 90 si 200 mm
OBIECT 6 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Mocira		
Sub-obiect 6.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 2078 m, PEID PE100 PN6; De 90 si 110 mm
OBIECT 7 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Sasar		
Sub-obiect 7.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 3362 m, PEID PE100 PN6; De 110 mm
OBIECT 8 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Recea		
Sub-obiect 8.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 1 - 1A+1R, Q = 25.0 l/s, Hp = 70 m SPAU 2 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 30 m SPAU 3 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 4 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 15 m SPAU 5 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 6 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 25 m SPAU 7 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 8 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 12 m
OBIECT 9 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Mocira		
Sub-obiect 9.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 2 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 3 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 13 m SPAU 4 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 5 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 6 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 12 m SPAU 7 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 17 m SPAU 8 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m
OBIECT 10 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Sasar		
Sub-obiect 10.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 1 - 1A+1R, Q = 10.0 l/s, Hp = 49 m

Documente Antreprenor

Denumire Document	Data Depunere	Data Aprobare
Inaintare Plan General de Securitate și ăănătate	28.01.2025	26.03.2025
Inaintare Plan de Management al mediului	28.01.2025	04.04.2025
Inaintare Plan de Management al Traficului	28.01.2025	28.03.2025
Inaintare Plan de Asigurare a Calit, Plan de control al Calitatii	28.01.2025	17.03.2025
Inaintare spre aprobare Organigrama Antreprenorului	03.02.2025	21.02.2025
Solicitare aprobare Program de execuție	07.02.2025	20.02.2025
Inaintare in vederea aprobarii personalului specializat si auxiliar pentru ridicari si planuri topografice	10.02.2025	14.04.2025
Înaintare Asigurări	19.02.2025	14.04.2025
Transmitere Asigurări de răspundere civilă auto	14.03.2025	14.04.2025
Înaintare spre aprobare documente tehnice privind Organizarea de Șantier.	14.03.2025	04.04.2025
Inaintare plan de management social	23.06.2025	23.07.2025

Avize IPJ

Aviz IPJ	nr.124058 din 01.04.2025	Recea	Localitatea Mocira <ul style="list-style-type: none"> • Unirii intre Ulita Mare si Crinilor • Crinilor intre Unirii si Trandafirilor • 1 Decembrie intre Stadionului si Ghiocelilor • Ghiocelilor intre 1 Decembrie si final de strada 1 Decembrie Localitatea Recea <ul style="list-style-type: none"> • Ulita Mare intre Unirii si Aeroportului • Aeroportului intre Ulita Mare si Alea Mocirii • Stadionului intre Europa DN1C si Florilor Localitatea Sasar <ul style="list-style-type: none"> • Morii intre statia de epurare si 1 Decembrie • 1 Decembrie intre Morii si Garii • Garii intre 1 Decembrie si Traversare cale ferata • Daliei intre traversarea caii ferate si Viilor
Aviz IPJ	nr.124057 din 01.04.2025	Tautii Magheraus	Tautii Magheraus <ul style="list-style-type: none"> • Strada 67 ,22, 23, 54, 57, 58 Busag • Strada 113 , 114 Merisor <ul style="list-style-type: none"> • Strada 133A, 133B
Aviz IPJ	nr. 381604 din 09.04.2025	Baia Sprie	<ul style="list-style-type: none"> • Alea Minerilor , intre Gutinului DN18 si liceul Auto • strada Decebal , intre alea Minerilor si Dragos Voda • strada Pietrosului • strada Olarilor intre Microraion Vest si Gutinului DN 18 • strada 1 Mai • strada Sperantei • strada Islazului
Aviz IPJ	nr. 383787 din 27.07.2025	Baia Sprie	Magnoliei, Mihai Eminescu, Salcamilor, Tudor Vladimirescu, Strabunilor, Ignisului, Morii, Garii, Gordanului, Pietrarului, Ghiocelului

Avize IPJ

Aviz IPJ	nr. 127007 din 28.07.2025	Tautii Magheraus	153,30,33,38,36,45,41,40,37,84,86,82,39
Aviz IPJ	nr. 384452 din 22.08.2025	Sisesti	5,8,9,17,18 Surdesti 21,26 Sisesti
Aviz IPJ	nr. 389724 din 06.11.2025	Sisesti	22,37,12 Sisesti
Aviz IPJ	nr. 129591 din 17.11.2025	Tautii Magheraus	UAT Tautii Magheraus
Aviz IPJ	nr. 389970 din 15.11.2025	Baia Sprie	Str. Pietrosului, Alea Minerilor, Decebal, Olarilor, 1 Mai, Sperantei si Dragos Voda.
Aviz IPJ	nr.129592 din 17.11.2025	Recea	UAT Recea

Avize Spargere


Aviz Spargere	nr. 33 din 03.04.2025	Tautii Magheraus	Tautii Magheraus <ul style="list-style-type: none"> • Strada 22, 23, 54, 58 Busag • Strada 113 , 114 Merisor <ul style="list-style-type: none"> • Strada 133A, 133B
Aviz Spargere	nr. 27 din 07.04.2025	Recea	Acord amplasare in zona
Aviz Spargere	nr.3223 din 11.04.2025	Baia Sprie	<ul style="list-style-type: none"> • Aleea Minerilor , intre Gutinului DN18 si liceul Auto • strada Decebal , intre aleea Minerilor si Dragos Voda • strada Pietrosului • strada Olarilor intre Microraion Vest si Gutinului DN 18 • strada 1 Mai • strada Sperantei • strada Islazului
Aviz Spargere	nr. 86 dinn 22.05.2025	Tautii Magheraus	strazile 67, 25 , 26 ,113 , 114 ,57
Aviz Spargere	nr. 6066 din 28.07.2025	Baia Sprie	Magnoliei, Mihai Eminescu, Salcamilor, Tudor Vladimirescu, Strabunilor, Ignisului, Morii, Garii,Gordanului,Pietrarului,Ghiocelului
Aviz Spargere	nr. 134 din 07.08.2025	Tautii Magheraus	153,30,33,38,36,45,41,40,37,84,86,82,39
Aviz Spargere	nr. 1 din 04.09.2025	Sisesti	5,8,9,17,18 Surdesti / 21,26 Sisesti
Aviz Spargere	nr. 2 din 11.11.2025	Sisesti	3,4 Danesti / 22,37,12 Surdesti

Predari Amplasament

NR.	Tip document	Nr. și data procesului-verbal	UAT	Străzi predate
1	Predare amplasament	nr. 1 din 25.04.2025	Tăuții Măgherăuș	str. 54 str. 22 si str.23
2	Predare amplasament	nr. 1 din 25.04.2025	Recea	Localitatea Recea : str. Stadionului si str. Daliei Localitatea Mocira: str.Unirii si str. Crinilor Localitatea Sasar: str.Daliei
3	Predare amplasament	nr. 2 din 19.05.2025, OUT766/19.05.2025	Baia Sprie	Aleea Minerilor (între DN18 - Str. Gutinului și Liceul Auto Baia Sprie), -Str. Decebal (între Aleea Minerilor și Str. Dragoș Vodă), Str. Pietrosului, - Str. Olarilor (între Str. Microraion Vest și DN18 Str. Gutinului)Str. 1 Mai, Str. Speranței, Str. Islazului
4	Predare amplasament	nr. 3 din 21.05.2025, OUT804/21.05.2025	Tăuții Măgherăuș	UAT Tautii Magheraus
5	Predare amplasament	nr. 4 din 22.05.2025, OUT821/22.05.2025	Recea	Localitatea Mocira: Str. 1 Decembrie, Str. Ghiocilor, Str. Stejarului, Str. Stadionului; Localitatea Recea: Str. Ulița Mare, Str. Aeroportului, Localitatea Sasar: Victoriei, Morii, 1 Decembrie, Garii
6	Predare amplasament	nr. 5 din 01.07.2025, OUT 1169/ 01.07.2025	Recea	Localitatea Recea : Aleea Mocirii



Predari Amplasament



7	Predare amplasament	nr. 6 din 15.07.2025, OUT1308/15.07.2025	Baia Sprie	str. Aleea Minerilor, str. Decebal
8	Predare amplasament	nr. 7 din 29.07.2025, OUT1308/15.07.2026	Baia Sprie	str. Mihai Eminescu, Salcamilor, Ignisului, Ghiocelului
9	Predare amplasament	nr. 8 din 06.08.2025, OUT1466/06.08.2026	Baia Sprie	Str. Morii,str. Pietrarului,str.Magnoliei str. Gordanului
10	Predare amplasament	nr.9 din 28.08.2025 OUT1659/28.08.2025	Tautii Magheraus	Str. 30,36,37,38,39,40,41
11	Predare amplasament	nr. 10 din 09.09.2025 OUT1735/09.09.2025	Sisesti	Str. 5,8,9,17,18 (Surdesti) Str. 21,26 (Sisesti)
12	Predare amplasament	nr. 12 din 29.10.2025 OUT2201/29.10.2025	Baia Sprie	Tudor Vladimirescu ,Dragos Voda_1,Dragos Voda_2
13	Predare amplasament	nr. 12 din 29.10.2025 OUT2262/04.11.2025	Recea	Str. Unirii

Derularea Contractului

Ordin Incepere : 08.01.2025

- Autorizatie de Construire nr.4 din 21.02.2025 – primita in 26.02.2025
- FAM-uri depuse pentru aprobare

Aprobate : 44

Respinse:11

In lucru : 2

Drept Acces Santier : 19.03.2025

Incepere Lucrari : 05.05.2025

Situatia Financiara

In data de 25.10.2024 prin Adresa MM01-VTL24-XLVII-05 din 25.10.2024 s-a Inaintat Garantia de Buna Executie cu nr de inregistrare si transmitere email.


Sumarul Progresului Financiar (%) – estimat valoric si actualizat conform Fluxului de numerar din data de 31.01.2026

Progres [%] si [Lei]			Timp trecut	
Prevazut	Actual	Nerealizat (-) Depasiri (+)	Luni	[%]
Anterior				
0.00	0.00	0.00	10	33.33%
0.00%	0.00%	0.00%		
In perioada de raportare				
0.00	0.00	0.00	1	3.33%
0.00%	0.00%	0.00%		
Cumulat				
0.00	0.00	0.00	11	36.33%
0.00%	0.00%	0.00%		

Curba "S"



Valoare estimata

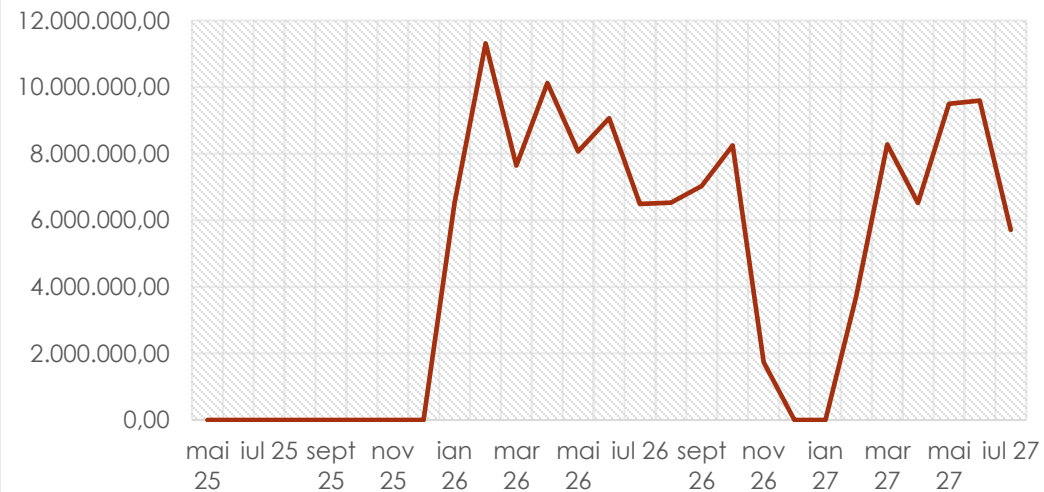



Organizarea Santierului

➤ Obținerea terenului:

Hotărârea Consiliului Local Recea – HCL nr.13 din 27.02.2025

➤ Proiectarea organizării santier:

Aprobarea DTOE prin adresa OUT 505/04.04.2025

➤ Obținerea Autorizației de Construire

Certificat de Urbanism nr.312 din 10.03.2025

Autorizația de Construire nr. 99 din 14.04.2025

➤ Recepția Organizării de Santier

La data de 20.05.2025, s-a întocmit Procesul verbal de recepție calitativă lucrări nr. 181, cu ocazia verificărilor efectuate la organizarea de santier Recea. Acesta a fost înregistrat la Antreprenor cu nr. MM01/VTL24-XLVII-188 din 21.05.2025.

Detalii si activitati in luna de raportare : Ianuarie 2026



In luna ianuarie nu s-au desfasurat activitati in teren, ca urmare a suspendarii temporare a lucrarilor, situatie care a fost comunicata anterior prin adresele oficiale MM01VTL24-XLVII-557 din 16.12.2025-Informare privind intreruperea temporară a activității în perioada 19.12.2025 – 12.01.2026 si MM01VTL24-XLVII-584 din 28.01.2026-Răspuns adresa RCE-MM-CL07-003 din 27.01.2026 -reluarea execuției lucrărilor pe șantier transmise Beneficiarului si Supervizorului. Reluarea activitatilor urmeaza a fi notificata in prealabil, conform procedurilor contractuale si obligatiilor de informare.

Detalii si activitati in luna de raportare:Decembrie 2025

➤ In UAT Tautii-Magheraus, lucrarile aferente retelei de apa s-au executat pe strazile 82,si refaceri pe strazile 25,26,40,45,113,30

Nr.Crt.	Nume strada	Indicator				Forta de munca (pers)	Grafic		Stadiu
		Lungime conducta	Diametru conducta	Bransamente	Alte lucrari conexe		Perioada de inceput	Perioada finala	
1	str.25	206	110			4	08.09.2025	14.11.2025	206
	str.25	88	25			4	08.09.2025	14.11.2025	88
2	str.26	109	110			4	15.09.2025	14.11.2025	109
	str.26	48	25			4	15.09.2025	14.11.2025	48
3	Str. 54	240	110			5	10.06.2025	20.06.2025	240
	Str. 54	96	25			5	10.06.2025	20.06.2025	96
4	Str. 58	638	110			5	15.07.2025	14.11.2025	638
	Str. 58	256	25			5	15.07.2025	14.11.2025	256
5	str 133A	165	110			4	04.09.2025	13.09.2025	165
	str 133A	64	25			4	04.09.2025	13.09.2025	64
6	str. 30	1164	110			5	15.09.2025	30.10.2025	1164
	str. 30	472	25			5	15.09.2025	30.10.2025	472
7	str.41	136	110			5	23.10.2025	24.11.2025	136
	str.41	80	25			5	23.10.2025	24.11.2025	80
8	str 45	231	110			4	14.11.2025	21.11.2025	231
	str 45	96	25			4	14.11.2025	21.11.2025	96
9	str.40	211	110			4	22.10.2025	22.11.2025	211
	str.40	144	25			4	22.10.2025	22.11.2025	144
10	str. 39	237	110			4	13.10.2025	28.10.2025	237
	str. 39	200	25			4	13.10.2025	28.10.2025	200
11	str. 36	408	110			4	03.11.2025	20.11.2025	408
	str. 36	288	25			4	03.11.2025	20.11.2025	288
12	str.37	388	110			5	13.10.2025	28.10.2025	388
	str.37	272	25			5	13.10.2025	28.10.2025	272
13	str. 38	344	110			4	06.10.2025	27.10.2025	344
	str. 38	272	25			4	06.10.2025	27.10.2025	272
14	Str 114	79	110			4	09.07.2025	14.11.2025	79
	Str 114	32	25			4	09.07.2025	14.11.2025	32
15	str. 84	419	110			5	01.10.2025	31.10.2025	419
	str. 84	304	25			5	01.10.2025	31.10.2025	223
16	str. 86	302	110			5	06.10.2025	14.11.2025	302
	str. 86	120	25			5	01.10.2025	06.11.2025	120
17	str. 82	580	110			4	01.10.2025	10.10.2025	580
	str. 82	224	25			4	01.10.2025	10.10.2025	224
	Camine vane	50							28 buc
	Hidranti	34							13 - buc
	Bransamente	452							197- buc

Refaceri
Refaceri
Refaceri
Refaceri

Refaceri

Refaceri

Refaceri

Refaceri

Nr.Crt.	Nume strada	Indicator			Forta de munca (pers)	Grafic		Stadiu
		Lungime conducta	Diametru conducta	Alte lucrari conexe		Perioada de inceput	Perioada finala	
1	Str. 22	503	250		6	07.05.2025	17.11.2025	503
	Str. 22	15	160		6	07.05.2025	17.11.2025	59
2	Str. 113	342	250		4	04.08.2025	19.08.2025	342
	Str. 113	14	160		4	04.08.2025	19.08.2025	64.5
3	Str. 67	209	250		5	05.06.2025	17.11.2025	209
	Str. 67	10	160		5	05.06.2025	17.11.2025	18
	Refulare SPAU	757	110			07.05.2025	18.08.2025	757
1	Total Camine Beton				149			36 - buc
2	Total Racorduri				354			50 - buc

Refaceri



UAT Recea

Reabilitare retea distributie apa , strazile - Crinilor si 1 Decembrie

Refaceri , strazile - Aeroportului_2, Aeroportului_3, Aeroportului_4 ,Aleea Mocirii_3 si Stejarului_M1 si Unirii_2, Ghiocelor_3, Ghiocelor_2, Stadionului_2., Stejarului_M2, 1 Decembrie_3, 1 Decembrie_5, 1 Decembrie_7, Florilor_2, Florilor_1, Daliei, Calinisia

APA


Nr.Crt	Nume strada	Indicator				Fora de muncă (pers)	Grafic		Stadiu
		Lungime conducta	Diametr u conduct a	Bransa mente	Alte lucrari conex e		Perioada de inceput	Perioada finala	
1	Daliei	221	110			6	23.05.2025	26.09.2025	221
	Daliei	60	25			6	23.05.2025	26.09.2025	60
2	Calinisia	36	110			5	30.06.2025	30.06.2025	36
	Calinisia	20	25			5	30.06.2025	30.06.2025	20
3	1 Decembrie	751	110			4	30.10.2025	05.12.2025	751
	1 Decembrie	960	25			4	30.10.2025	05.12.2025	64
4	Crinilor - reabilitare	103	110			4	27.10.2025	05.11.2025	103
	Crinilor - reabilitare	70	25			4	27.10.2025	05.11.2025	50
5	Crinilor - extindere	380	110			5	03.11.2025	20.03.2026	380
	Crinilor - extindere	130	25			5	03.11.2025	20.03.2025	68
	Camine vane	103							4
	Hidranti	51							2
	Bransamente	251							

Refaceri

Refaceri

CANAL

Nr.Crt	Nume strada	Lucrari Previzionate				Fora de muncă (pers)	Grafic		Stadiu
		Lungime conducta	Diametr u conduct a		Alte lucrari conex e		Perioada de inceput	Perioada finala	
1	Str. Stadionului	739	250			5	09.05.2025	20.11.2025	739
	Str. Stadionului	290	160			5	09.05.2025	20.11.2025	290
2	Stadionului 1	145	250			4	09.05.2025	20.11.2025	145
	Stadionului 1	80	160			4	09.05.2025	20.11.2025	80
3	Stadionului 2	55	250			4	09.05.2025	20.11.2025	55
	Stadionului 2	40	160			4	09.05.2025	20.11.2025	40
4	Stadionului 3	95	250			5	23.06.2025	30.09.2025	95



	Stadionului 3	90	160			5	23.06.2025	30.09.2025	90
	Str.Stadionului 4	165	250			5	08.05.2025	30.09.2025	165
5	Str.Stadionului 4	150	160			5	08.05.2025	30.09.2025	150
	Daliei	227	250			4	06.08.2025	18.11.2025	227
6	Daliei	60	160			4	06.08.2025	18.11.2025	60
	Calinisia	47.03	250			4	22.09.2025	18.11.2025	47
7	Calinisia	20	160			4	22.09.2025	18.11.2025	20
	Aeroportului 1	147	250			4	15.09.2025	19.03.2026	147
8	Aeroportului 1	60	60			4	15.09.2025	19.03.2025	60
	Aeroportului 2	316	250			5	11.09.2025	17.10.2025	229
9	Aeroportului 2	150	160			5	11.09.2025	17.10.2025	80
	Aeroportului 3	780.2	250			5	03.11.2025	13.11.2025	367
10	Aeroportului 3	160	160			5	03.11.2025	03.11.2025	
	Aeroportului 4	145	250			5	25.08.2025	11.11.2025	145
11	Aeroportului 4	140	160			5	25.08.2025	11.11.2025	140
	Ulita Mare 7	232	250			4	17.07.2025	27.08.2025	200
12	Ulita Mare 7	260	160			4	17.07.2025	27.08.2025	260
	1 Decembrie 1	572	250			5	02.06.2025	21.07.2025	572
13	1 Decembrie 1	310	160			5	02.06.2025	21.07.2025	160.0
	Crinilor	845	250			4	06.06.2025	21.07.2025	845.00
14	Crinilor	260	160			4	06.06.2025	21.07.2025	150
	Ghiocelor 2	419	250			5	04.08.2025	18.11.2025	419
15	Ghiocelor 2	110	160			5	04.08.2025	18.11.2025	110
	Ghiocelor 3	203	250			4	01.08.2025	18.11.2025	203
16	Ghiocelor 3	80	160			4	01.08.2025	18.11.2025	80
	Unirii 1	886.94	250			6	07.11.2025	23.03.2026	500
17	Unirii 1	950	160			6	07.11.2025	23.03.2026	100
	Str. Unirii 2	443	250			5	09.05.2025	20.11.2025	443
18	Str. Unirii 2	10	160			5	09.05.2025	20.11.2025	10
	1 Decembrie 3	259	250			4	05.08.2025	24.09.2025	259
19	1 Decembrie 3	340	160			4	05.08.2025	24.09.2025	150
	1 Decembrie 5	361	250			6	25.06.2025	22.07.2025	361
20	1 Decembrie 5	530	160			6	25.06.2025	22.07.2025	250
	1 Decembrie 7	221	250			5	16.06.2025	14.07.2025	221
21	1 Decembrie 7	180	160			5	16.06.2025	14.07.2025	60
	Str.Stadionului_M1	447	250			4	17.07.2025	18.11.2025	447
22	Str.Stadionului_M1	340	160			4	17.07.2025	18.11.2025	340
	Florilor 1	103	250			5	08.09.2025	18.11.2025	103
23	Florilor 1	50	160			5	08.09.2025	18.11.2025	50
	Florilor 2	346	250			5	08.09.2025	18.11.2025	346
24	Florilor 2	320	160			5	08.09.2025	18.11.2025	320
25	Aleea Mocirii 3	453	250			5	01.09.2025	13.10.2025	270

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Aleea Mocirii 3	260	160			5	01.09.2025	13.10.2025	50
Scolii 1	355	250			5	08.09.2025	06.10.2025	355
Scolii 1	170	160			5	08.09.2025	06.10.2025	170
Stejarului M1	78	250			4	16.10.2025	28.11.2025	78
Stejarului M1	40	160			4	16.10.2025	28.11.2025	40
Stejarului M2	155	250			4	07.10.2025	20.10.2025	155
Stejarului M2	70	160			4	07.10.2025	20.10.2025	70
Conducte refulare	3332	140			6	14.04.2025	01.07.2025	3216
Conducte refulare	3783	200			5	14.04.2025	01.07.2025	1512
Conducte refulare	4694	90			5	31.08.2026	01.07.2026	1283
Total Camine Beton			453					180 - buc
Total Racorduri			1157					211 - buc

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri

Reface
ri



► UAT Baia Sprie,

Extindere retea distributie apa : Dragos Voda_1.

Extindere retea canalizare : Mihai Eminescu , SPAU2

Reabilitare retea canalizare : Olarilor

Reface ri: Magnoliei, Ignisului, Olarilor

Nr.Crt.	Nume strada	Indicator				Fora de munca (pers)	Grafic		Stadiu
		Lungime conducta	Diametru conducta	Bransamente	Alte lucrari conexe		Perioada de inceput	Perioada finala	
1	Str. Ignisului-reabilitare	198	110			5	03.10.2025	17.11.2025	198
	Str. Ignisului-reabilitare	32	25			5	03.10.2025	17.11.2025	32
2	Str. Ignisului-extindere	251	110			5	01.08.2025	06.11.2025	251
	Str. Ignisului-extindere	108	25			5	01.08.2025	06.11.2025	108
2	str Morii	558	110			4	02.10.2025	07.11.2025	558
	str Morii	61	25			4	02.10.2025	07.11.2025	58
4	str Tudor Vladimirescu	198	110			5	03.11.2025	25.03.2026	97
	str Tudor Vladimirescu	52	25			5	03.11.2025	25.03.2026	
5	Dragos Voda 1	535	110			4	23.04.2026	04.06.2026	450
	Dragos Voda 1	46	25			4	23.04.2026	04.06.2026	46
6	Str. Pietrosului	133	110			4	23.07.2025	07.11.2025	133
	Str. Pietrosului	37	25			4	23.07.2025	07.11.2025	15
7	Str. Pietrarului	711	110			4	03.09.2025	06.11.2025	100
	Str. Pietrarului	107	25			4	03.09.2025	06.11.2025	
8	Str. Garii	458	125			5	18.08.2025	14.10.2025	458
	Str. Garii	589	110			5	18.08.2025	14.10.2025	589
	Str. Garii	400	25			5	18.08.2025	14.10.2025	70
9	str. Islazului	288	110			4	20.10.2025	01.03.2026	165
	str. Islazului	90	25			4	20.10.2025	01.03.2026	45
10	str. Sperantei	66	110			4	14.11.2025	26.03.2026	66
	str. Sperantei	9	25			4	14.11.2025	26.03.2026	4
11	Magnoliei	690	110			4	01.09.2025	01.03.2026	450
	Magnoliei	75	25			4	01.09.2025	01.03.2026	60
12	Reabilitare aductiune apa bruta	488	110			5	17.07.2025	13.08.2025	488
13	str. Gordanului	831	110			4	13.08.2025	19.09.2025	831
	Total Camine Vane			112					15 - buc
	Total Hidranti			476					23- buc
	Total Bransamente			121					61 - buc

Reface ri

CANAL

CANAL

Nr.Crt.	Nume strada	Indicator				Forța de muncă (pers)	Grafic		Stadiu
		Lungime conductă	Diametrul conductă		Alte lucrări conexe		Perioada de început	Perioada finală	
1	str. Magnoliei	662	250			4	03.09.2025	15.10.2025	662
	str. Magnoliei	81	160			4	03.09.2025	15.10.2025	81
2	str. Mihai Eminescu	440	250			5	14.10.2025	12.11.2025	389
	str. Mihai Eminescu	126	160			5	14.10.2025	12.11.2025	80
3	str. Salcamlor	692	250			5	04.08.2025	05.09.2025	633.5
	str. Salcamlor	61	160			5	04.08.2025	05.09.2025	36
4	Str. Pietrosului	133	250			3	23.06.2025	09.07.2025	133
	Str. Pietrosului	39	160			3	23.06.2025	09.07.2025	39
5	str Tudor Vladimirescu	225	250			4	03.11.2025	25.03.2026	97
	str Tudor Vladimirescu	51	160			4	03.11.2025	25.03.2026	10
6	str. Islazului	811	250			5	12.11.2025	09.06.2025	400
	str. Islazului	165	160			5	12.11.2025	09.06.2025	80
7	str. Sperantei	148	250			4	14.11.2025	26.03.2025	72
	str. Sperantei	13	160			4	14.11.2025	26.03.2025	
8	Str. Ignisului	247	250			4	17.07.2025	13.08.2025	247
	Str. Ignisului	91	160			4	17.07.2025	13.08.2025	91
9	Str. 1 Mai	65	250			5	17.07.2025	25.07.2025	65
	Str. 1 Mai	14	160			5	17.07.2025	25.07.2025	14
10	str. Olarilor	120	250			5	02.06.2025	31.03.2026	10
	str. Olarilor	616	315			5	02.06.2025	31.03.2026	415
	str. Olarilor	144	160			5	02.06.2025	31.03.2026	54
1	Total Camine Beton			538					72 - buc
2	Total Racorduri			914					110


Reface
riReface
riReface
ri



UAT SISESTI, s-au efectuat lucrari la reseaua de apa pe strada **9, 12, 18, 26**

**U.A.T. Sisesti
APA**

Nr.Crt.	Nume strada	Indicator				Forta de munca (pers)	Grafic		Stadiu
		Lungime conducta	Diametru conducta	Bransamente	Alte lucrari conexe		Perioada de inceput	Perioada finala	
1	Str. 21-Sisesti	1573	110			4	03.10.2025	13.10.2025	1573
	Str. 21- Sisesti	229	25			4	03.10.2025	13.10.2025	229
2	Str. 12-Sisesti	137	110			4	23.10.2025	30.10.2025	137
	Str. 12-Sisesti	7	25			4	23.10.2025	30.10.2025	7
3	Str. 9-Surdesti	153	110			4	23.10.2025	04.11.2025	153
	Str. 9-Surdesti	43	25			4	23.10.2025	04.11.2025	43
4	Str. 18-Surdesti	94	110			4	20.10.2025	27.10.2025	94
	Str. 18-Surdesti	15	25			4	20.10.2025	27.10.2025	15
5	Str. 26-Sisesti	313	110			4	04.11.2025	13.11.2025	313
	Str. 26-Sisesti	41	25			4	04.11.2025	13.11.2025	41
	Total Camine Vane								3 - buc
	Total Hidranti								

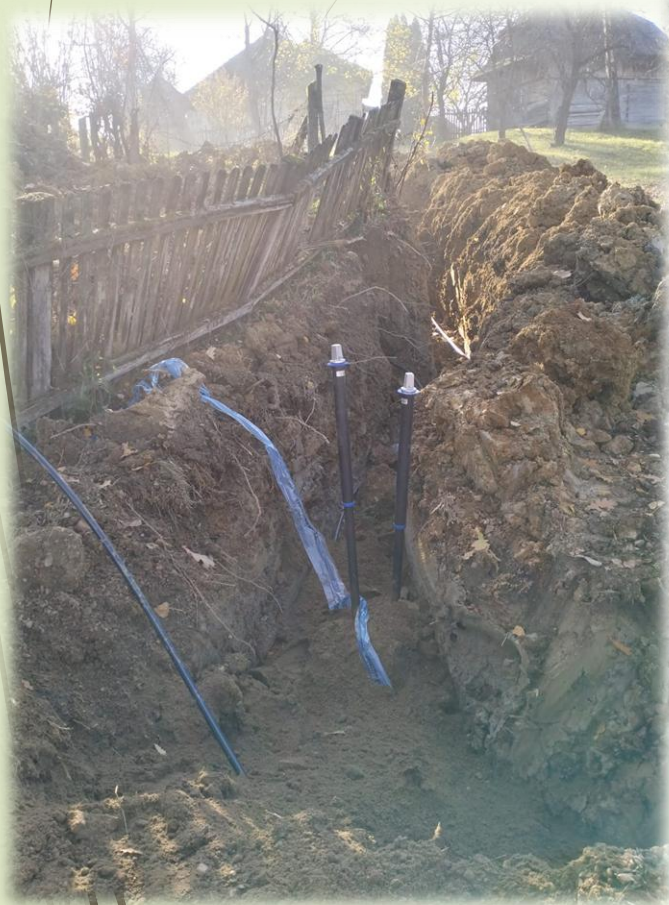



Utilaje pe santier

- Autocamion UMT AMT 125
- Buldoexcavatoare JCB 3CX
- Excavatoare Takeuchi 5T, 9T, 10T
- Bobcat, Dumpere, Camioane 8x4

Total: 32 utilaje asigurate și asigurate conform clauzei 16.2B

Personal pe santier

Nr. Crt	Denumire	Numar
1	Sef Santier	1
2	Ingineri Santier	2
3	Ingineri Topografi	2
4	Sef Echipa	6
5	Muncitori Calificati - Instalatori	6
6	Muncitori Necalificati	36

- Interval orar: 07:30 – 17:30
- Zilele de weekend: fără activitate



Aspecte de protectia mediului.

In perioada raportata nu s-au inregistrat incidente de mediu sau reclamatii, iar toate masurile de prevenire si monitorizare au fost implementate conform Planului de Management al Mediului.

Monitorizarea mediului a fost realizata in mod corespunzator, fara a identifica neconformitati.

Alte aspecte

Probleme constatate (27 note)

Nr.Crt	Data Document	Denumire Document	Strada Vizata	Raspuns
1	15.05.2025	01/ Nota Constatatare	22 - Tautii Magheraus	OUT1230/08.07.2025
2	15.05.2025	02/ Nota Constatatare	23 - Tautii Magheraus	OUT 1100/24.06.2025
3	15.05.2025	03/ Nota Constatatare	Unirii - Recea	nu
4	15.05.2025	04/ Nota Constatatare	Stadionului -Recea	OUT 1101/24.06.2025
5	15.05.2025	05/ Nota Constatatare	Crinilor -Recea	Out 1184/03.07.2025
6	15.05.2025	06/ Nota Constatatare	Daliei - Recea	OUT 1119/25.06.2025
7	02.06.2025	07/ Nota Constatatare	Islazului - Baia Sprie	nu
8	03.06.2025	08/ Nota Constatatare	1 Decembrie - Mocira	OUT 1185/03.07.2025
9	03.06.2025	09/ Nota Constatatare	Stadionului - Mocira	nu
10	03.06.2025	10/ Nota Constatatare	Ghiocailor - Mocira	OUT 1190/03.07.2025
11	03.06.2025	11/ Nota Constatatare	Scolii - Mocira	OUT1185/03.07.2025
12	03.06.2025	12/ Nota Constatatare	67 - Tautii Magheraus	nu
13	03.06.2025	13/ Nota Constatatare	113 - Tautii Magheraus	OUT1268/11.07.2025
14	03.06.2025	14/ Nota Constatatare	114 - Tautii Magheraus	OUT1232/08.07.2025
15	03.06.2025	15/ Nota Constatatare	133A - Tautii Magheraus	OUT1233/08.07.2025
16	03.06.2025	16/ Nota Constatatare	133B - Tautii Magheraus	OUT1234/08.07.2025
17	03.06.2025	17/ Nota Constatatare	57 - Tautii Magheraus	OUT1269/11.07.2025
18	03.06.2025	18/ Nota Constatatare	58 - Tautii Magheraus	OUT1270/11.07.2025
19	03.06.2025	19/ Nota Constatatare	26 - Tautii Magheraus	OUT1271/11.07.2025
20	04.08.2025	20/Nota Constatatare	Aleea Minerilor -Baia Sprie	OUT1911/02.10.2025
21	05.08.2025	21/Nota Constatatare	str. Decebal - Baia Sprie	OUT1911/02.10.2025
22	14.08.2025	22/Nota Constatatare	str. Mihai Eminescu	
23	14.08.2025	23/Nota Constatatare	str. Gordanului - Baia Sprie	
24	21.08.2025	24/Nota Constatatare	str. Pietrarului - Baia Sprie	
25	21.08.2025	25/Nota Constatatare	str. Garii - Baia Sprie	
26	22.08.2025	26/Nota Constatatare	str. Magnoliei - ext apa Baia Sprie	
27	22.08.2025	27/Nota Constatatare	str. Magnoliei - ext canal Baia Sprie	

Revendicari

NR. CRT	Adresa	Subiect	Raspuns
1	MM01VTL24-XLVII-370 din 05.09.2025	Notificare de revendicare nr. 1 - Aleea Minerilor si Decebal - Baia Sprie.	OUT1927/03.10.2025 - Respingere Notificare de revendicare nr.1 Aleea Minerilor si Decebal
2	MM01VTL24-XLVII-416 din 14.10.2025	Dezacord și solicitare reanalizare adresă OUT 1927 din 03.10.2025- Respingere Notificare de revendicare nr. 1.	
3	MM01VTL24-XLVII-437 din 31.10.2025	Notificare de revendicare nr 2 - Aleea Minerilor si Decebal - Baia Sprie	
4	MM01VTL24-XLVII-497 din 28.11.2025	Revendicare nr.2 – interimară I – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie, lista D-2.2-1 - Reabilitare rețea canalizare Aleea Minerilor și D-2.2-3 – Reabilitare rețea canalizare strada Decebal.	
5	MM01VTL24-XLVII-566 din 29.12.2025	Revendicare nr.2 – interimară II – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie.	
