



Sedinta lunara de progres OCTOMBRIE 2026

**PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES
SMIS+ 322218**

**MM-CL-10 „ Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus,
Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte ”**

MM-CL-10 „Rețele de apă și apă uzată: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte”

• 1. DETALII CONTRACT

- Contract nr. 196/28.07.2025 MM-CL-10 „Rețele de apă și apă uzată: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte”
- Program
 - « Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Maramureș », finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021 - 2027
- Contractor
 - ***Asocierea PRODEXIMP SRL – ALAVAL PROD COM SRL – DACIA ASPHALT SRL***
- Valoarea Contractului LEI
 - **175.247.779,82 lei (fără TVA)**
- Data acordului
 - **28.07.2025**
- Autorizație de construire
 - **Nr. 37 din 26.09.2025**
- Autorizație de construire organizare de șantier
 - **UAT Viseu de Sus – Nr. 2 din 30.01.2026**
 - **UAT Bocicoiu Mare – Nr. 3 din 28.01.2026**
 - **UAT Poienile de Sub Munte – Nr. 1 din 12.02.2026**
- Durata contractului:
 - **30 LUNI**
- Perioada de garanție
 - **36 LUNI**

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPER AFERENTE
LUCRARILOR nr. 1 / 27.02.2026; nr. 4 / 30.03.2026 ; nr. 8 / 14.05.2026 ; nr. 9 / 27.05.2026 ; nr.11 /
15.07.2026

• OBIECTIV 1:

- Reabilitare conducta de transport apa potabile – L = 676 m;
- Extindere conducta de transport apa potabile – L = 5.202 m;
- Reabilitare retea de distributie apa potabile – L = 1.595 m;
- Extindere retea de distributie apa potabile – L = 20.570 m;
- Extindere statii de pompare apa potabile – L = 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA1 (existenta) – Str. Aurel Vlaicu: reabilitare rezervor inmagazinare 1.000 m² – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA2 (noua) – Str. Frasinului: rezervor nou inmagazinare 250 m² – 1 buc. si statie noua clorinare – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA3 (noua) – Str. 1 Mai: statie noua de pompare Qp = 5 l/s, Hp = 200 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon – 150m² – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA4 (noua) – Str. Randunelelor (DN18): statie noua pompare Qp = 5 l/s, Hp = 60 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon 150 m² – 1 buc. si statie noua de clorinare - 1 buc.
- Front de captare existent: reabilitare rezervor 150 m³, reabilitare rezervor de inmagazinare 150 m³ = 1 buc.

• OBIECTIV 2:

- Extindere retea canalizare – L = 9.417 m;
- Extindere statii de pompare apa uzata si conducte de refulare apa uzata - 8 buc. SPAU, L = 1.641 m

• **PROGRES FIZIC**

WISEU DE SUS

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate)
UAT WISEU DE SUS						
Obiect VS-1 REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN LOCALITATEA WISEU DE SUS						
VS-1.3 Reabilitare retea de distributie apa potabila		Conform contract				
1	Str. Branduselor 1 Tr 1	157	110	157	0	
2	Str. Branduselor 2 Tr 1	244	110	135	24.5	
3	Str. Mierlei4 Tr 1	124	110	123	0	
4	Str. Zavoi Tr 1	94	110	90	0	
5	Str. Paraului Tr 1	186	110	133	0	
TOTAL				638	25	
VS-1.4 Extindere retea distributie apa potabila		Conform contract				
1	Str. Valea Raului TRONSON 3	374	110	201	0	
2	Str. Valea Raului TRONSON 4	178	110	399	0	
3	Str. Valea Raului TRONSON 5	400	110	400	0	
4	Str. Valea Raului TRONSON 6	311	110	311	0	
5	Str. Valea Raului TRONSON 6_1	178	110	178	0	
6	Str. Valea Raului TRONSON 6_2	263	110	263	0	
7	Str. Valea Raului TRONSON 7	394	110	394	0	
8	Str. Valea Raului TRONSON 8	374	110	374	0	
9	Str. Valea Raului TRONSON 9	390	110	390	0	
10	Str. Valea Raului TRONSON 10	394	110	337	0	
11	Str. Mierlei 5 TRONSON 1	96	110	96	0	
12	Str. Mierlei 11 TRONSON 1	293	110	272	0	
13	Str. Valea Scardei TRONSON 1	365	110	286	0	
14	Str. Borcutului TRONSON 1	376	110	291	0	
15	Str. Borcutului TRONSON 2	386	110	386	0	
16	Str. Borcutului TRONSON 3	380	110	380	0	
17	Str. Borcutului TRONSON 4	380	110	380	0	
18	Str. Borcutului TRONSON 5	298	110	298	0	
19	Str Borcutului TRONSON 6	198	110	198	0	
20	Str Frasinului Tronson 1	346	110	346	0	
21	Str Frasinului Tronson 1_1	110	110	110	0	
22	Str Frasinului Tronson 2	216	110	216	0	
22	Str. Taului Tr 1	393	110	0	230	
22	Str. Taului Tr 2_1	182	110	0	80	
TOTAL				6,506	310	

• **PROGRES FIZIC**



WISEU DE SUS

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diamentru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate
----------	-----------------	-------------	----------------	--	---------------------------------------	---

Obiect VS-2 REABILITAREA SI EXTINDEREA REZELEI DE APA UZATA DIN LOCALITATEA WISEU DE SUS						
VS-2.1 Extindere retea de canalizare		Conform contract				
1	Str. Mierlei 2 Tr 3	73	250	26	0	
2	Str. Zavoi Tr 1	175	250	119	0	
3	Str. Branduselor Tr1	143	250	109	25	
4	Str. Mierlei 4 Tr 1	286	250	255	0	
5	Str. Mierlei 5 Tr 1	96	250	96	0	
6	Str. Paraului Tr 1	188	250	140	0	
7	Str. Mierlei 13 Tr 1	134	250	130	0	
8	Str. Mierlei 14 Tr2	144	250	139	0	
9	Str. Mierlei 14 Tr1	46	250	46	0	
10	Str. Nuferilor Tr1	182	250	63	52	
11	Str. Nuferilor Tr2	126	250	126	25	
12	Str. Mierlei 15 Tr.2	190	250	0	124	
TOTAL				1249	226	
VS-2.2.2 Extindere statii de pompare apa uzata		Conform contract				
1	SPAU 6 (str. Branduselor 2 TR1) str. Zavoi	174	90	174	24	
2	SPAU 8 (str. Mierlei 11)	300	140	280	0	
TOTAL				454	24	

**Lucrari finalizate partial –
starda Mierlei 4 + lucrari
anificate strada Taului – luna
octombrie 2026**

WISEU DE SUS
**Retele distributie reabilitare
apa**

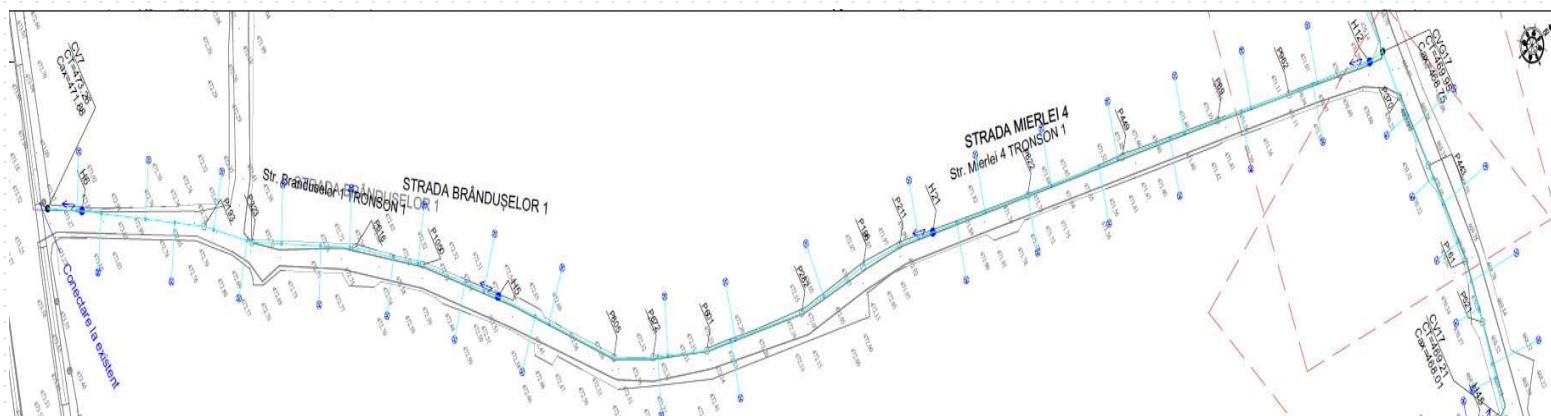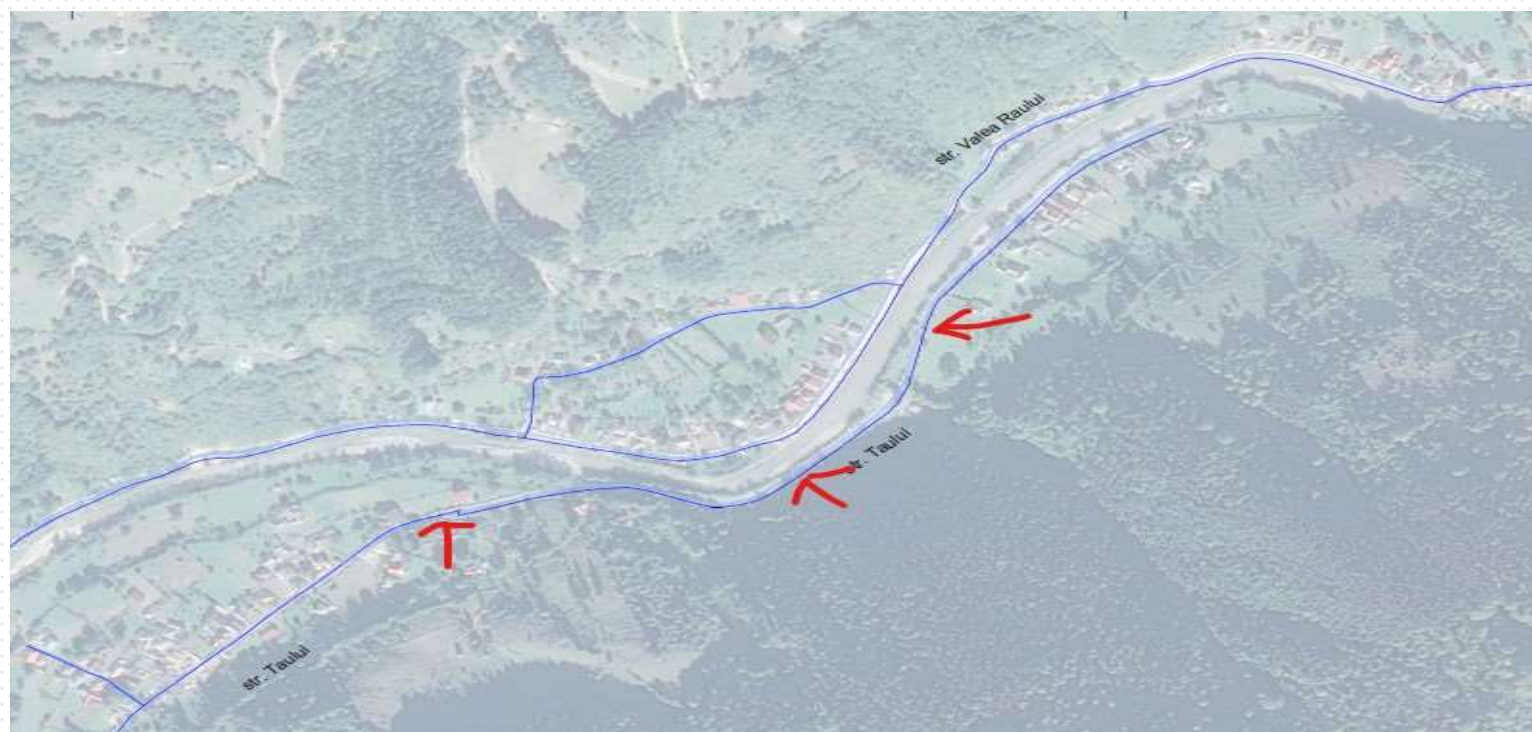

*Lucrari aflate
in executie si zone planificate
pe luna octombrie 2026*

WISEU DE SUS
*Retele distributie extindere
apa*



Lucrari finalizate


WISEU DE SUS

**Retea distributie extindere
apa – strada Valea Raului ,
de la Tr 3 – pana la Tr 10**




**Lucrari finalizate partial si
afalate in executie**

VISEU DE SUS
Retele apa uzata

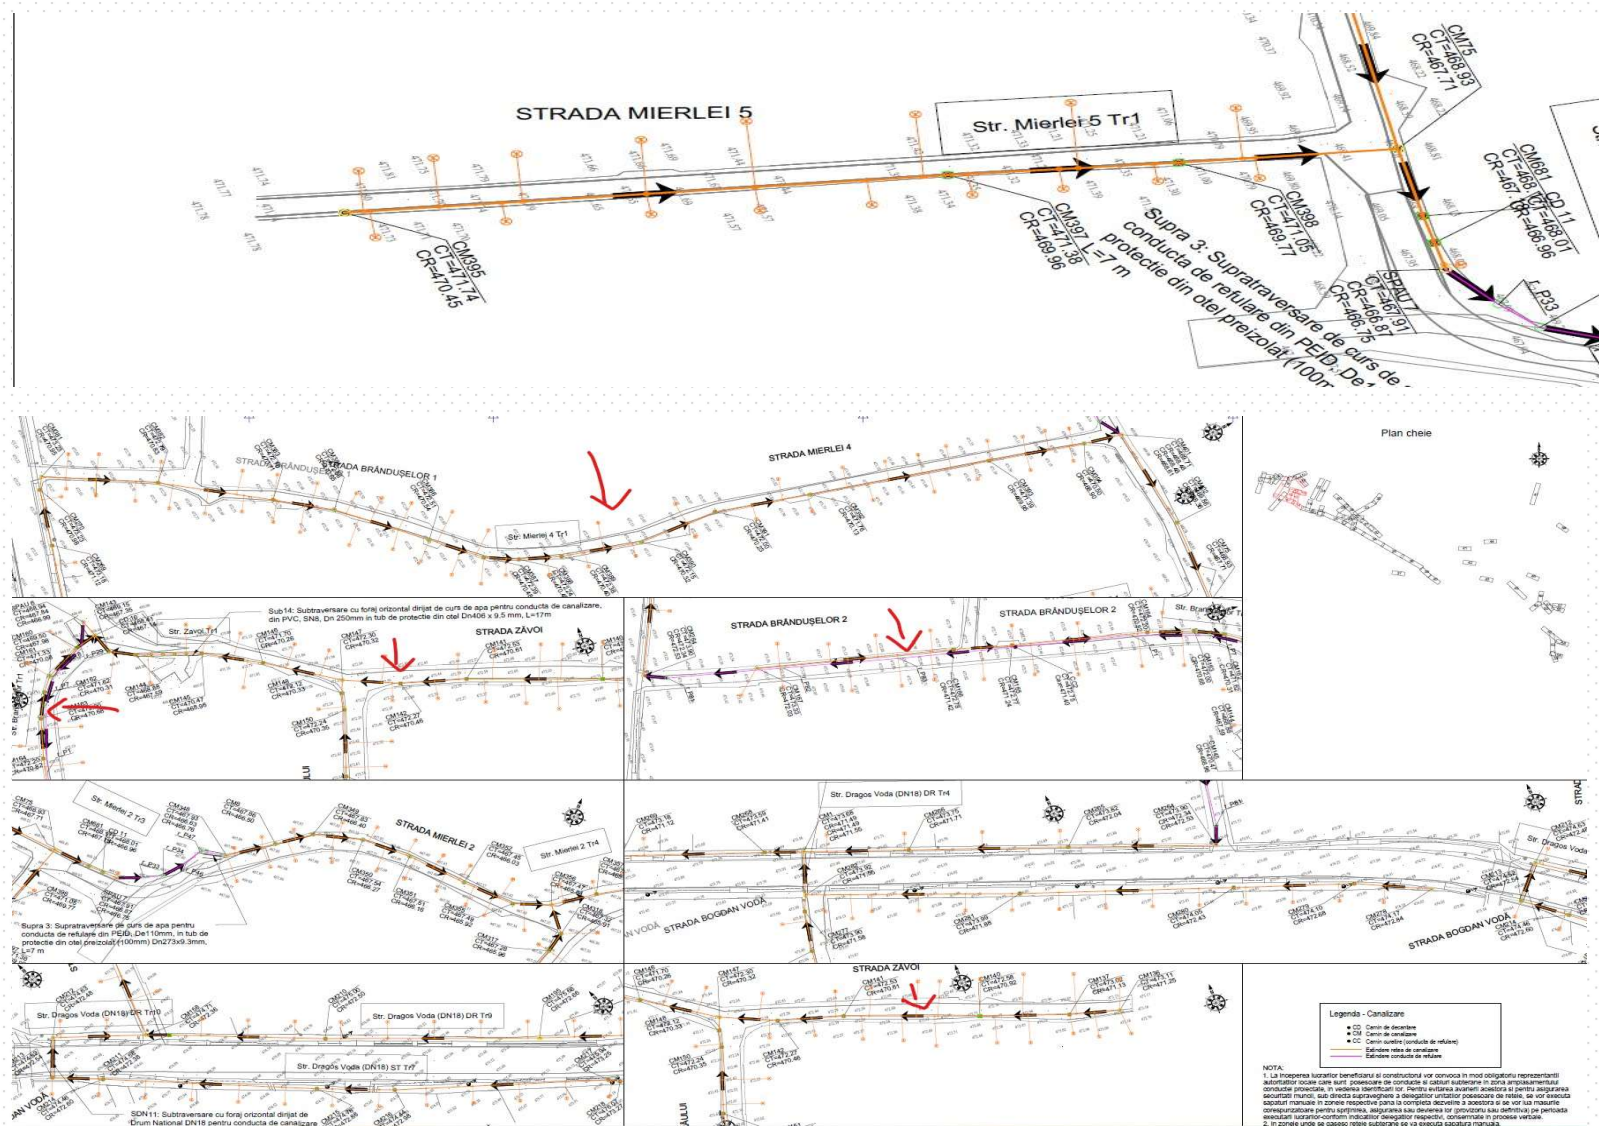

*Lucrari finalizate conducta
refulare – Mierlei 11 si lucrari
afalate in executie + propuse
pentru luna octombrie 2026 –
Mierlei 15*

WISEU DE SUS
Retele apa uzata

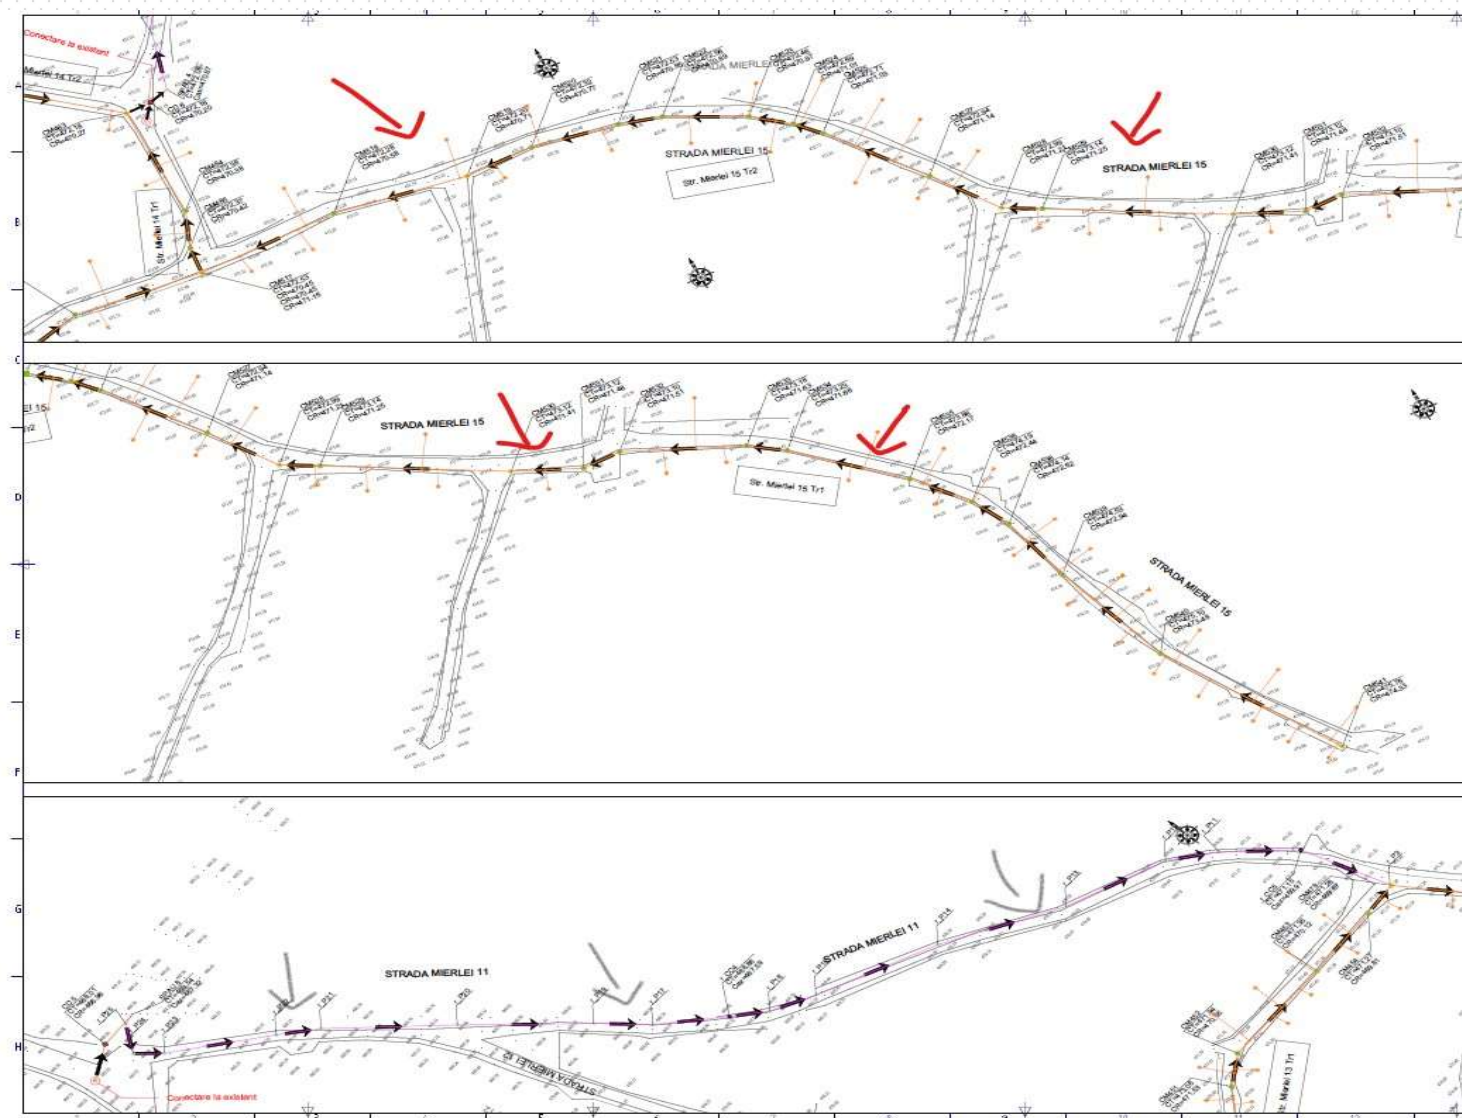

**PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPER
AFERENTE LUCRARILOR nr. 2/02.03.2026, nr. 5 / 06.04.2026 ; nr. 7 / 07.05.2026 ; nr. 12 / 07.08.2026
si nr. 12 / 21.08.2026**

- **OBIECTIV 1:**
 - Extindere retea de distributie – L = 31.773 m;
 - Statie de pompare GA Craciunesti – 1 buc.;
 - Gospodaria de apa: rezervor nou de inmagazinare 500 m³ – 2 buc.;
 - Statie noua de clorinare – 1 buc.;
 - Conducta de transport apa potabile – L = 3.201 m;
- **OBIECTIV 2:**
 - Extinderea sistemului de apa uzata – L = 23.486 m;
- **OBIECTIV 3:**
 - Statie de pompare apa uzata SPAU 1 – 1 buc.;
 - Statie de pompare apa uzata SPAU 2 – 1 buc.;
 - Statie de pompare apa uzata SPAU 3 – 1 buc.;
 - Statie de pompare apa uzata SPAU 4 – 1 buc.;
 - Statie de pompare apa uzata SPAU 5 – 1 buc.;
- **OBIECTIV 4:**
 - Conducta refulare SPAU 1 – Lref = 676 m;
 - Conducta refulare SPAU 2 – Lref = 637 m;
 - Conducta refulare SPAU 3 – Lref = 637 m;
 - Conducta refulare SPAU 4 – Lref = 637 m;
 - Conducta refulare SPAU 5 – Lref = 637 m;

• **PROGRES FIZIC**

BOCICOIU MARE

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate)
UAT Bocicoiu Mare						
Obiect 1: EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN BOCICOIU MARE						
1	Str. Tisa 1	1607	110	1157	450	
2	Str. Tisa 2	176	110	166	0	
3	Str. Tisa 3	301	110	297	0	
4	Str. Tisa 4	114	110	114	0	
5	Str. Tisa 5	152	110	152	0	
6	Str. Tisa 7	361	110	361	0	
7	Str. Tisa 10	1106	110	520	0	
8	Str. Lunca 1	112	110	100	0	
9	Str. Lunca 2	115	110	110	0	
10	Str. Lunca 3	59	110	55	0	
11	Str. Lunca 4	373	110	370	0	
12	Str. Lunca 5	161	110	160	0	
13	Str. Lunca 6	439	110	430	0	
14	Str. Lunca 7	223	110	218	0	
15	Str. Lunca 8	95	110	90	0	
16	Str. Principala Lunca la Tisa Dj185dr	1678	110	1348	0	
17	Str. Craciunesti 1	1146	110	1100	0	
18	Str. Craciunesti 2	98	110	98	0	
19	Str. Craciunesti 4	1433	110	1335	50	
20	Str. Craciunesti 6	123	110	113	0	
21	Str. Craciunesti 7	910	110	760	0	
22	Str. Craciunesti 8	125	110	120	0	
23	Str. Craciunesti 9	848	110	840	0	
24	Str. Craciunesti 10	323	110	90	0	
25	Str. Craciunesti 11	91	110	0	50	
26	Str. Craciunesti 12	327	110	302	25	
27	Str. Craciunesti 0 Rezevor	1006	180	576	0	
28	Str. Principala Craciunesti Dj185stg	1311	160	1211	0	
29	Str. Principala Craciunesti Dj185dr	800	110	1261	0	
30	Str. Bocicoiu 2	370	110	330	0	
31	Str. Principala Bocicoiu Dj185dr	1704	110	789	0	
32	Str. Principala Bocicoiu Dj185stg	2892	140	462	0	
33	Conducta de transport apa potabila in Boci	3201	160 - 180	1170	0	
TOTAL				16205	575	


• **PROGRES FIZIC**

BOCICOIU MARE

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate)
Obiect 2: EXTINDEREA SISTEMULUI DE APA UZATA IN BOCICOIU MARE						
1	Str. Tisa 1	1730	250	1707	0	
2	Str. Tisa 2	143	250	144	0	
3	Str. Tisa 3	264	250	264	0	
4	Str. Tisa 4	162	250	162	0	
5	Str. Tisa 5	112	250	112	0	
6	Str. Tisa 6	350	250	350	0	
7	Str. Tisa 7	360	250	360	0	
8	Str. Tisa 10	814	250	200	0	
9	Str. Tisa 11	428	250	200	0	
10	Str. Principala Tisa DN18 stg - 315	2154	315	0	150	
11	Str. Craciunesti 1	1290	250	1106	0	
12	Str. Craciunesti 2	86	250	86	0	
13	Str. Craciunesti 4	1534	250	1524	0	
14	Str. Craciunesti 5	357	250	357	0	
15	Str. Craciunesti 6	127	250	120	0	
16	Str. Craciunesti 7	856	250	824	0	
17	Str. Craciunesti 8	117	250	112	0	
18	Str. Craciunesti 9	788	250	788	0	
19	Str. Craciunesti 10	275	250	275	0	
20	Str. Craciunesti 11	92	250	0	50	
21	Str. Craciunesti 12	296	250	302	0	
22	Str. Principala Craciunesti DJ185 stg	1279	250	1279	0	
23	Str. Principala Bocicoiu Mare Dj185 stg	2247	250	928	290	
24	Str. Principala Craciunesti DJ185dr	1248	250	1190	0	
25	Str. Principala Bocicoiu Mare Dj185dr	1159	250	694	0	
26	Str. Bocicoiu 2	324	250	274	0	
TOTAL				13358	490	
Obiect 4: CONDUCTE REFULARE SPAU IN BOCICOIU MARE						
1	Conducta Refulare SPAU 4	790	90	1150	0	
2	Conducta Refulare SPAU 3	491	90	470	0	
3	Conducta Refulare SPAU 2	637	110	290	0	
4	Conducta Refulare SPAU 1	676	90	442	0	
TOTAL				2352	0	


**Lucrari finalizate partial si
aflate in executie
Tisa 1**

**BOCICOIU MARE
Apa**

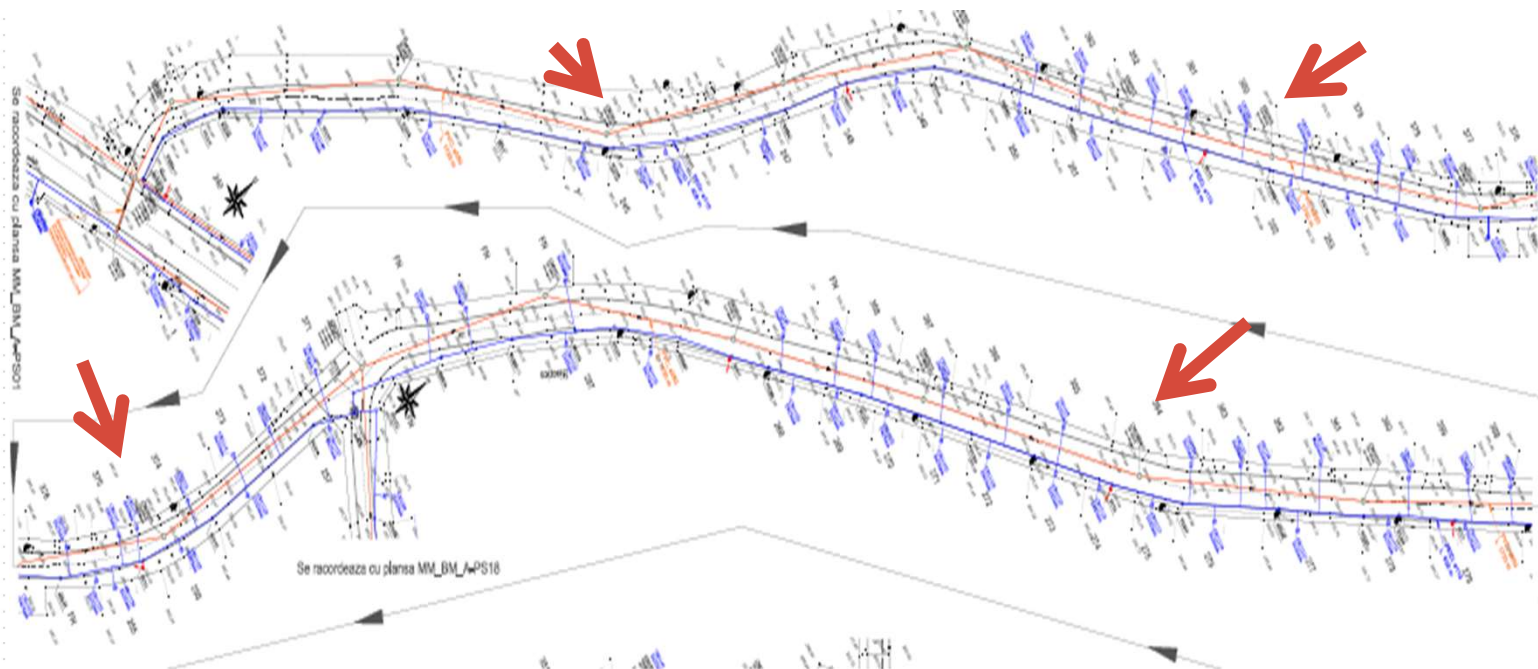


**Lucrari aflate
in executie
Craciunesti 4**

BOCICOIU MARE
Apa

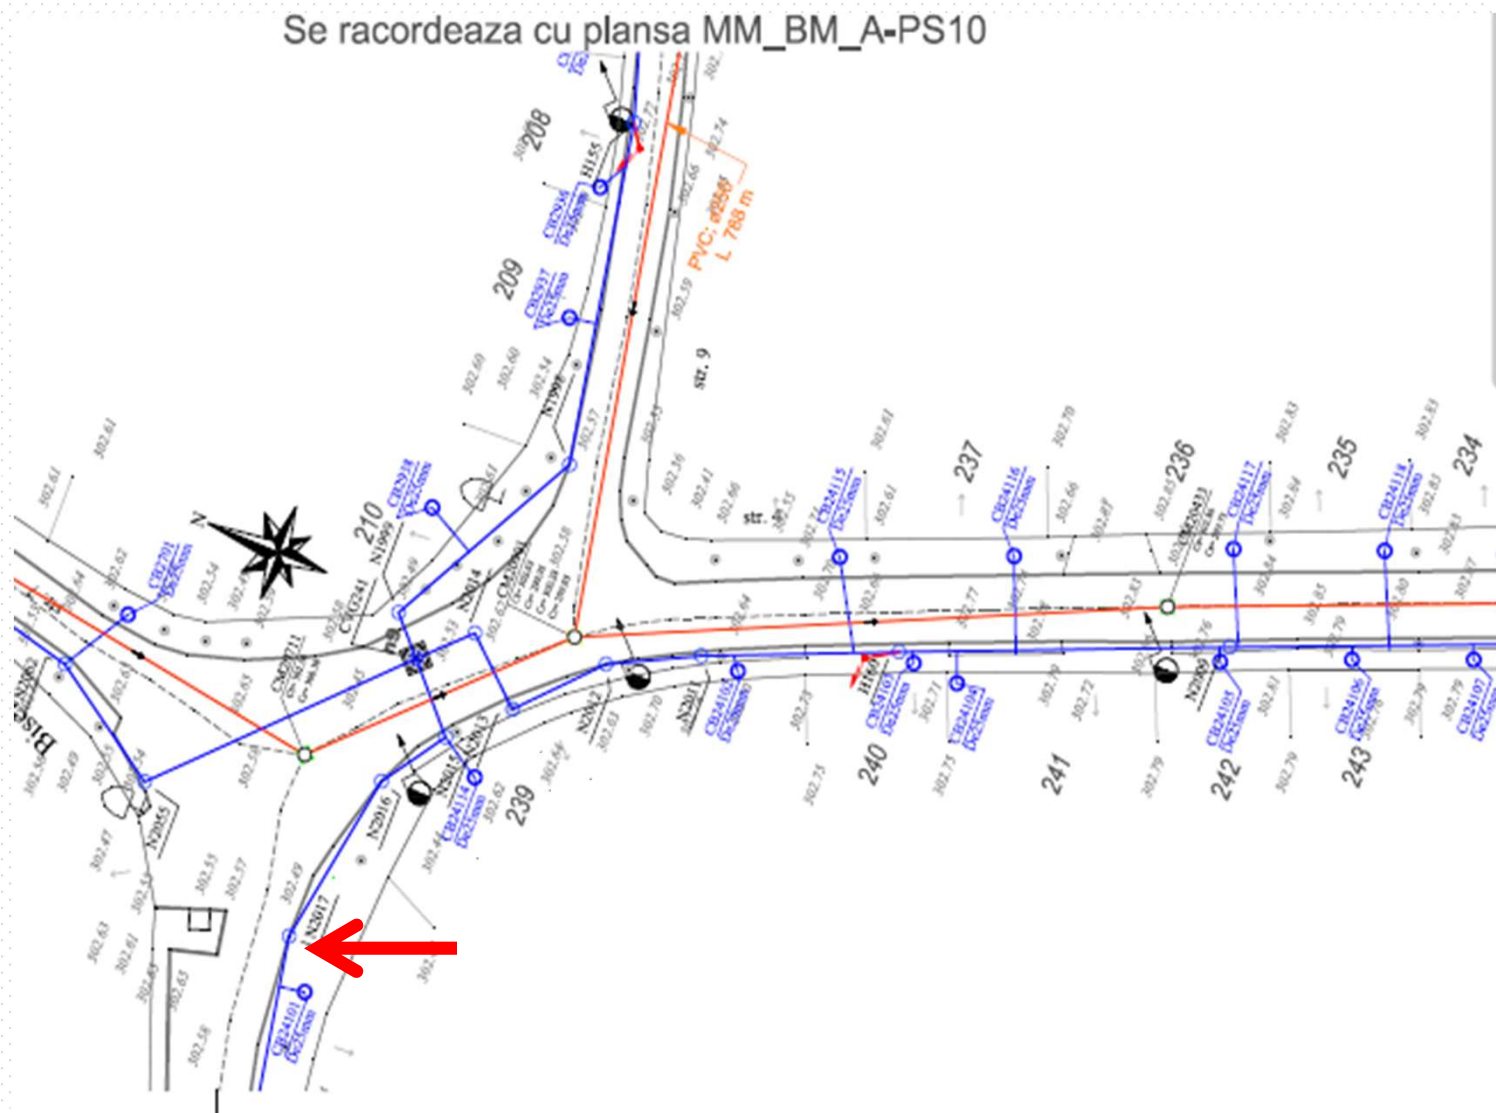


Lucrari finalizate partial si
aflate
in executie
Craciunesti 11

BOCICOIU MARE
Apa

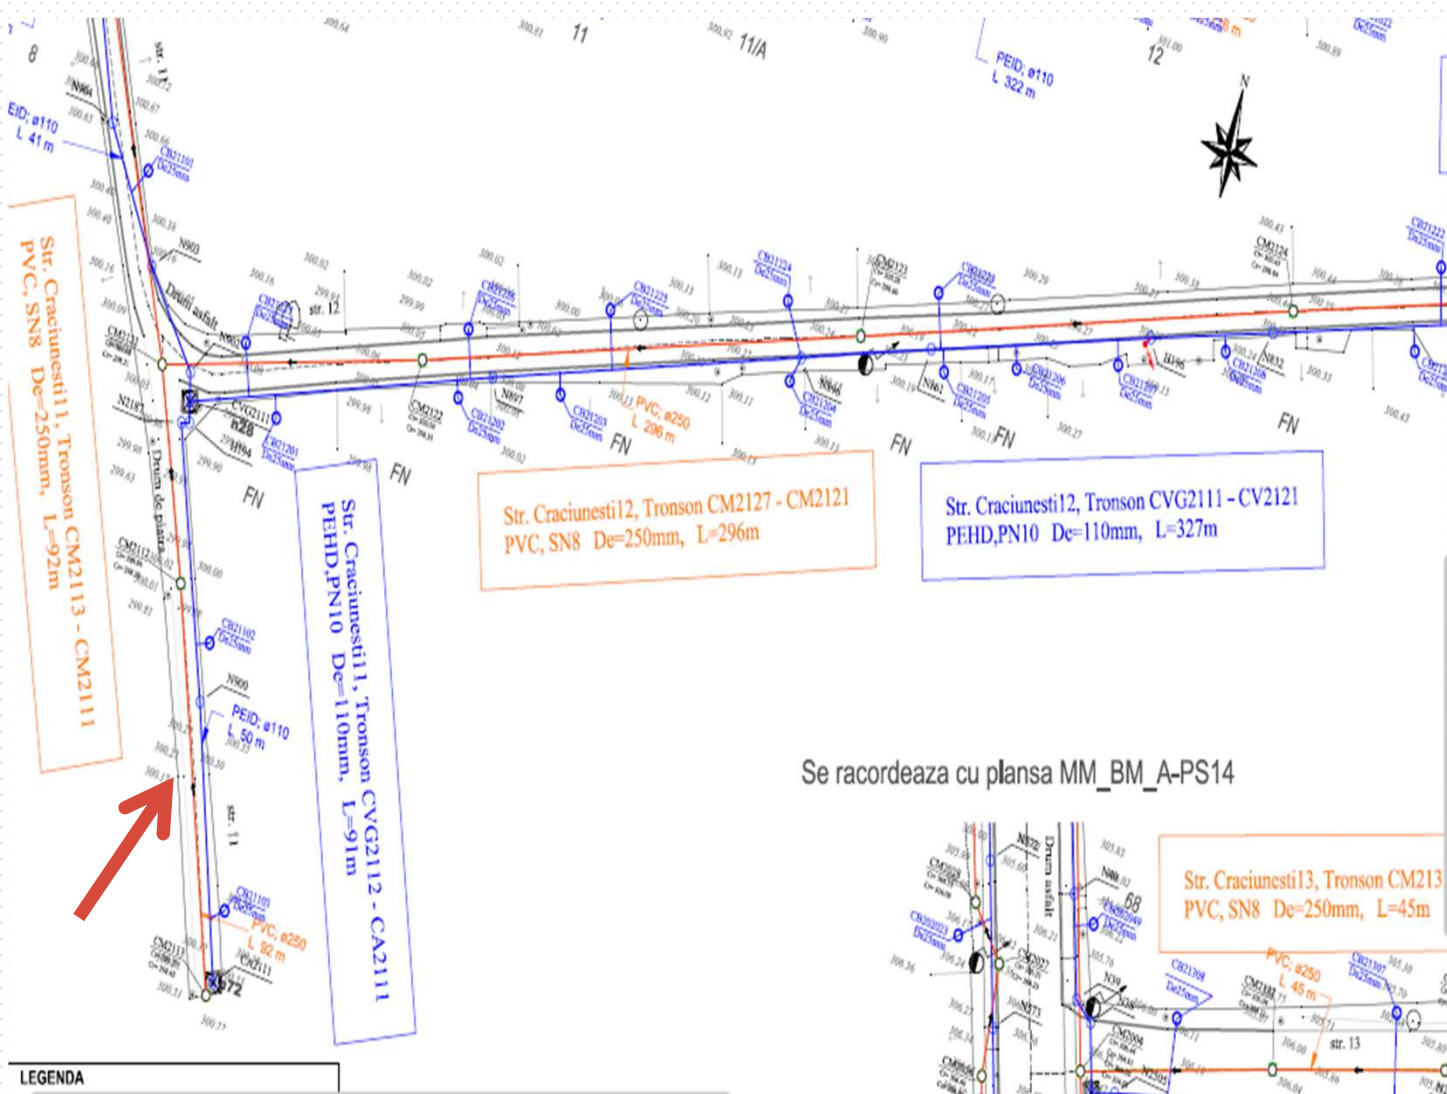


Se racordeaza cu plansa MM_BM_A-PS14




Lucrari finalizate partial
afla
in execut
Craciunesti 1

BOCICOIU MAR
Ap




Lucrari finalizate partial
afla
in execut
Craciunesti 1

BOCICOIU MAR
Ap

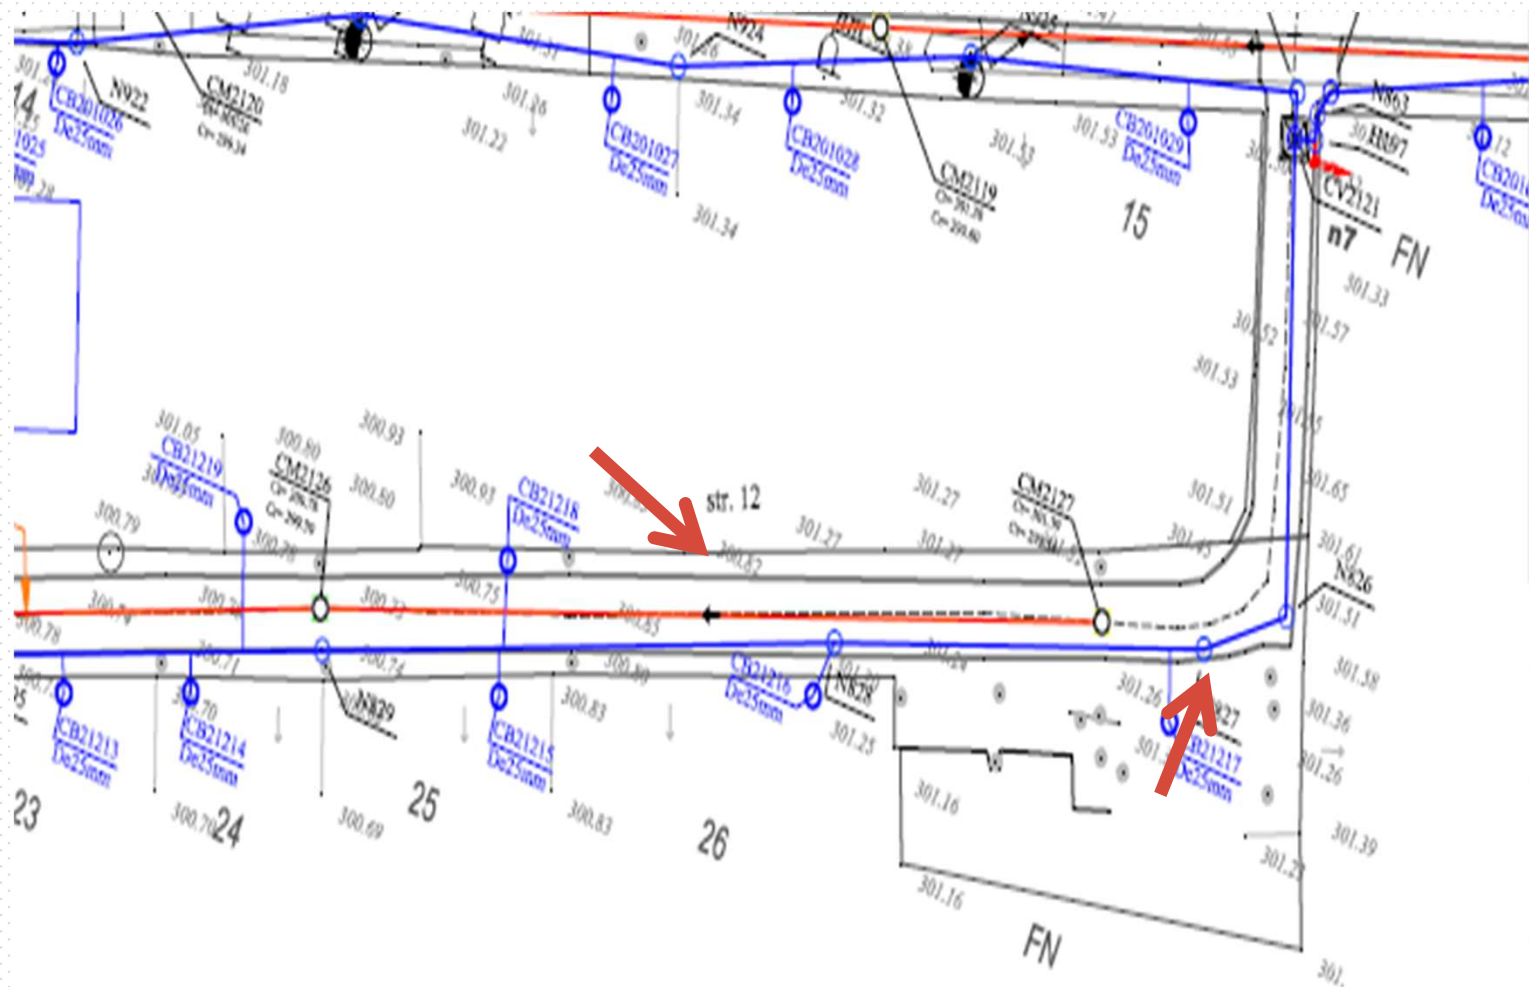

**Lucrari aflate
in executie
Str. Principala Tisa DN
18(stg)**


**BOCICOIU MARE
Apa uzata**

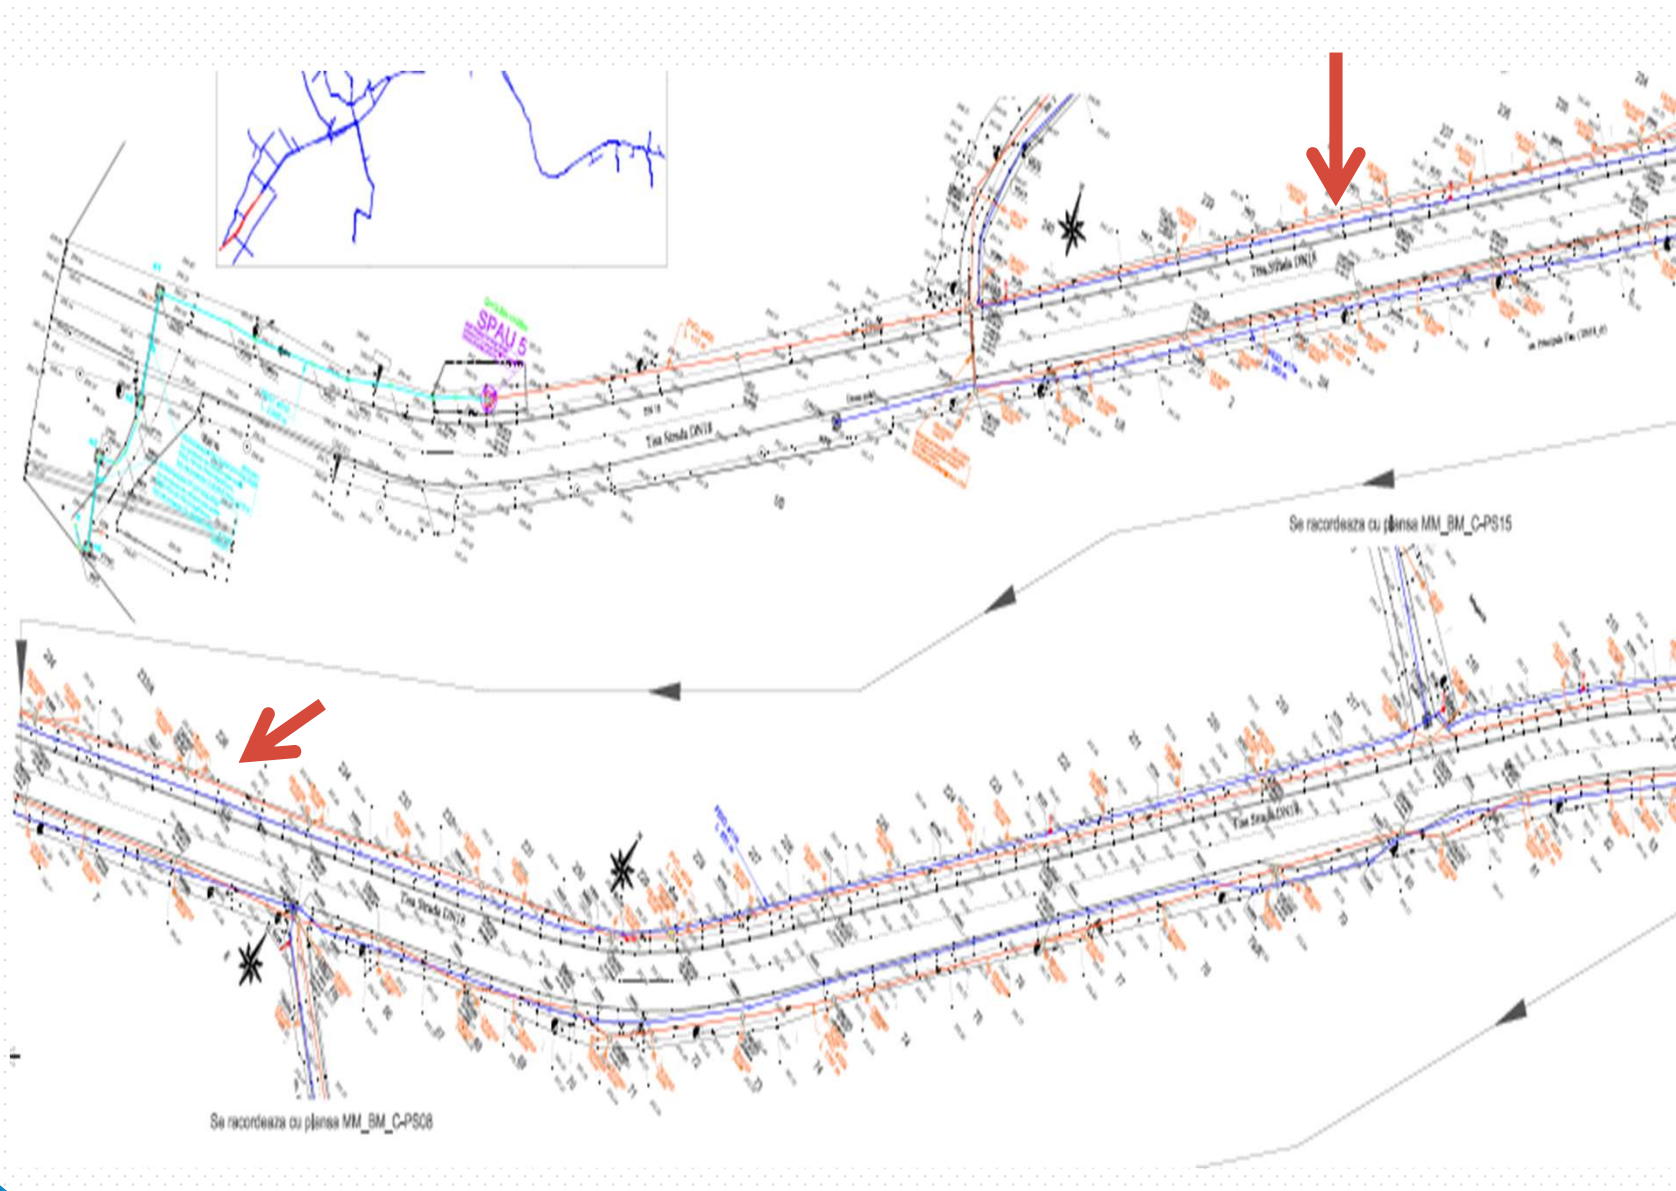

Lucrari finalizate partial si
aflate
in executie

Craciunesti 11


BOCICOIU MARE
Apa uzata

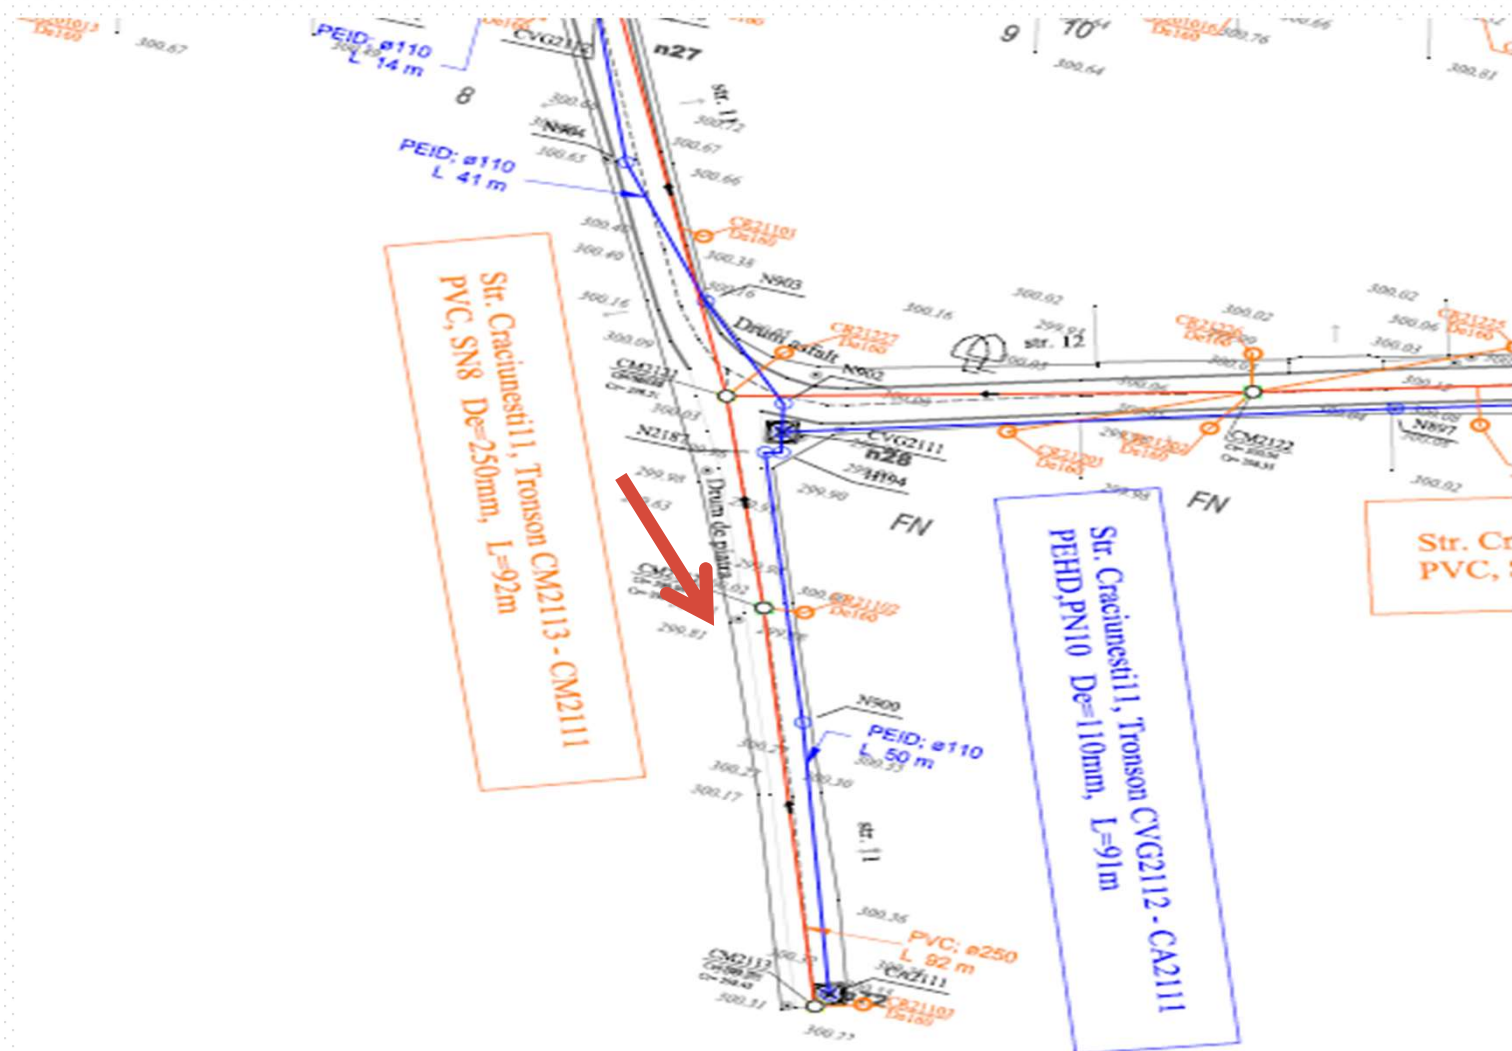


*Lucrari finalizate
partial si aflate
in executie*

**Str. Principala
Bocicoiu Mare
DJ185(stg)**

**BOCICOIU MARE
Apa uzata**

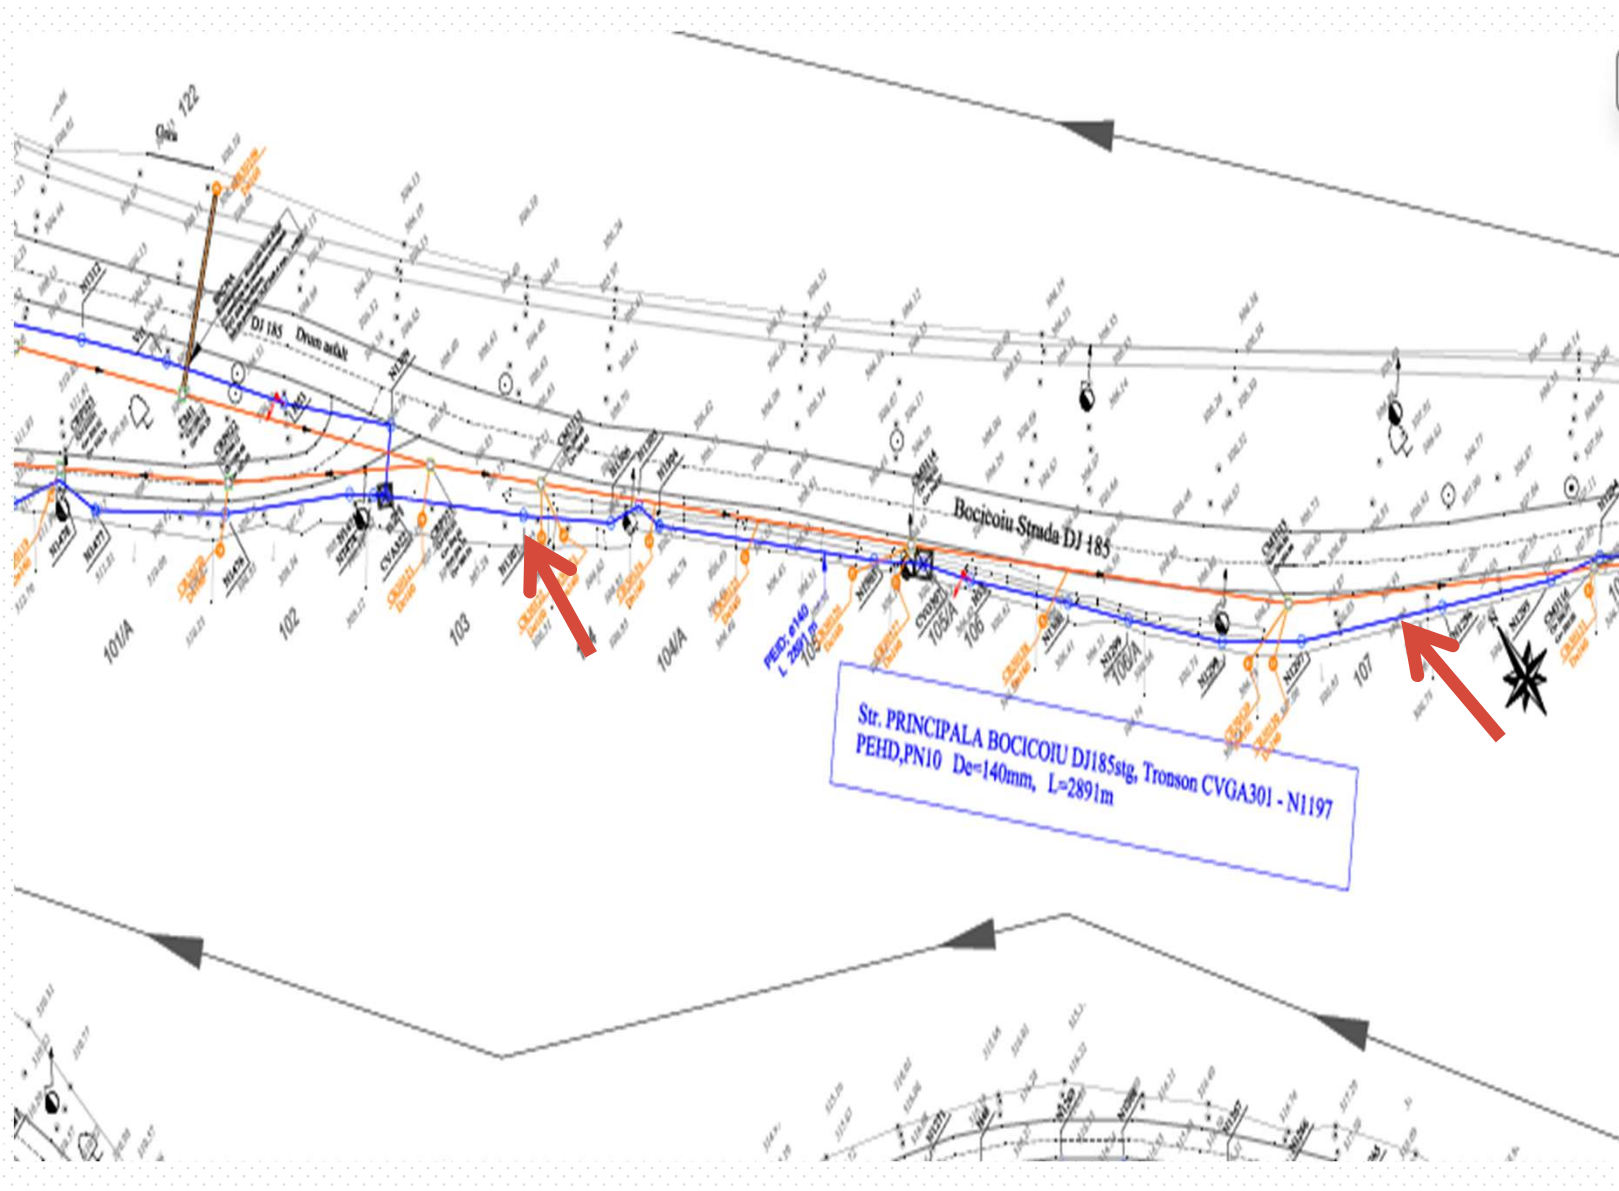



POIENILE DE SUB MUNTE

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPER AFERENTE LUCRARILOR nr. 3 / 03.03.2026, nr. 6 / 29.04.2026 si nr.10 / 22.06.2026

- OBIECTIV 1:
 - Extinderea retelei de distributie apa potabile – L = 25.119 m;
 - Statii de pompare apa potabila – 2 buc.;
 - Bransamente de retea de distributie existente: 2.910 buc.
- OBIECTIV 2:
 - Extinderea retelei de colectare apa uzata – L = 21.492 m;
 - Statii de pompare ape uzate – 6 buc.;
 - Conducte de refulare SPAU – L = 914 m;

• **PROGRES FIZIC**
POIENILE DE SUB
MUNTE

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata raportata anterior (m)	Lungime executata in luna curenta (m)	Documente care atesta finalizarea (PVRT/PV de aducere la starea initiala/probe presiune-etanseitate)
----------	-----------------	-------------	---------------	--	---------------------------------------	--

UAT POIENILE DE SUB MUNTE

PDSM-2.1: Extinderea retelei de alimentare cu apa din localitatea Poienile de Sub Munte

1	Str. Zarica	1576	110	1102	244	
2	Str. Potocina	169	110	168	0	
3	Str. Chelemancic	286	110	270	0	
4	Str. Paniana	1800	110, 125, 160	879	921	
5	Str. Capletea	127	110	110	0	
6	Str. Berdane	217	110	217	0	
7	Str. Dupa Biserica	858	110	718	150	
8	Str. Bisericii	725	110,140	234	220	
9	Str. Nejni Crai	2668	63,110,125	222	81	
10	Str. Pasisnei	3658	63,110,125	70	1467	
11	Str. Azil	363	110	0	343	
12	Str. Tarhovita	366	110	0	326	
13	Str. Garii	1594	125,140	0	100	
14	Str. Zacvasnita	1990	125,140,160	0	150	
TOTAL				3,990	4,002	


Obiect PDSM-2 EXTINDEREA RETELEI DE COLECTARE APA UZATA APA DIN LOCALITATEA POIENILE DE SUB MUNTE

PDSM-2.2: Extinderea retelei de colectare apa uzata din localitatea Poienile de Sub Munte

1	Str. Potocina	147	250	147	0	
2	Str. Chelemancic	283	250	272	0	
3	Str. Paniana	1647	250,315	1255	11	
4	Str. Capletea	105	250	105	0	
5	Str. Berdane	185	250	78	0	
6	Str. Nejni Crai	3417,01	250,315,400	372	0	
7	Str. Dupa Biserica	888	250	1098	0	
8	Str. Bisericii	1911	250	372	0	
9	Str. Azil	222,01	250	201	0	
10	Str. Tarhovita	342	315	0	300	
11	Str. Garii	1827	250,315	0	140	
12	Str. Zacvasnita	2182	250,315		150	
TOTAL				3900	601	


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Zarica*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

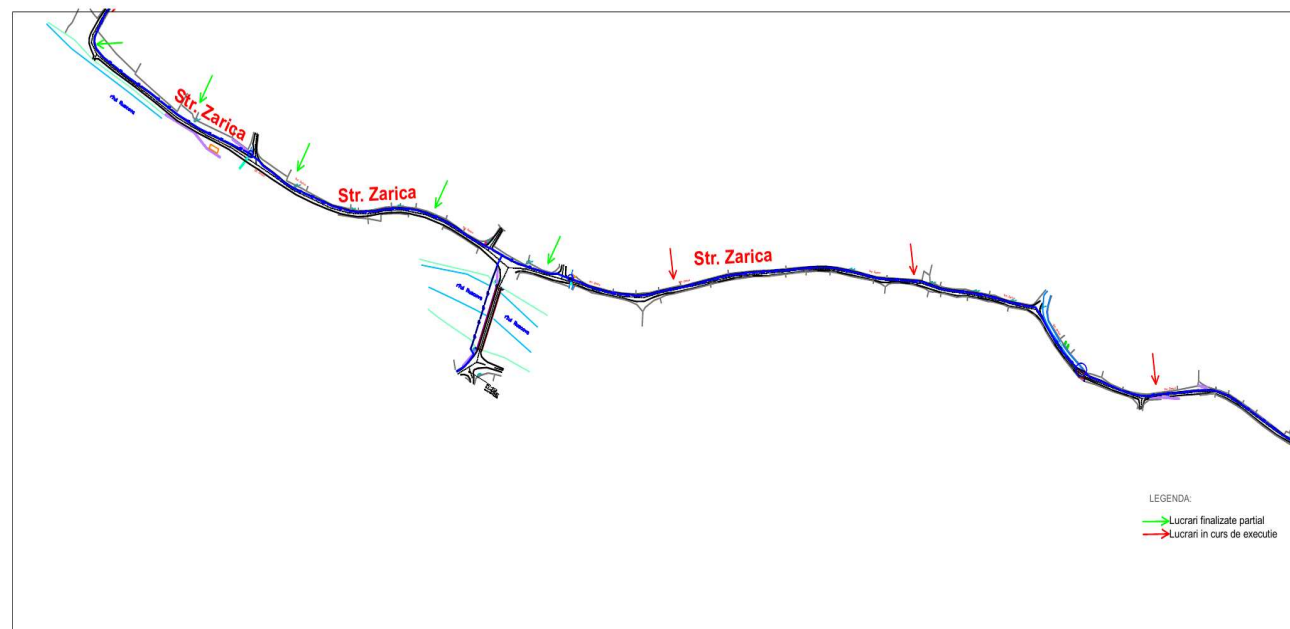


*Lucrari aflate
in executie*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

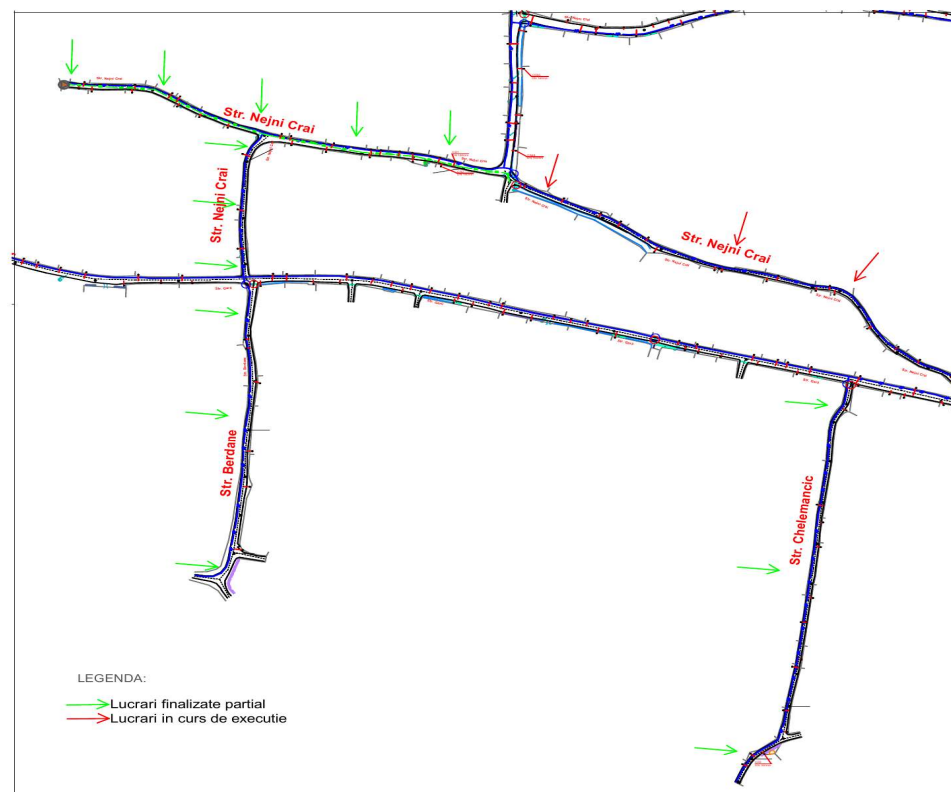


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Bisericii si Dupa
Biserica*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

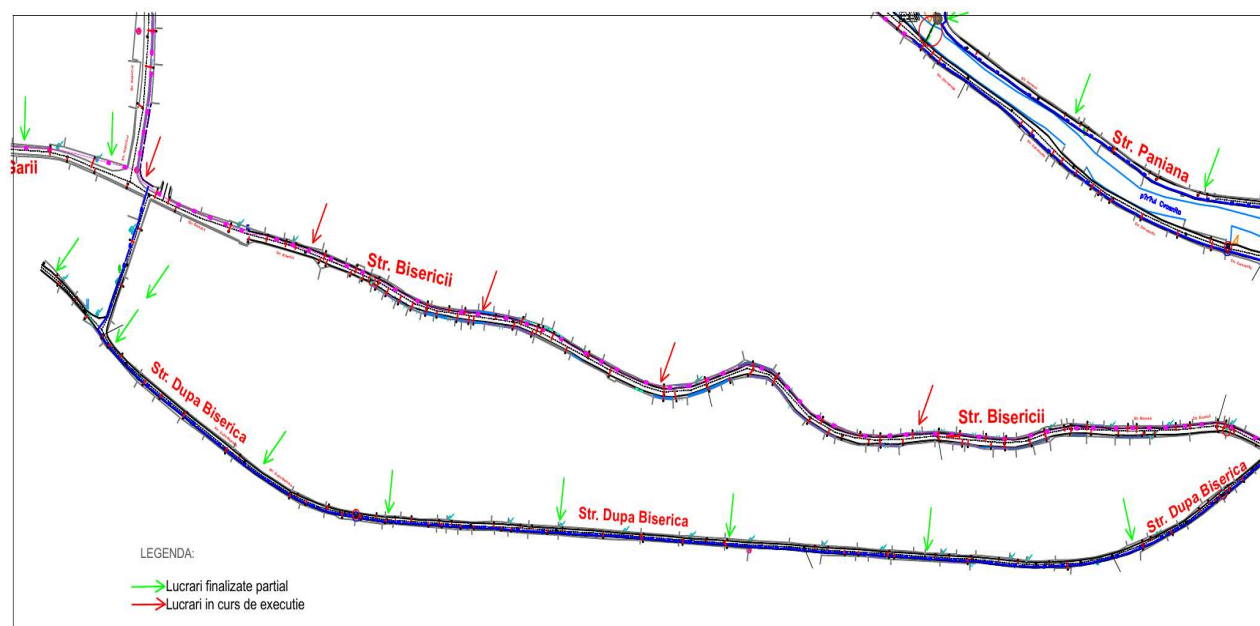


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Zagvasnita si str.
Bisericii*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

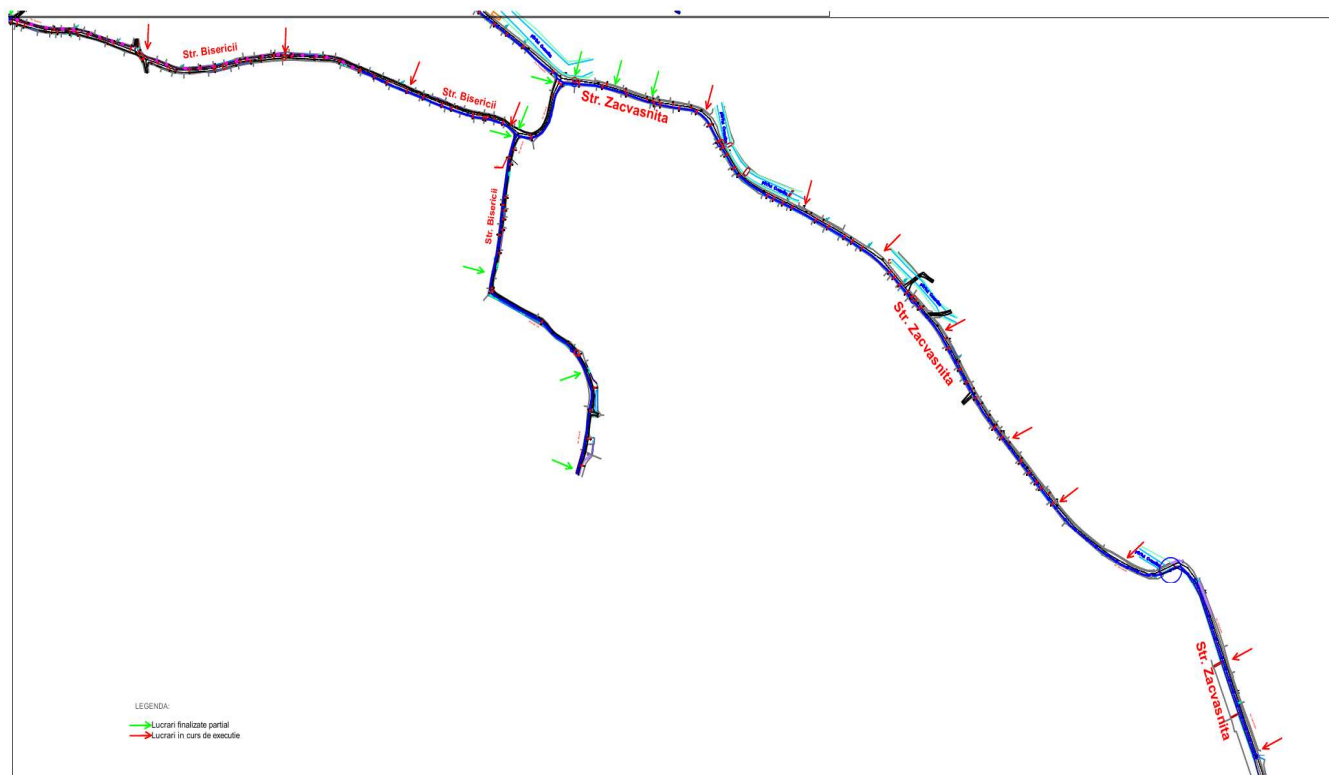


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str.Garii, str. Potocina si
Nejni Crai*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

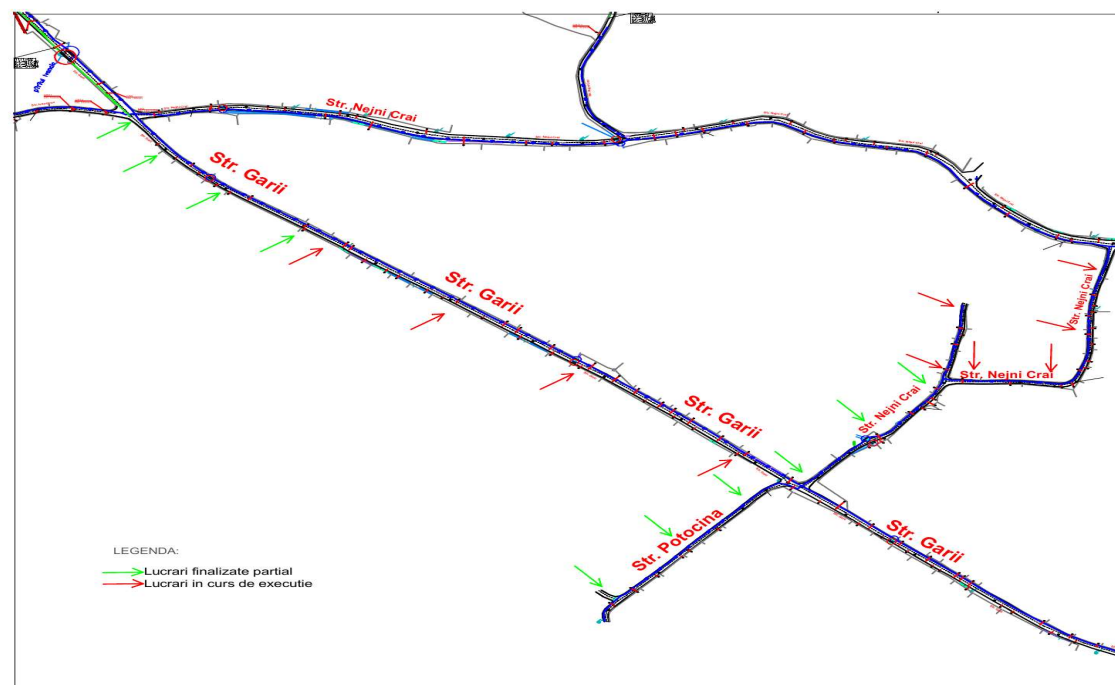


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Garii, str. Capletea*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

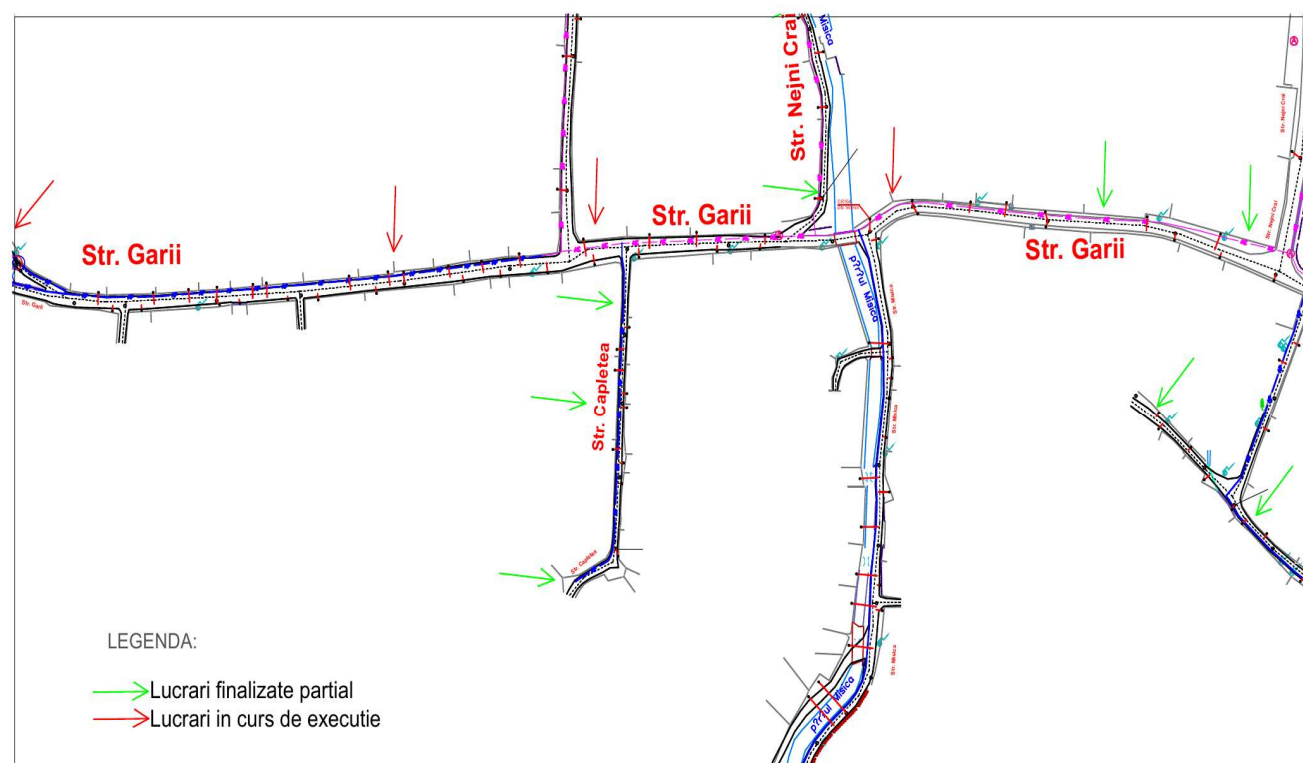


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Paniana*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

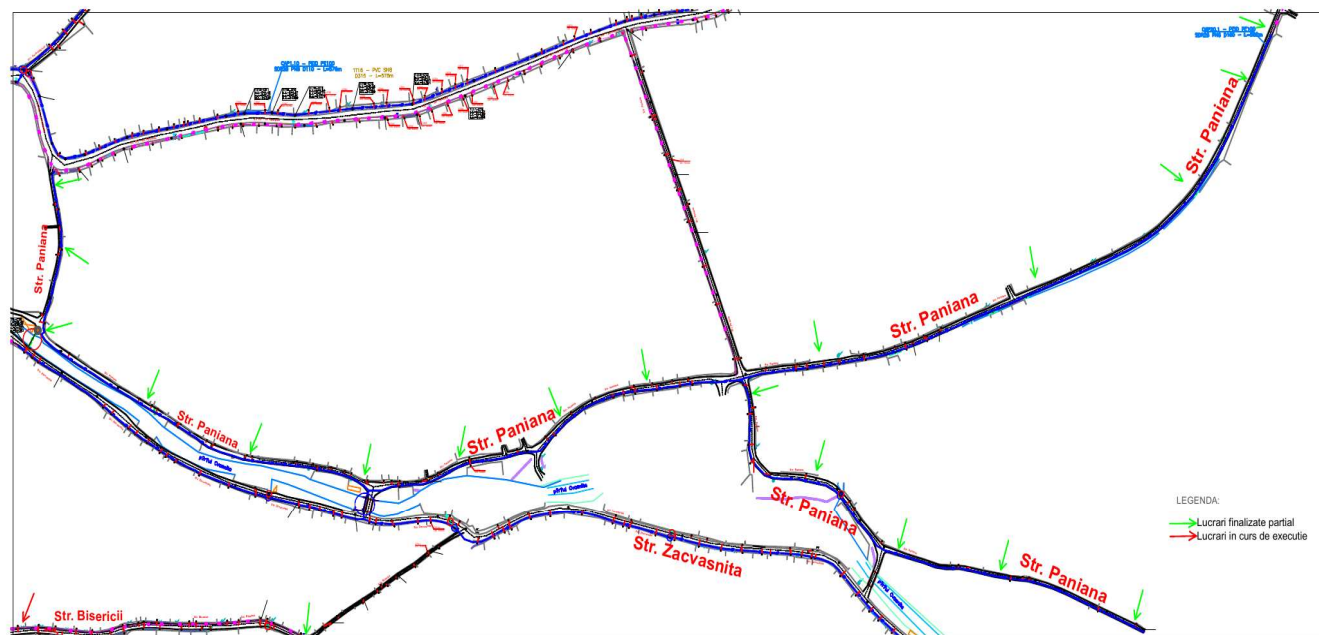


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str.Pasisni*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

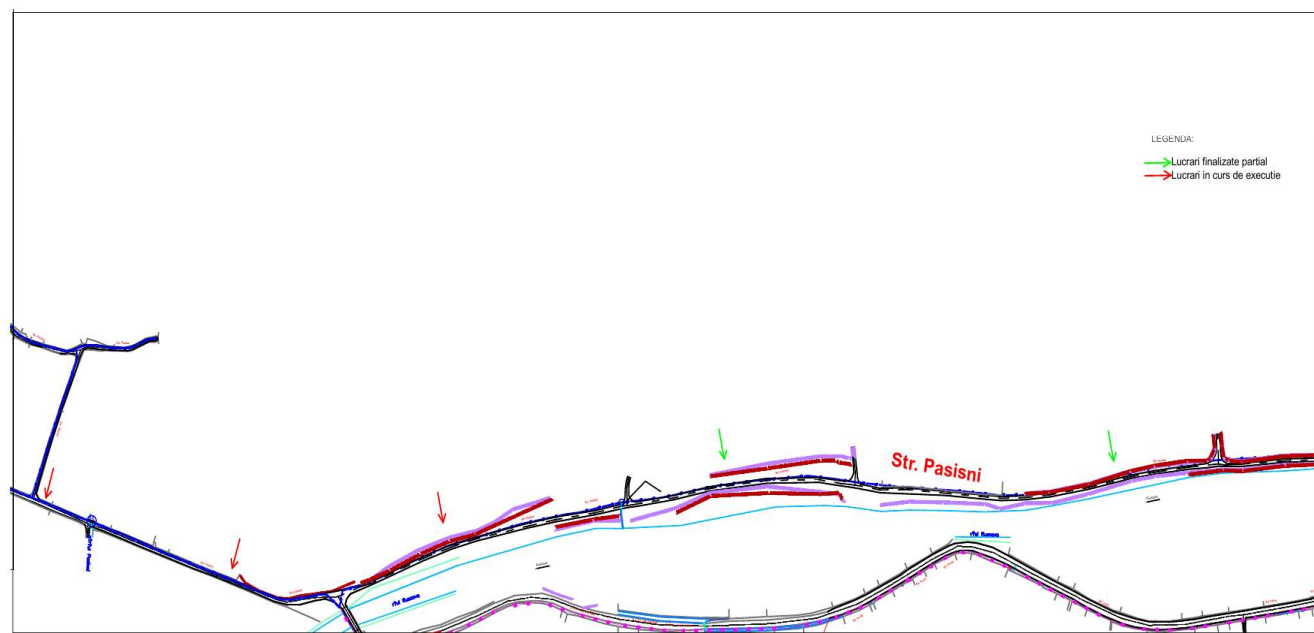


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Zarica, si str. Pasisni*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

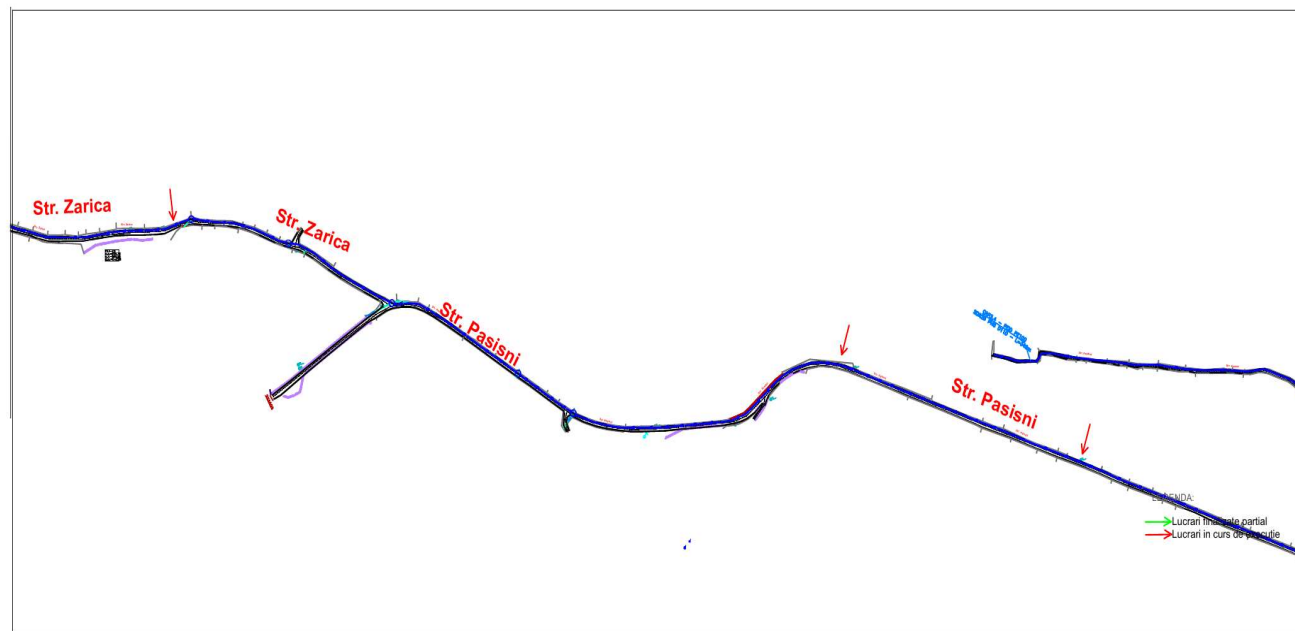


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Torhovita*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea distributie apa

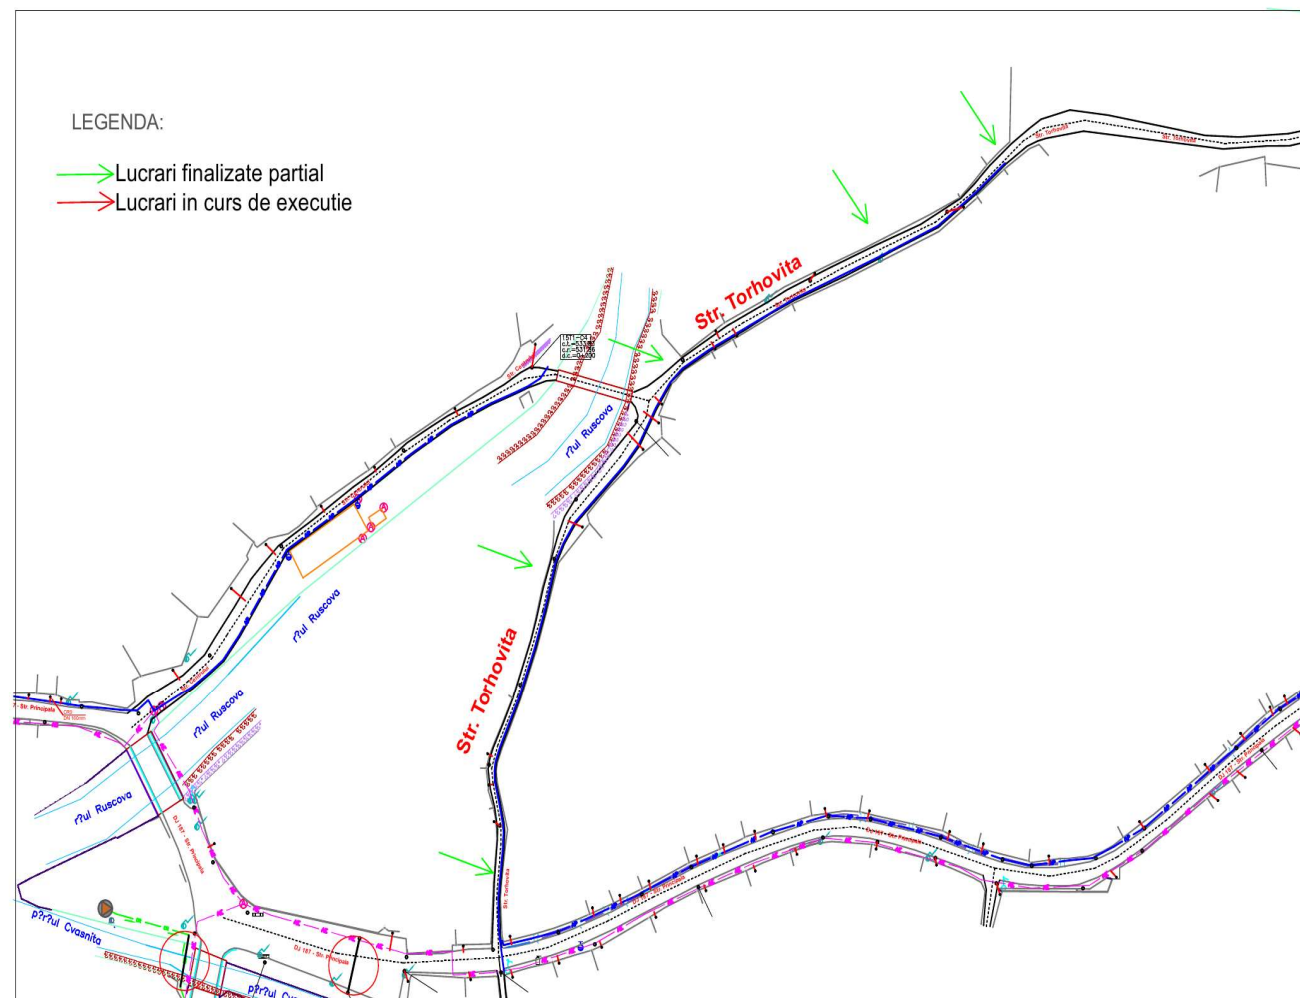


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str.Garii, str. Potocina,
str. Nejni Crai*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea apa uzata

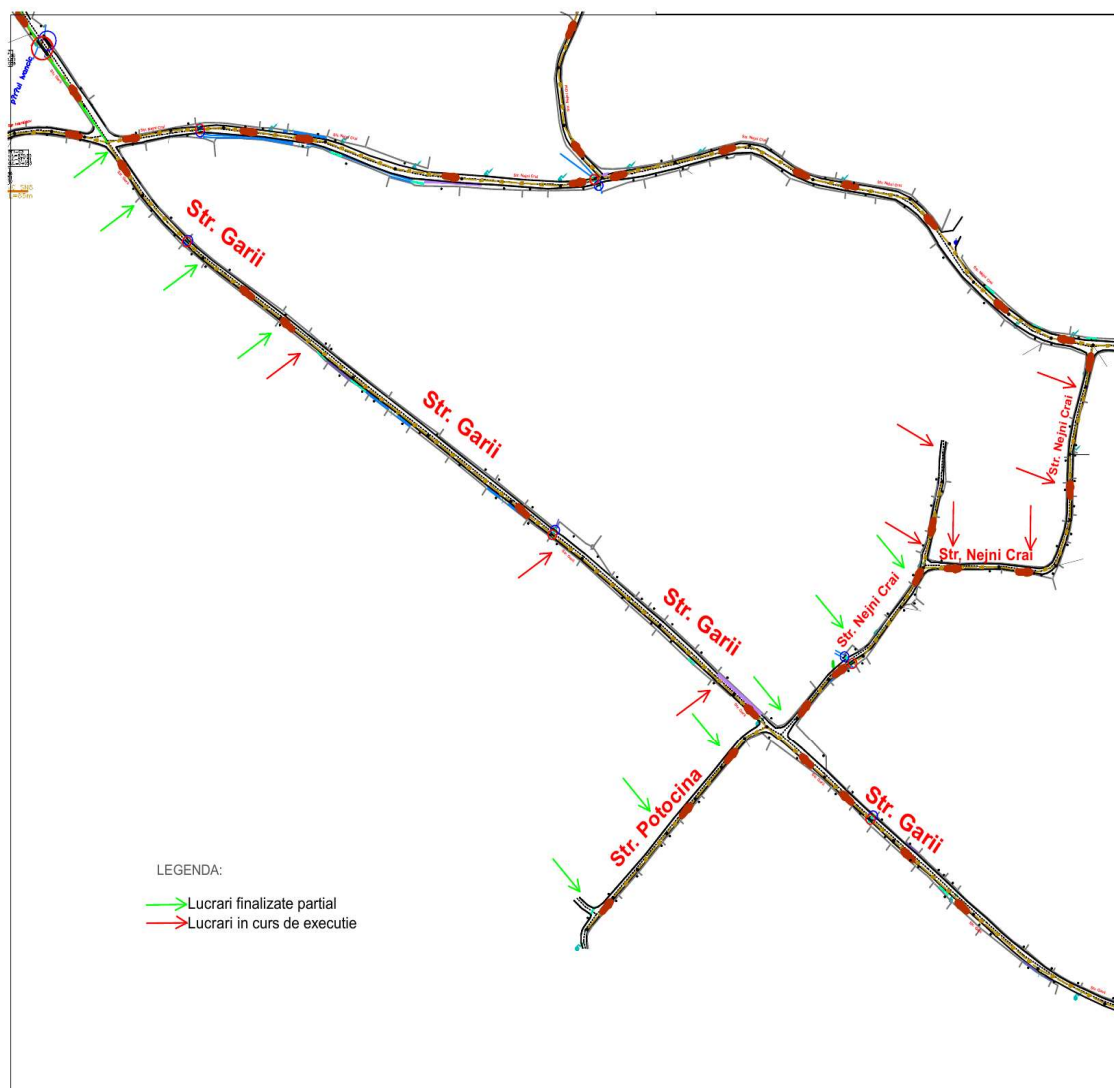


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Garii, Nejni Crai, str.
Capletea, str. Bisericii, str. Dupa
Biserica*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea apa uzata

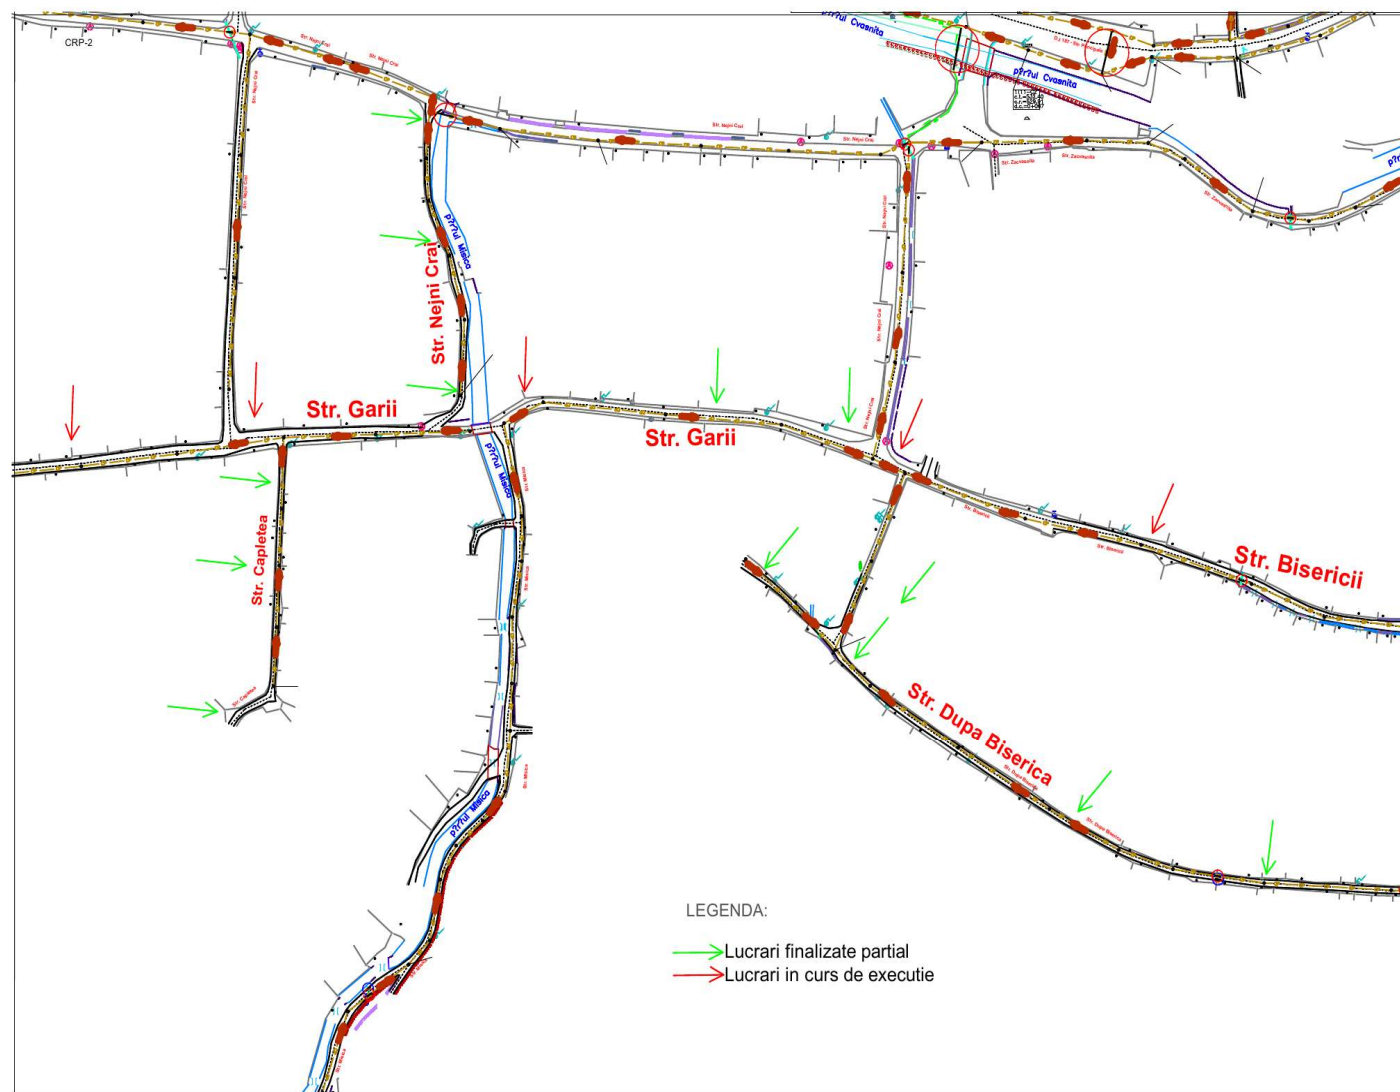


Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Paniana, str. Bisericii

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea apa uzata

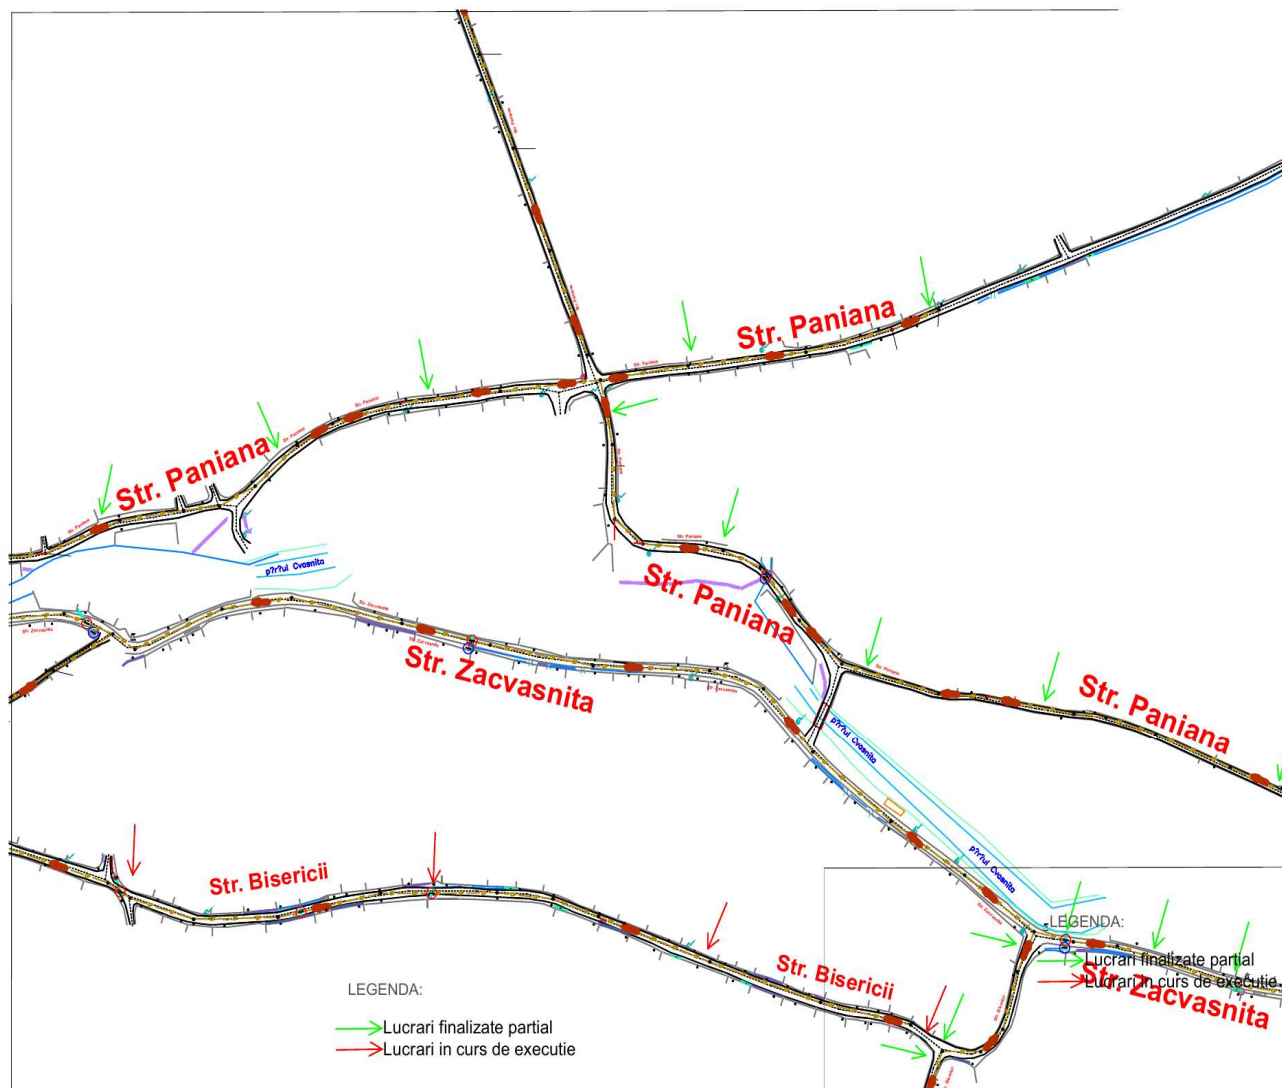


*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Torhovita*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea apa uzata

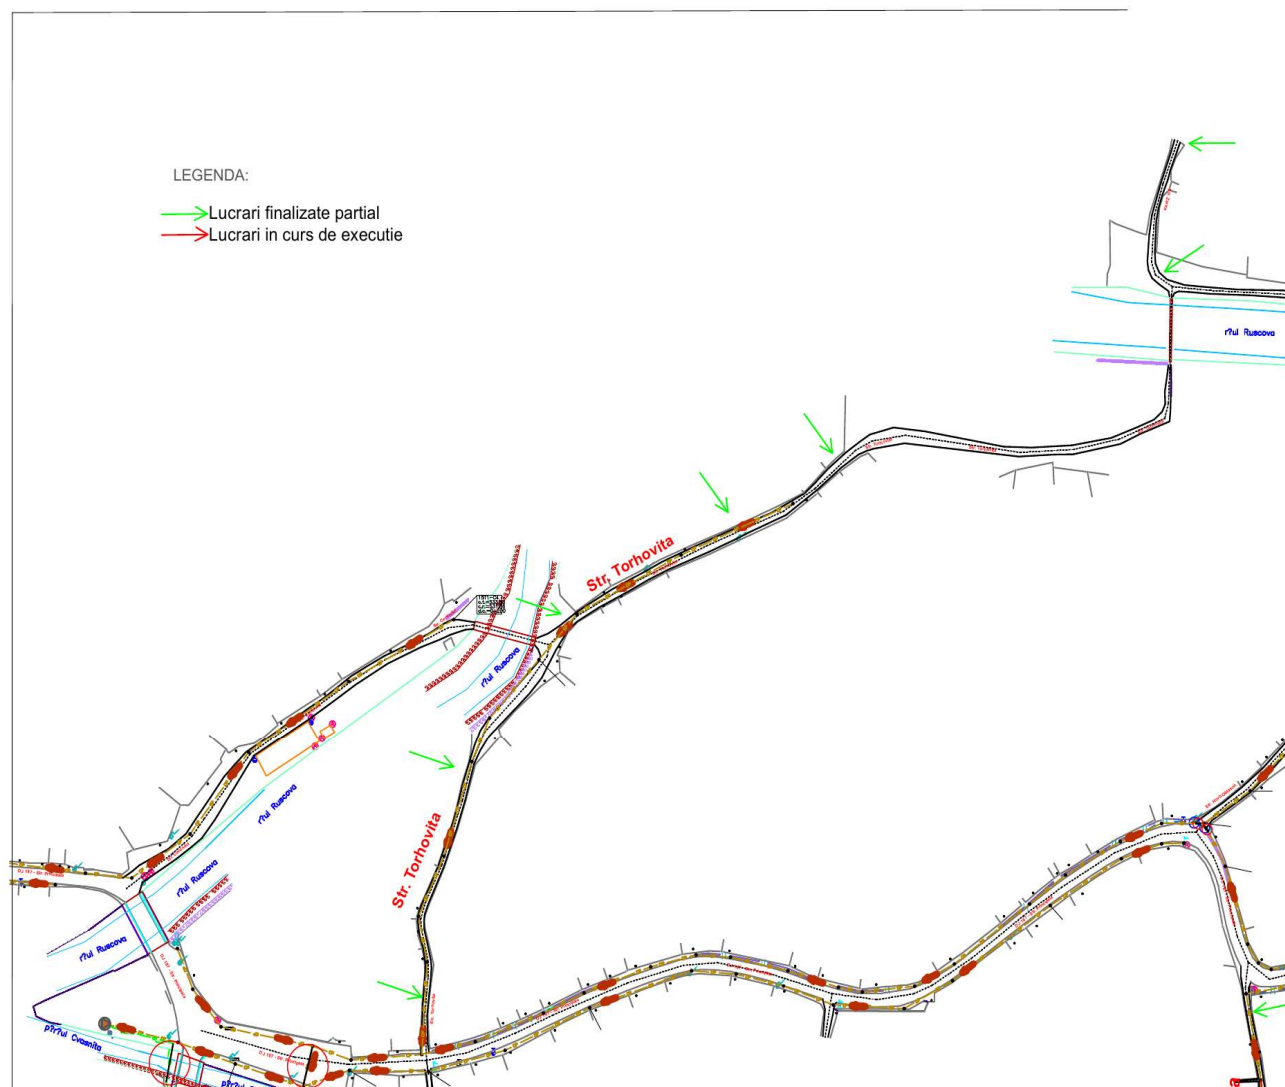

*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Bisericii si
Zacvasnita*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea apa uzata

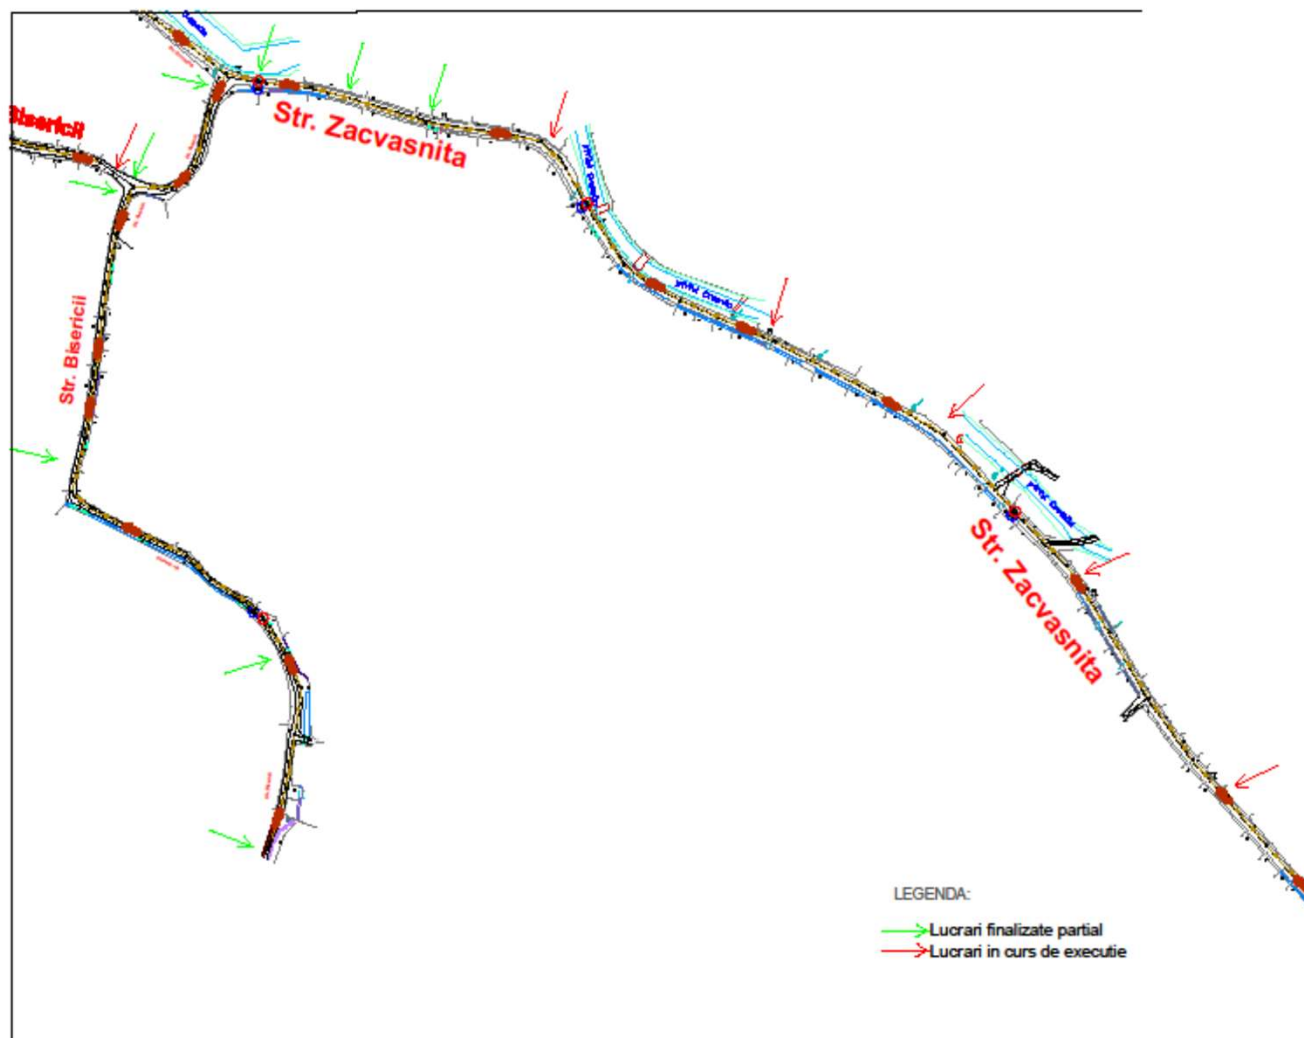

**Lucrari aflate in executi
lucrari propuse pentru c
executate in luna octom
2026 pe str. Azil**

**POIENILE DE SU
Retea**


**Lucrari aflate in executi
lucrari propuse pentru c
executate in luna octom
2026 pe str. Azil**

**POIENILE DE SU
Retea**




*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Paniana, str. Bisericii
si Dupa Biserica*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea apa uzata

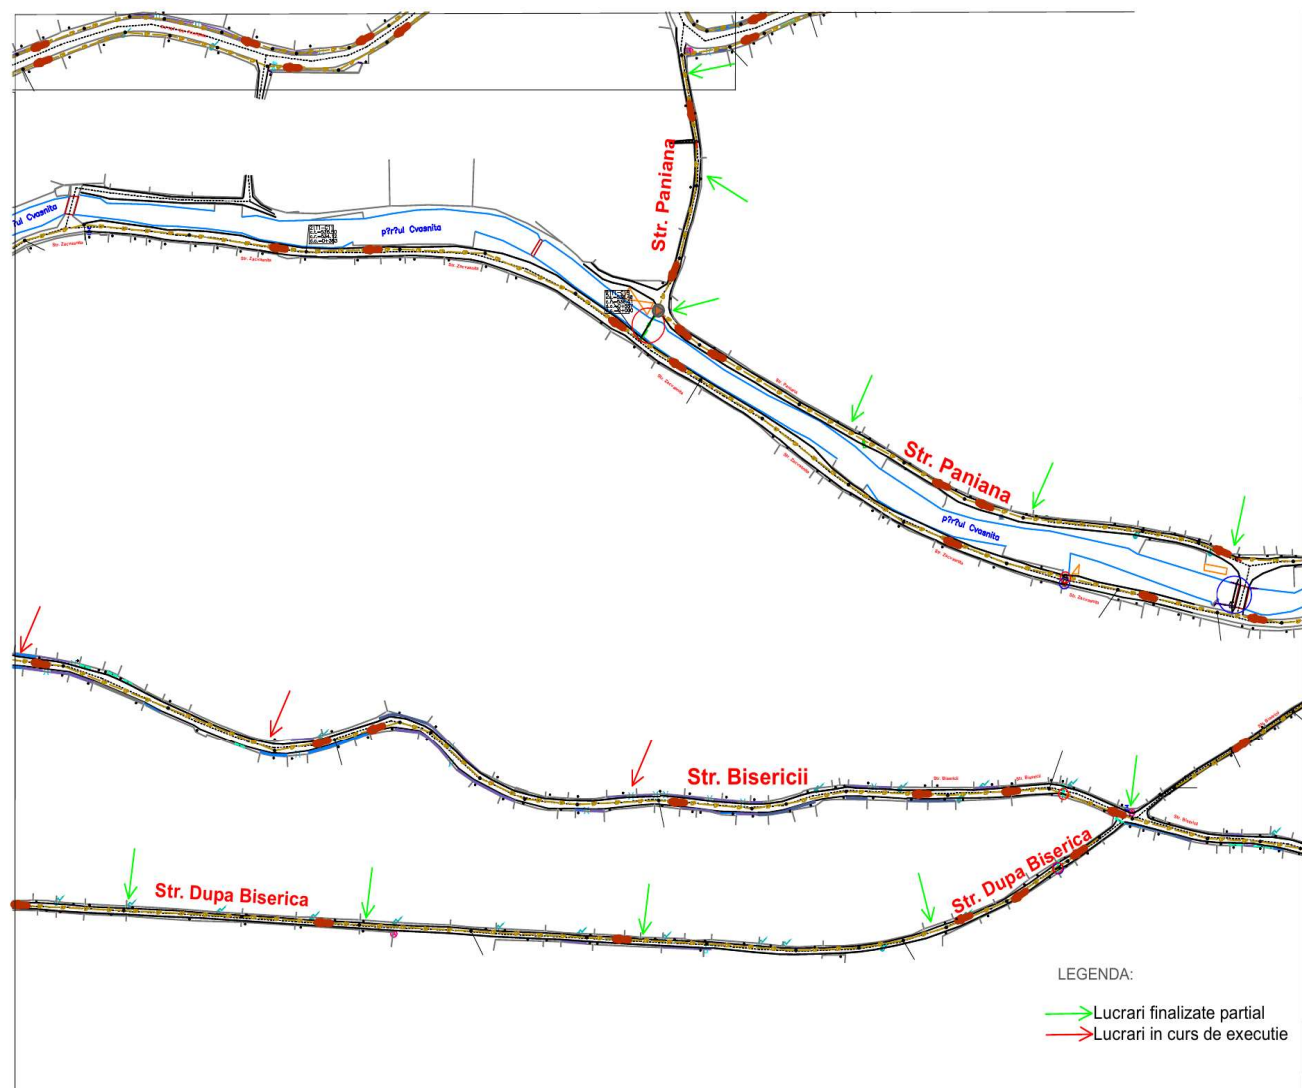

*Lucrari aflate in executie si
lucrari propuse pentru a fi
executate in luna octombrie
2026 pe str. Paniana, str. Bisericii
si Dupa Biserica*

POIENILE DE SUB MUNTE
Retea apa uzata

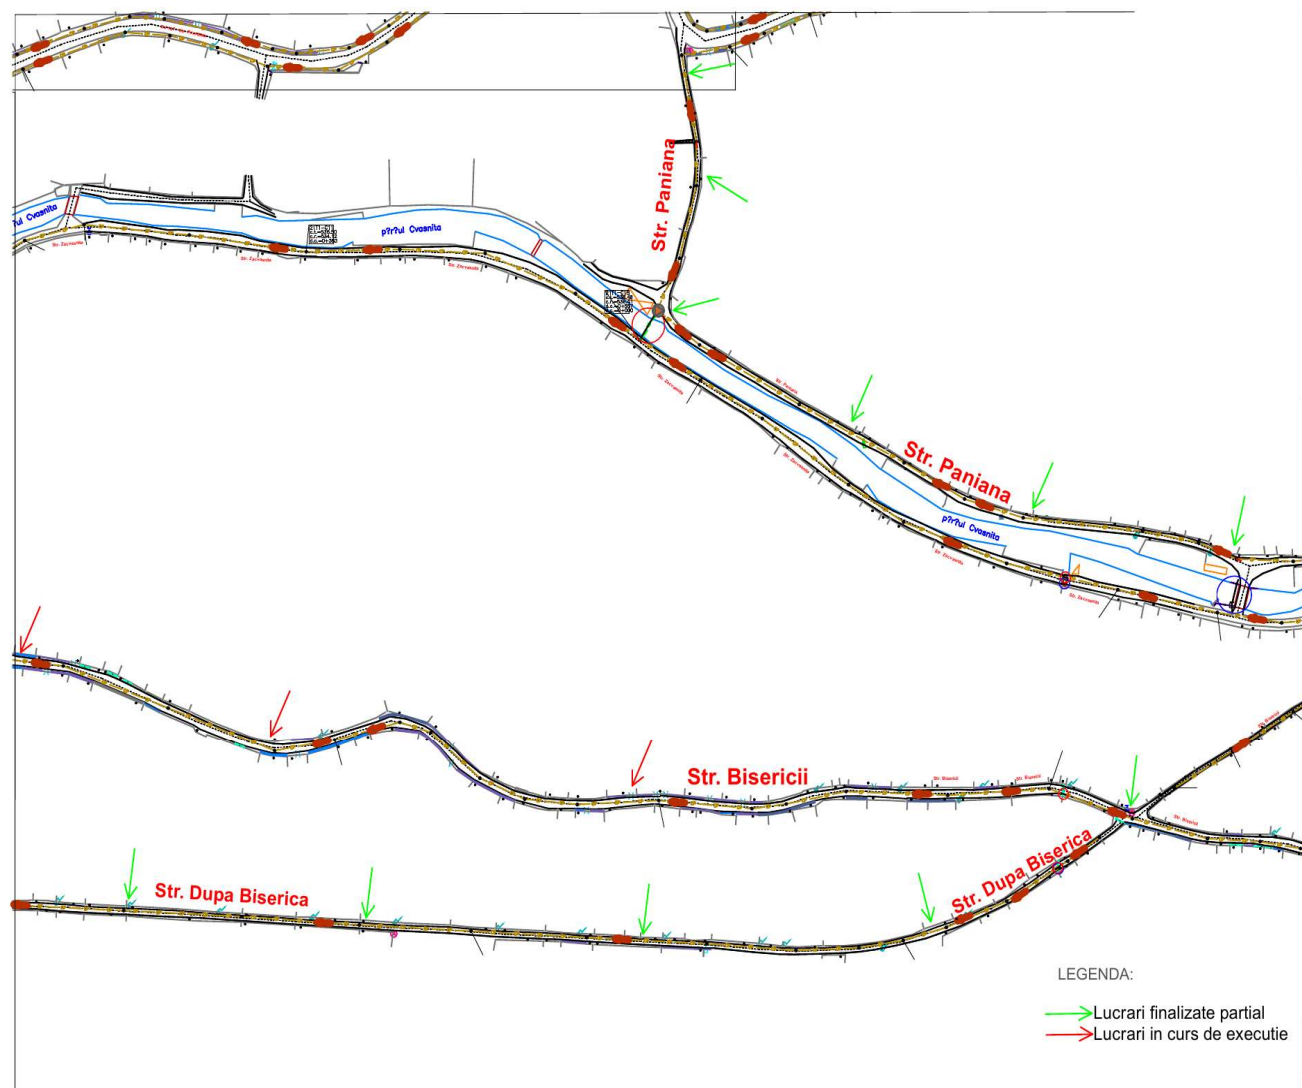


POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa - str. FRASINULUI



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa + subtraversare utilitati - str. BORCUTULUI



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa + subtraversare utilitati – str. TAULUI

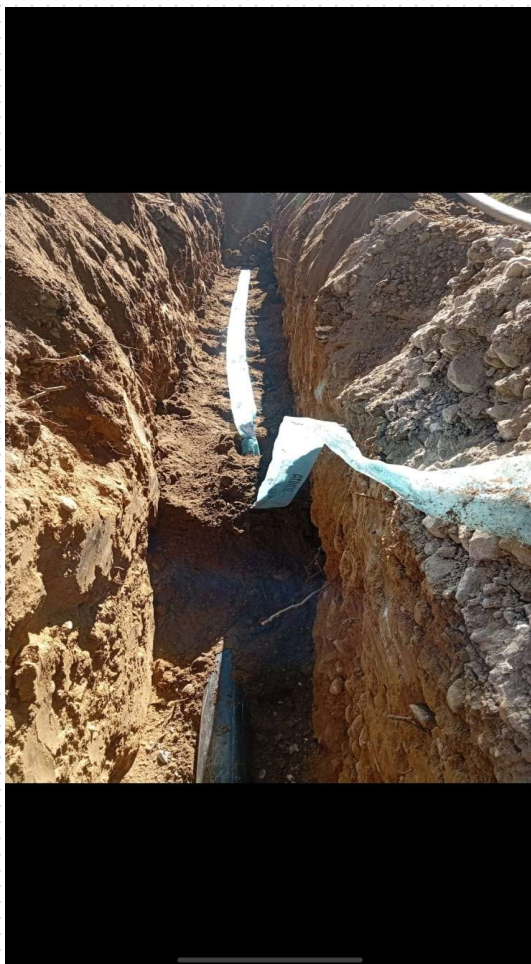


POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa – str. TAULUI



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa – montare hidrant subteran – str. MIERLEI 4




POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea distributie apa – montare camine bransamente – str. MIERLEI 11

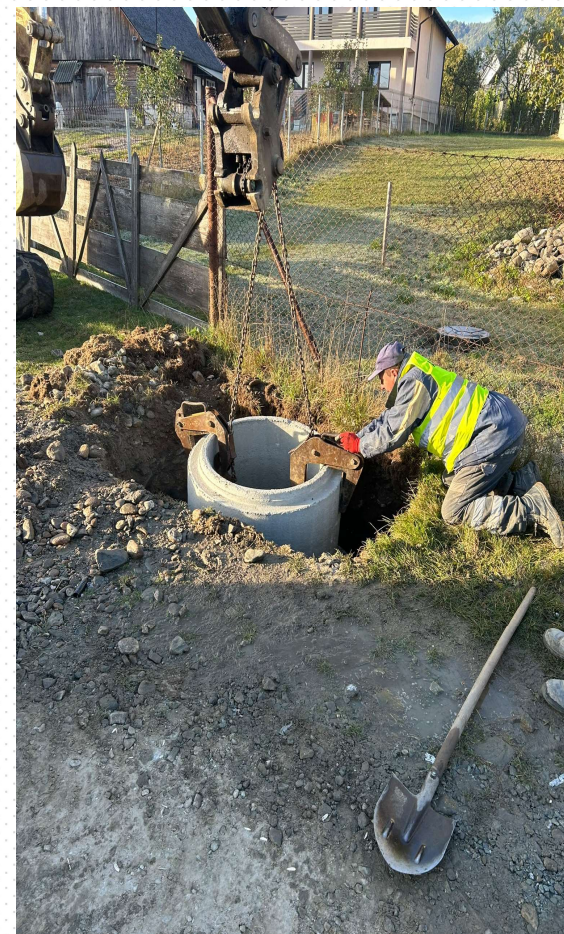


POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea apa uzata – str. Nuferilor Tr 2



POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE
Extindere retea distributie apa si apa uzata – strada Bisericii

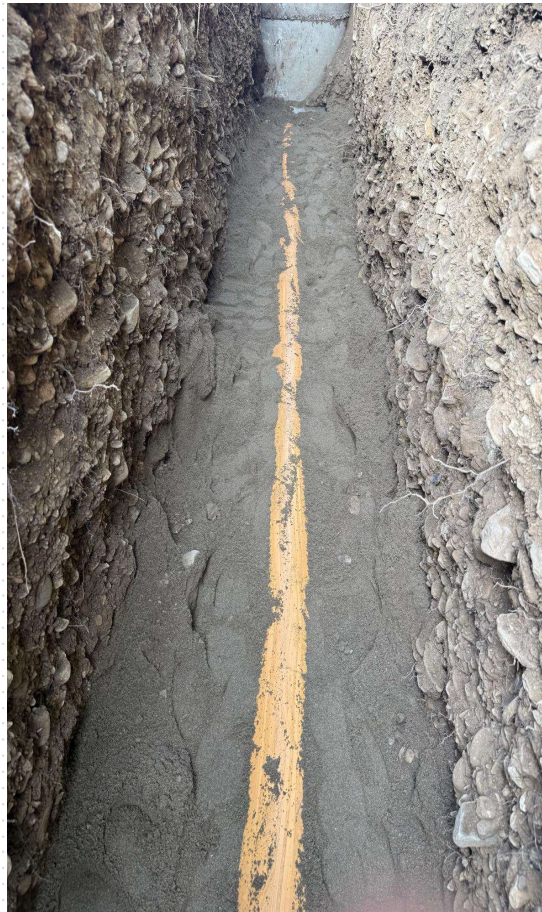

POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE
Extindere retea distributie apa + apa uzata + subtraversare utilitati – strada Garii

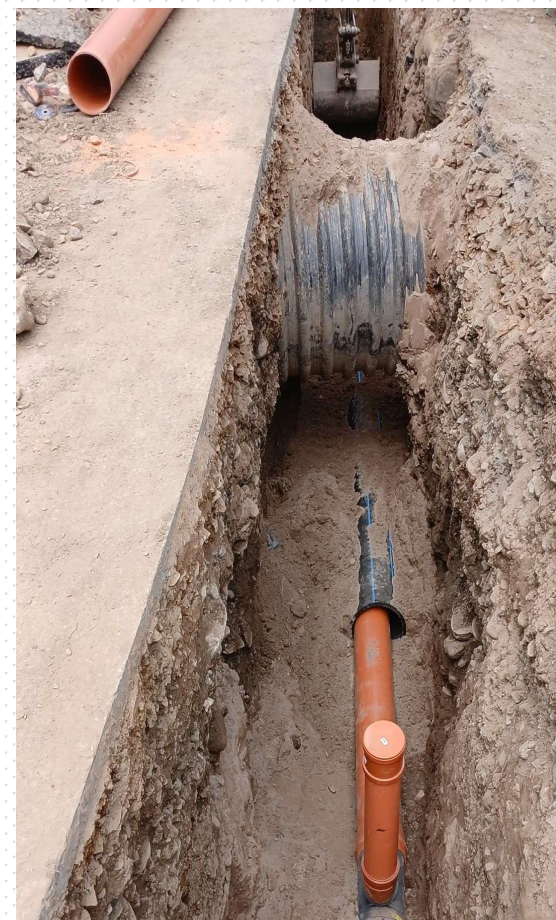


POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE
Extindere retea distributie apa + subtraversare utilitati - strada Pasisnei



POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE
Extindere retea apa uzata – strada Tarhovita



POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE
Extindere retea apa uzata + subtraversare utilitati – strada Zacvasnita

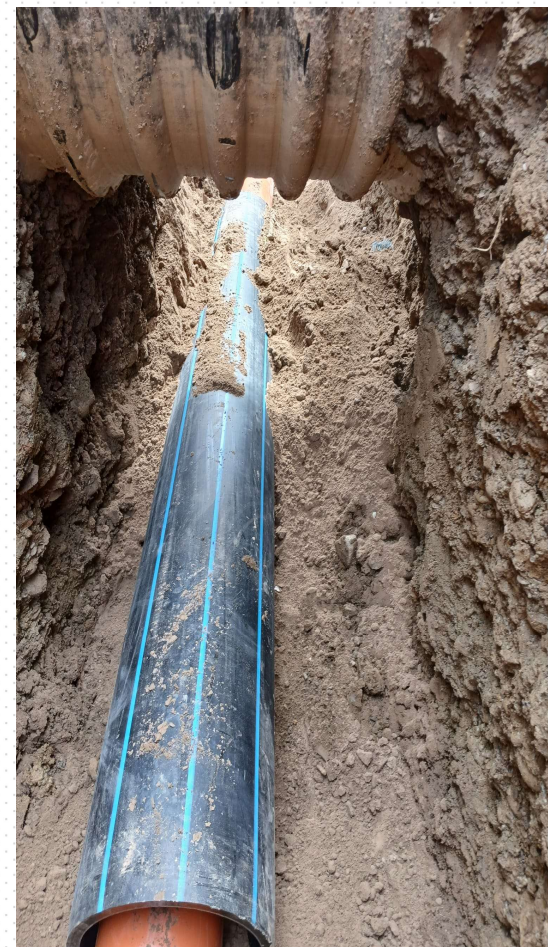

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea apa/canalizare – str. Tisa 1




POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea de apa/canalizare – str. Craciunesti 12



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea de apa – str. Tisa 1 / Craciunesti 12



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea de apa – camine de bransament – str. Tisa 5 / Craciunesti 4

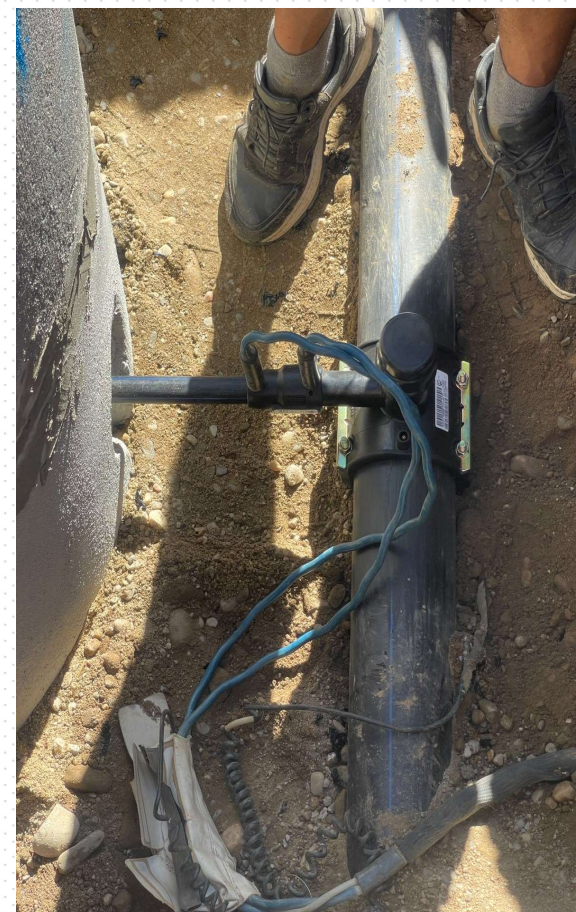

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea de apa – camine de bransament – str. Tisa 5 / Craciunesti 4



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea de apa – camine de bransament – str. Tisa 5 /Tisa 3



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea apa uzata – DJ 185 Bocicoiu Mare




POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea apa uzata – DJ 185 Bocicoiu Mare





POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea apa uzata – DN 18 – TISA – partea stanga



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea apa uzata – DN 18 – TISA – partea stanga

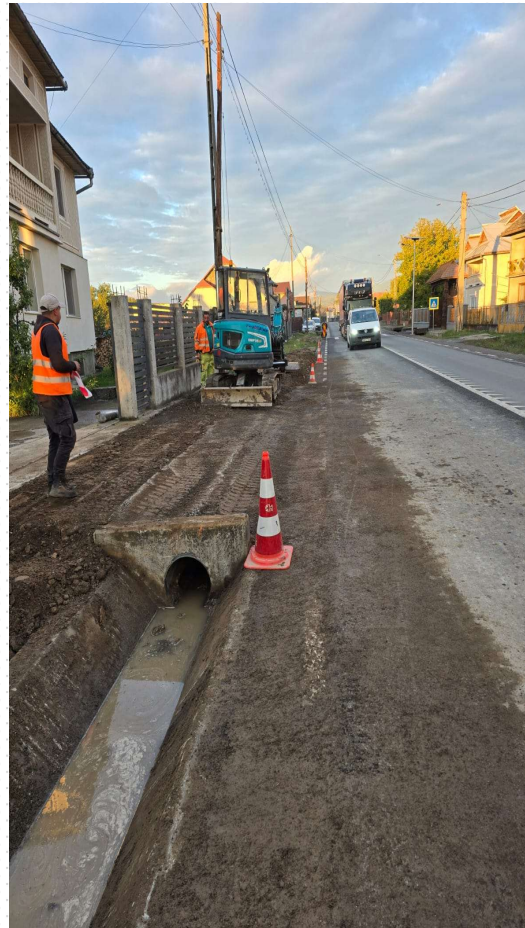

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea apa uzata – DN 18 – TISA – partea stanga

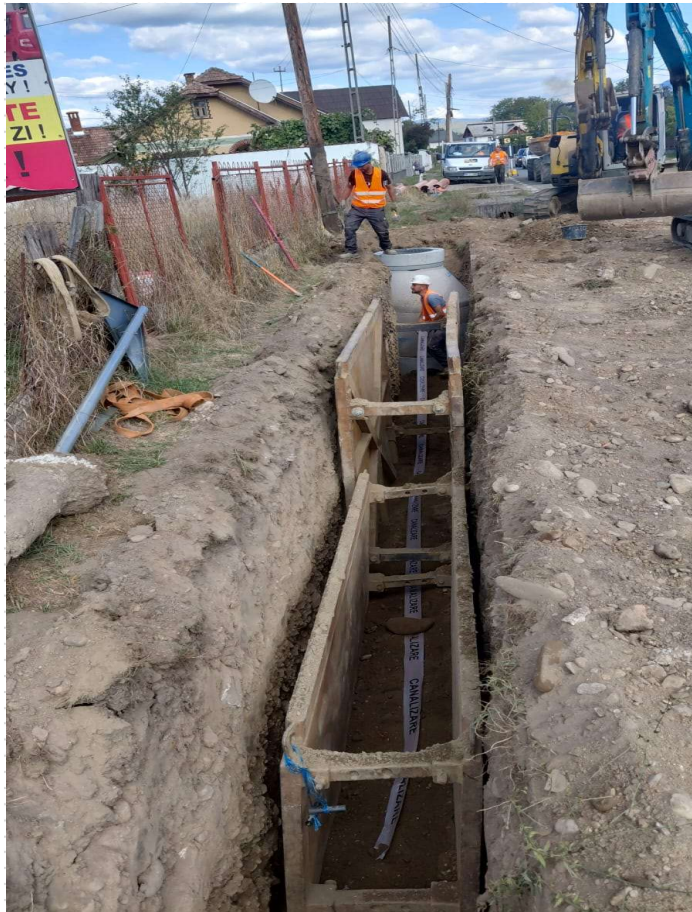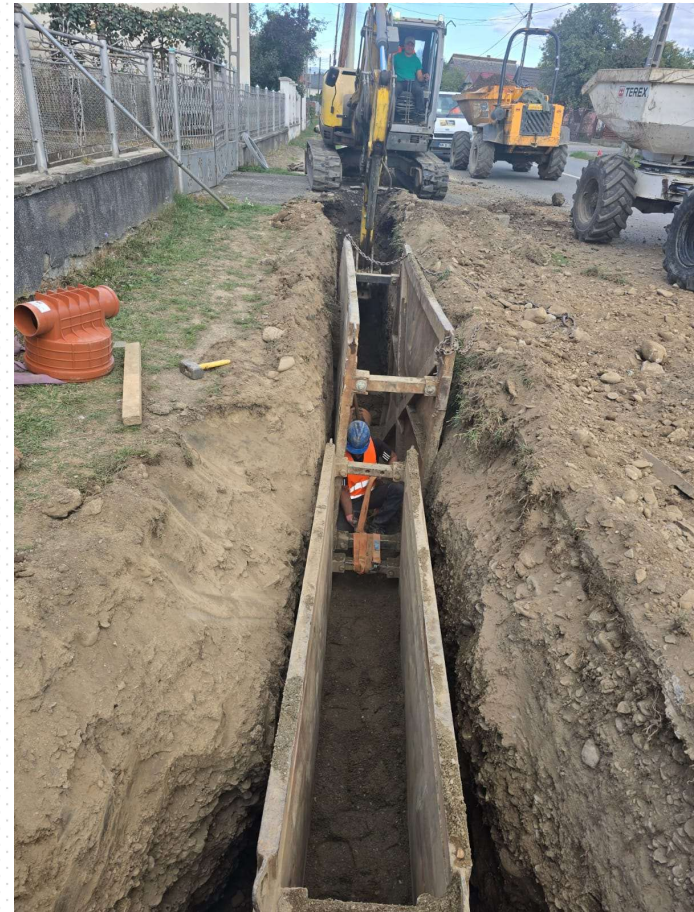

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE
Extindere retea distributie apa + subtraversare utilitati – Craciunesti 4

