



Sedinta lunara de progres APRILIE 2026

***PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES
SMIS+ 322218***

**MM-CL-10 „ Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus,
Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte ”**

MM-CL-10 „*Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte*”

• 1. DETALII CONTRACT

- Contract nr. 196/28.07.2025 MM-CL-10 „Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte”
- Program
 - « Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Maramures », finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Dezvoltare Durabila 2021 - 2027
- Contractor
 - **Asocierea PRODEXIMP SRL – ALAVAL PROD COM SRL – DACIA ASPHALT SRL**
- Valoarea Contractului LEI
 - **175.247.779,82 lei (fara TVA)**
- Data acordului
 - **28.07.2025**
- Autorizatie de construire
 - **Nr. 37 din 26.09.2025**
- Autorizatie de construire organizare de santier
 - **UAT Viseu de Sus – Nr. 2 din 30.01.2026**
 - **UAT Bocicoiu Mare – Nr. 3 din 28.01.2026**
 - **UAT Poienile de Sub Munte – Nr. 1 din 12.02.2026**
- Durata contractului:
 - **30 LUNI**
- Perioada de garantie
 - **36 LUNI**

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPER AFERENTE LUCRARILOR nr. 1 / 27.02.2026; nr. 4 / 30.03.2026

- OBIECTIV 1:

- Reabilitare conducta de transport apa potabile – L = 676 m;
- Extindere conducta de transport apa potabile – L = 5.202 m;
- Reabilitare retea de distributie apa potabile – L = 1.595 m;
- Extindere retea de distributie apa potabile – L = 20.570 m;
- Extindere statii de pompare apa potabile – L = 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA1 (existenta) – Str. Aurel Vlaicu: reabilitare rezervor inmagazinare 1.000 m² – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA2 (noua) – Str. Frasinului: rezervor nou inmagazinare 250 m² – 1 buc. si statie noua clorinare – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA3 (noua) – Str. 1 Mai: statie noua de pompare Q_p = 5 l/s, H_p = 200 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon – 150m² – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA4 (noua) – Str. Randunelelor (DN18): statie noua pompare Q_p = 5 l/s, H_p = 60 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon 150 m² – 1 buc. si statie noua de clorinare - 1 buc.
- Front de captare existent: reabilitare rezervor 150 m³, reabilitare rezervor de inmagazinare 150 m³ = 1 buc.

- OBIECTIV 2:

- Extindere retea canalizare – L = 9.417 m;
- Extindere statii de pompare apa uzata si conducte de refulare apa uzata - 8 buc. SPAU, L = 1.641 m

WISEU DE SUS


• **PROGRES FIZIC**

WISEU DE SUS

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diametru (mm)	Lungime executata pana la 30.04.2026
Obiect VS-1 REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN LOCALITATEA WISEU DE SUS				
VS-1.3 Reabilitare retea de distributie apa potabila		Conform contract		
1	Str. Branduselor 2 Tr 1	157	110	54
TOTAL				54
VS-1.4 Extindere retea distributie apa potabila		Conform contract		
1	Str. Valea Raului TRONSON 4	178	110	178
2	Str. Valea Raului TRONSON 5	400	110	400
3	Str. Valea Raului TRONSON 6	311	110	311
4	Str. Valea Raului TRONSON 6_1	178	110	178
5	Str. Valea Raului TRONSON 6_2	263	110	263
6	Str. Valea Raului TRONSON 7	394	110	394
7	Str. Valea Raului TRONSON 8	374	110	374
8	Str. Valea Raului TRONSON 9	390	110	152
9	Str Mierlei 5 TRONSON 1	96	110	96
TOTAL				2,346
Obiect VS-2 REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN LOCALITATEA WISEU DE SUS				
VS-2.1 Extindere retea de canalizare		Conform contract		
1	Str. Mierlei 2 Tr 3	73	250	26
2	Str. Mierlei 4 Tr 1	286	250	194
3	Str Mierlei 5 Tr 1	96	250	96
4	Str Branduselor Tr1	143	250	36
TOTAL				352
VS-2.2.2 Extindere statii de pompare apa uzata		Conform contract		
1	SPAU 6 (str. Branduselor 2 TR1) str. Zavoi Tr1	174	90	50
TOTAL				50

**Lucrari aflate
in executie**

**WISEU DE SUS
Apa**

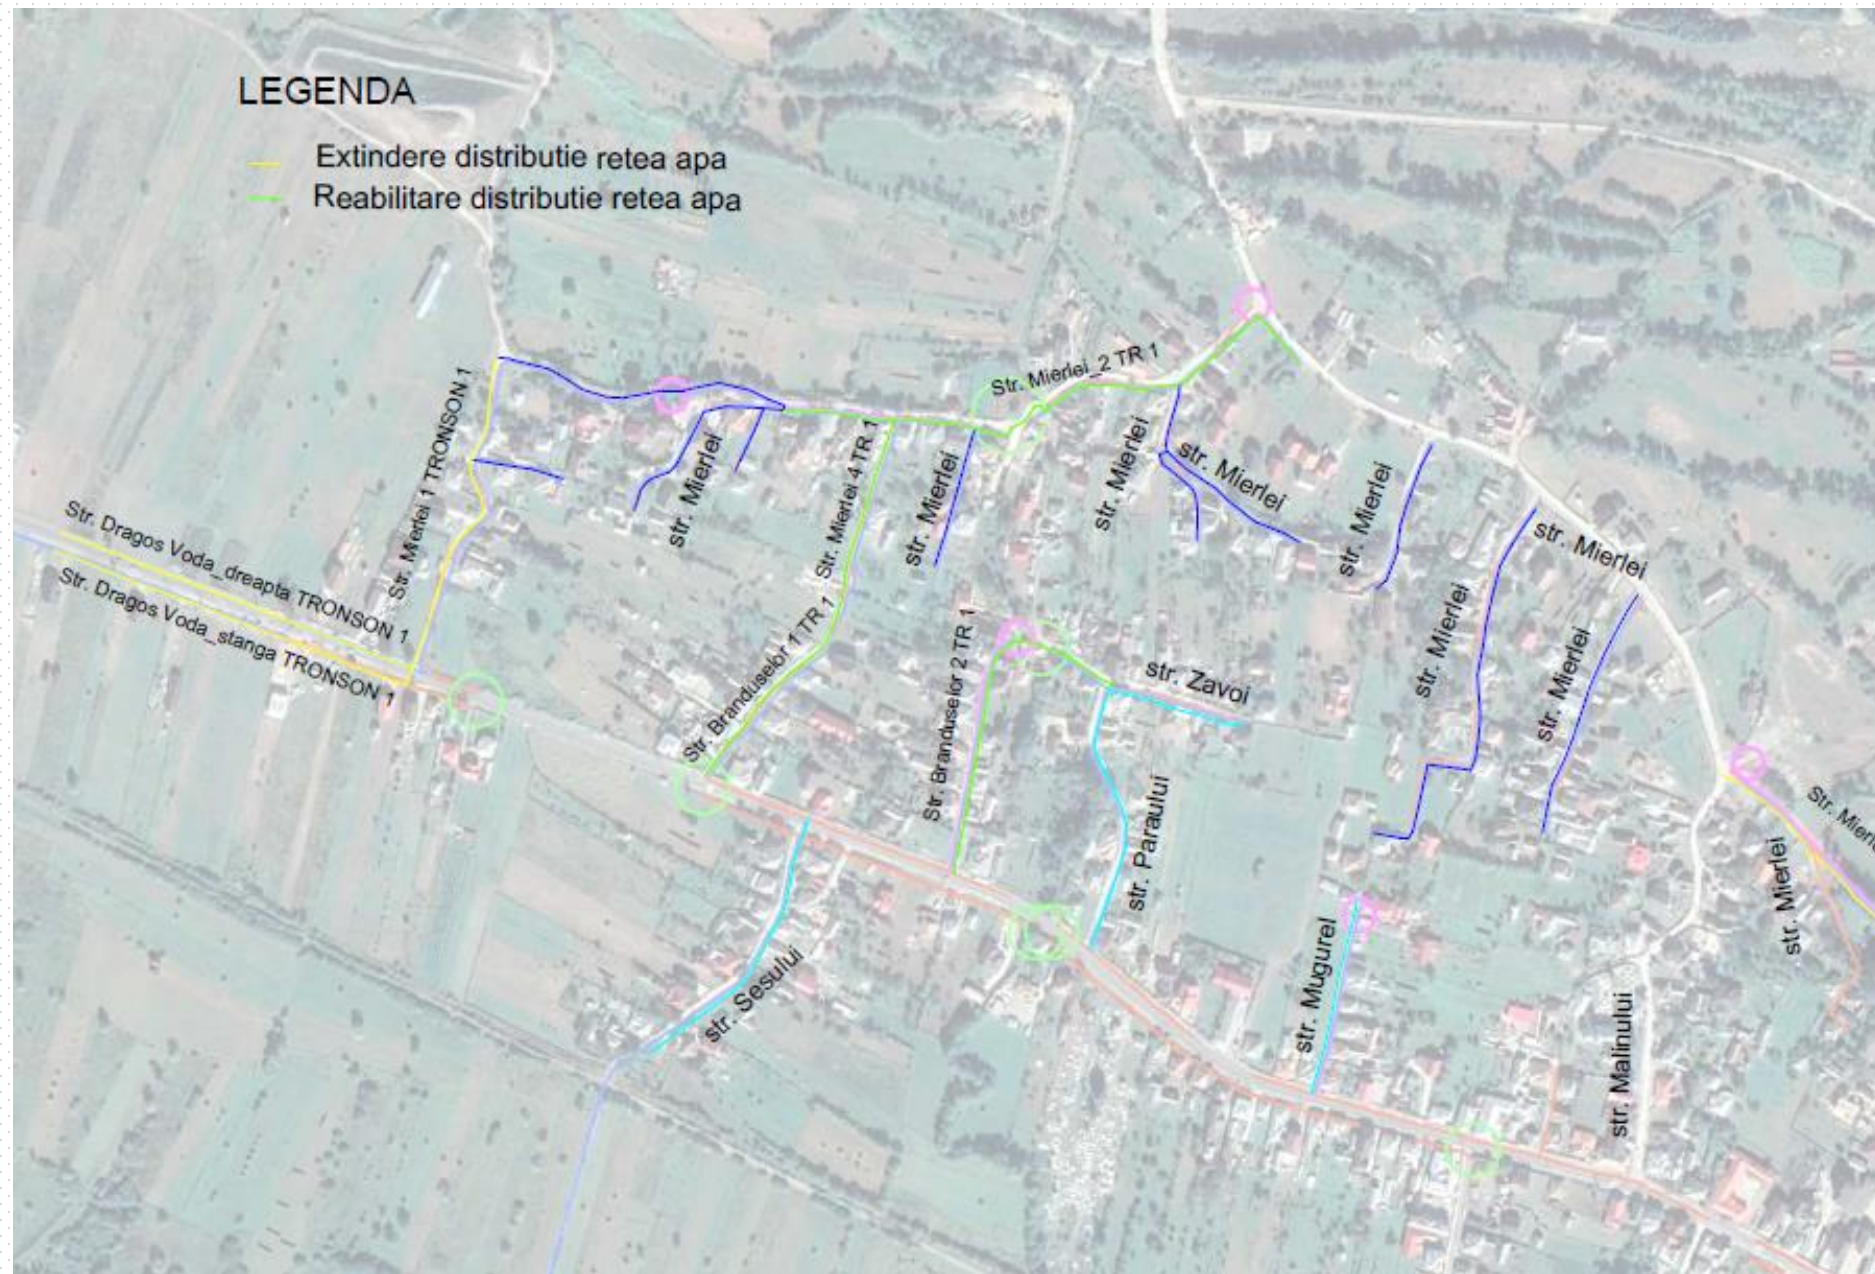


*Lucrari aflate
in executie*

WISEU DE SUS
Apa



*Lucrari aflate
in executie*

*WISEU DE SUS
Apa*

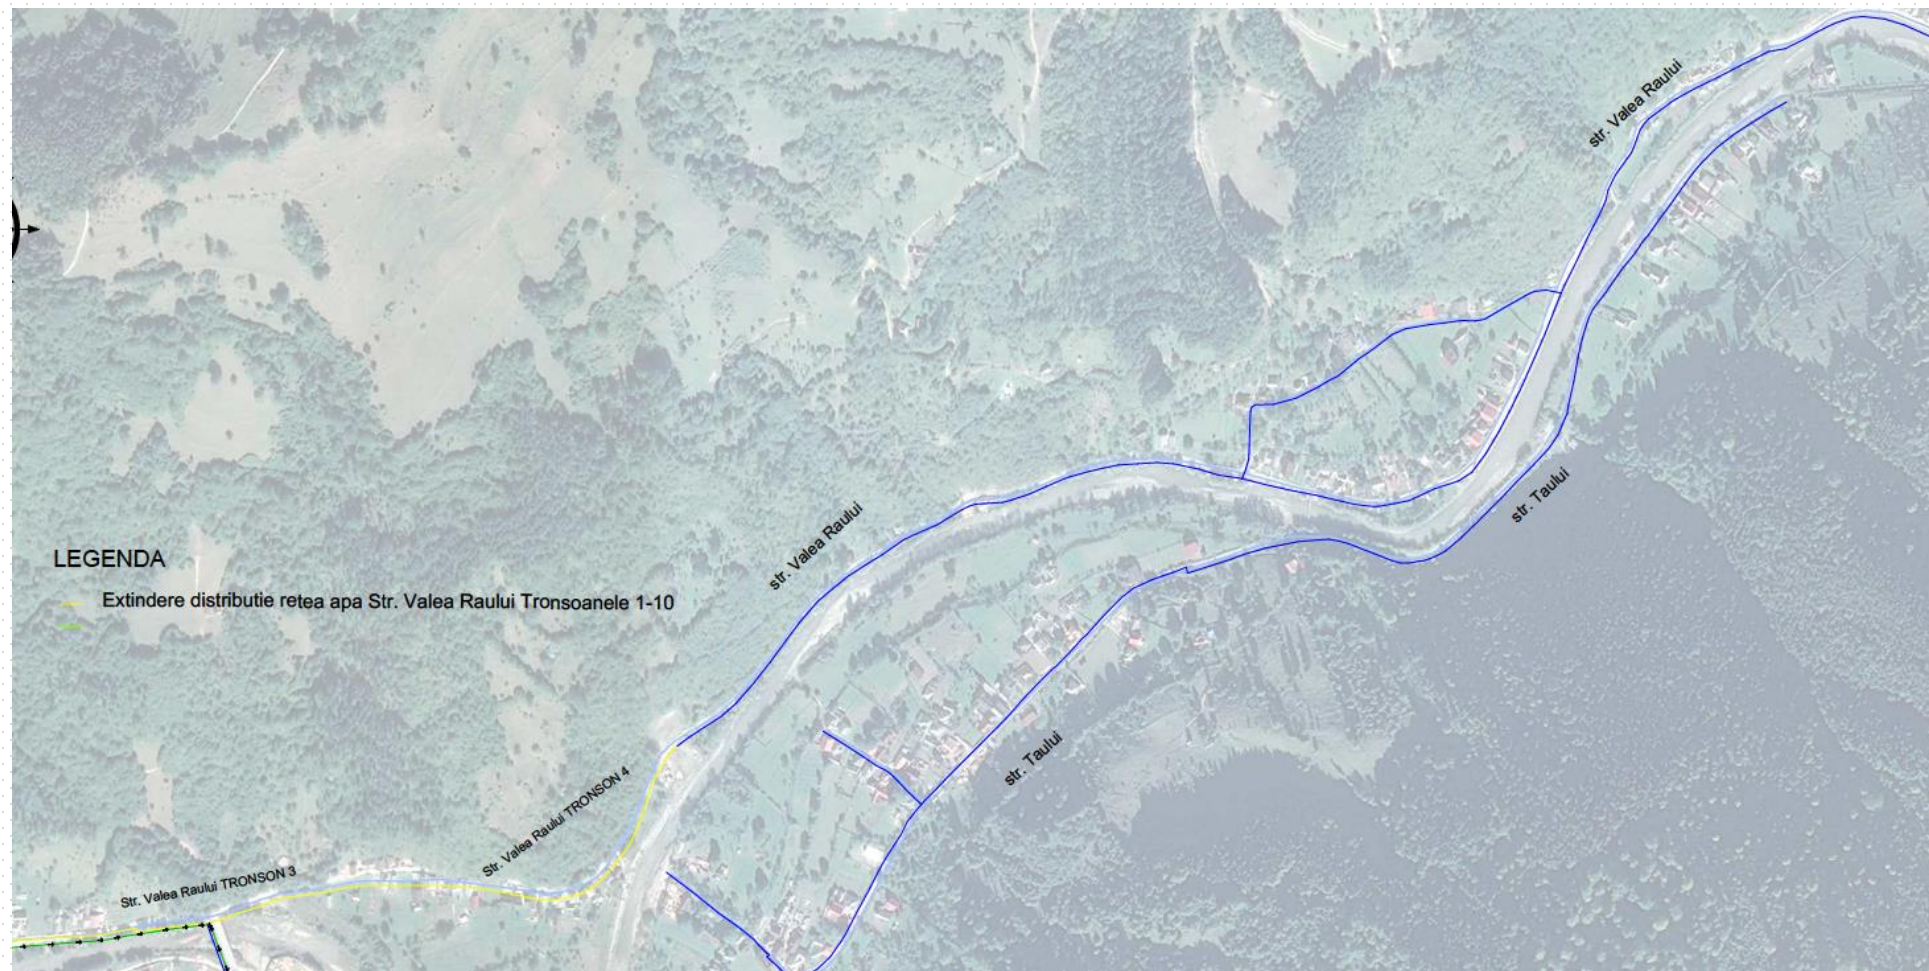

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SIA BORNELOR DE
REPER AFERENTE LUCRARILOR nr. 2/02.03.2026, nr. 5 / 06.04.2026

- OBIECTIV 1:

- Extindere retea de distributie – L = 31.773 m;
- Statie de pompare GA Craciunesti – 1 buc.;
- Gospodaria de apa: rezervor nou de inmagazinare 500 m³ – 2 buc.;
- Statie noua de clorinare – 1 buc.;
- Conducta de transport apa potabile – L = 3.201 m;

- OBIECTIV 2:

- Extinderea sistemului de apa uzata – L = 23.486 m;

- OBIECTIV 3:

- Statie de pompare apa uzata SPAU 1 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 2 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 3 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 4 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 5 – 1 buc.;

- OBIECTIV 4:

- Conducta refulare SPAU 1 – Lref = 676 m;
- Conducta refulare SPAU 2 – Lref = 637 m;
- Conducta refulare SPAU 3 – Lref = 637 m
- Conducta refulare SPAU 4 – Lref = 637 m
- Conducta refulare SPAU 5 – Lref = 637 m

BOCICOIU MARE


• **PROGRES FIZIC**

BOCICOIU MARE

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diamentru (mm)	Lungime executata pana la 30.04.2026
Obiect 1 EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN BOCICOIU MARE				
Sub-Obiect 1 Extindere retea distributie		Conform contract		
1	Str. Tisa 1	1607	110	326
2	Str. Tisa 3	301	110	297
3	Str. Craciunesti 7	910	110	100
4	Str. Craciunesti 8	125	110	120
5	Str. Lunca 1	112	110	100
6	Str. Lunca 2	115	110	110
7	Str. Lunca 3	59	110	55
8	Str. Lunca 4	373	110	370
9	Str. Lunca 5	161	110	160
10	Str. Lunca 6	439	110	430
11	Str. Lunca 7	223	110	218
12	Str. Lunca 8	95	110	90
TOTAL				2,376
Obiect 2 EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA IN BOCICOIU MARE				
Sub-Obiect 1 Extindere retea de canalizare		Conform contract		
1	Str. Tisa 1	1730	250	700
2	Str. Tisa 3	264	250	264
3	Str. Tisa 4	162	250	162
4	Str. Tisa 5	112	250	112
5	Str. Tisa 6	350	250	192
6	Str. Tisa 7	360	250	71
7	Str. Craciunesti 1	1290	250	1092
8	Str. Craciunesti 4	1534	250	583
9	Str. Craciunesti 5	357	250	231
10	Str. Craciunesti 7	856	250	614
11	Str. Craciunesti 8	117	250	112
12	Str. Principala Craciunesti DJ185 stg	1279	250	791
13	Str. Principala Bocicoiu Mare Dj185 stg	2247	250	414
14	Str. Bocicoiu 2	324	250	71
TOTAL				5,409


*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa

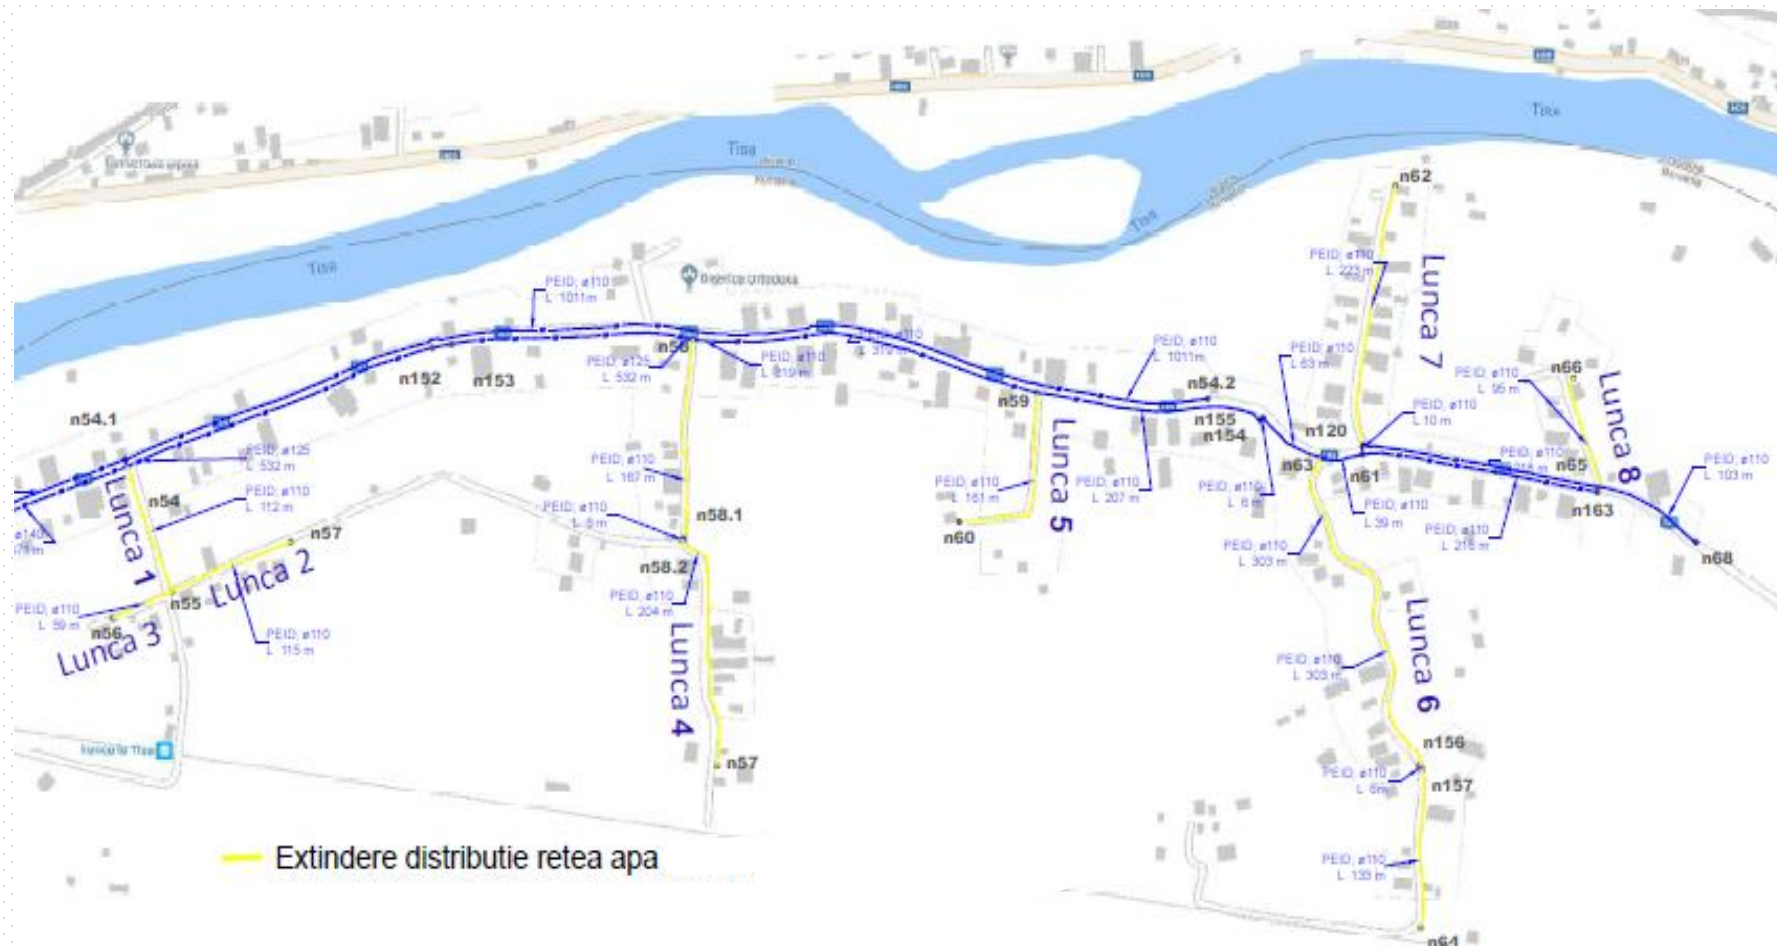

*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa

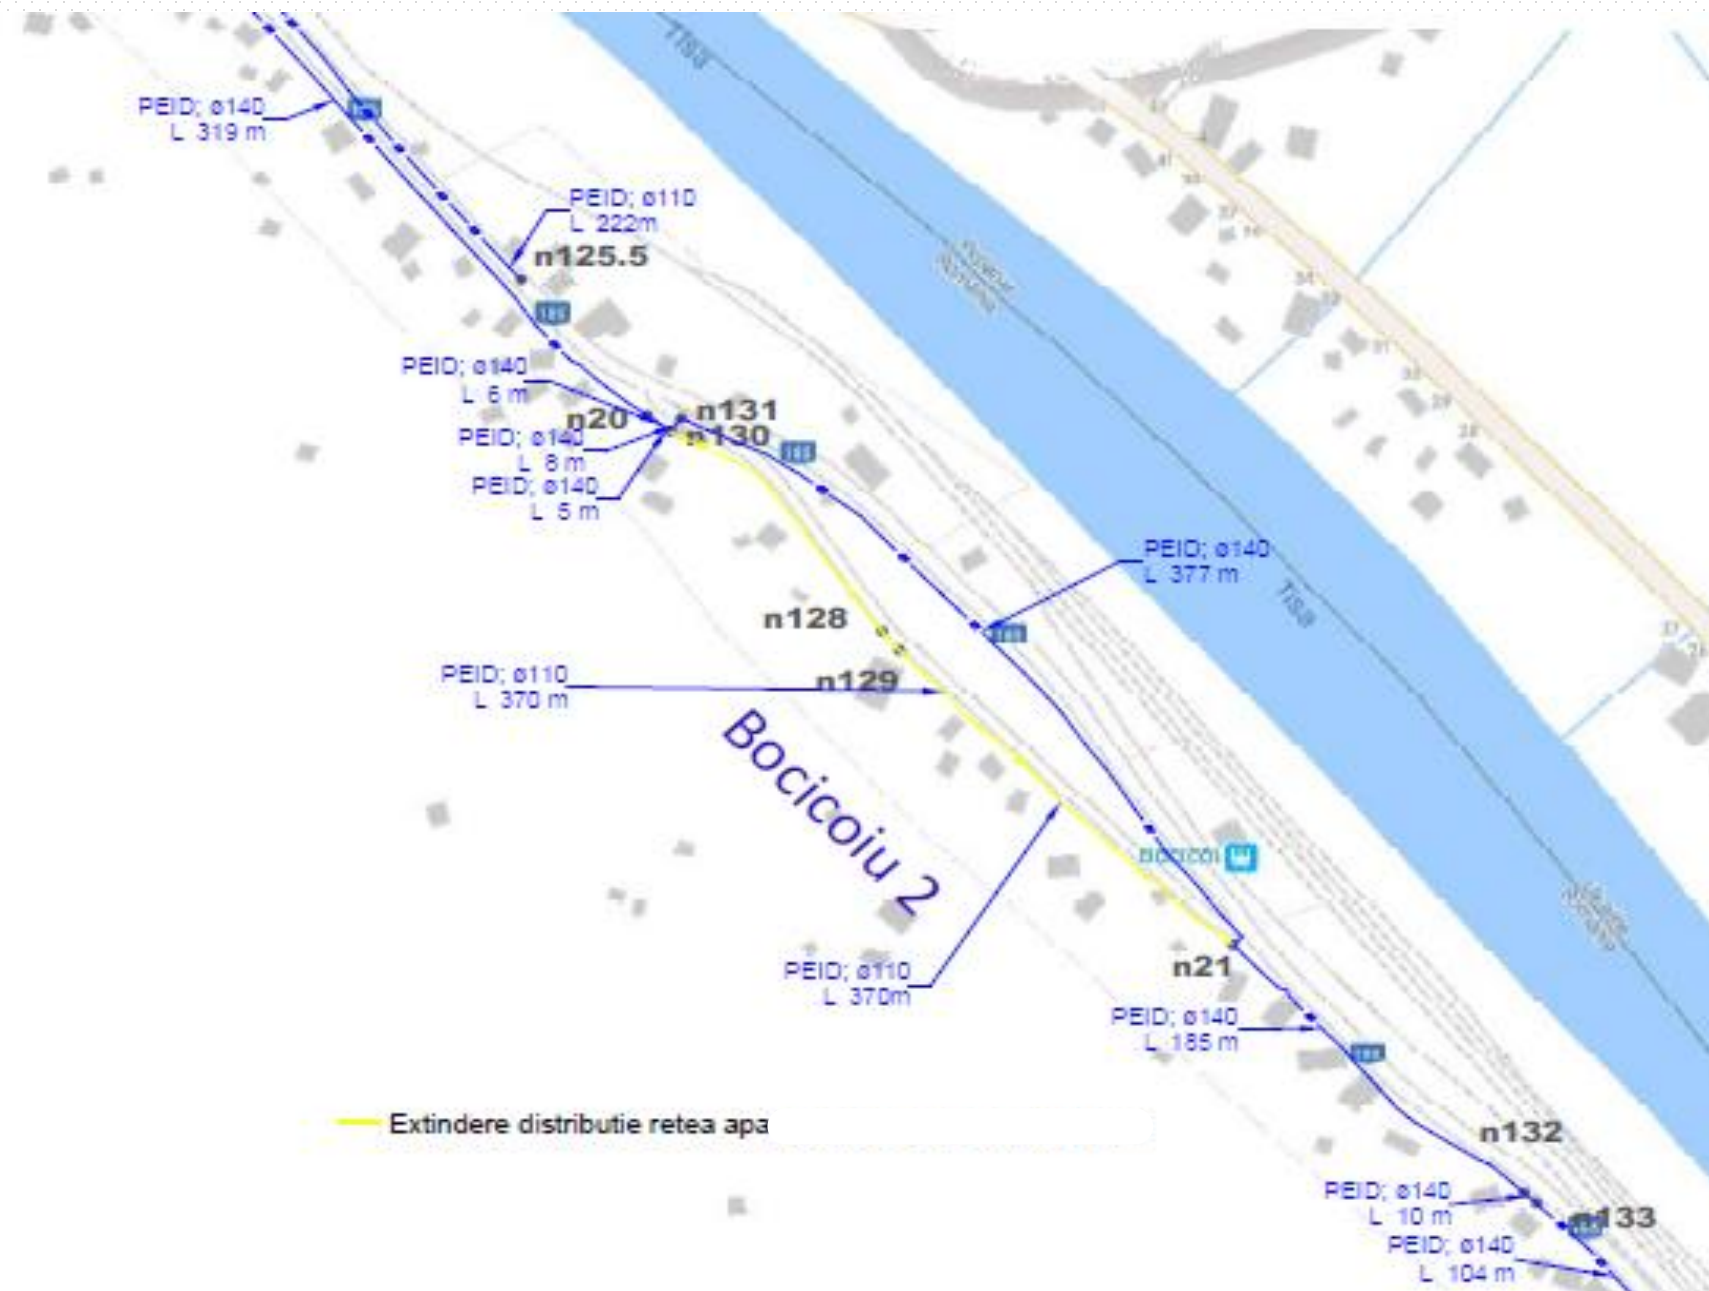


*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa




*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa uzata

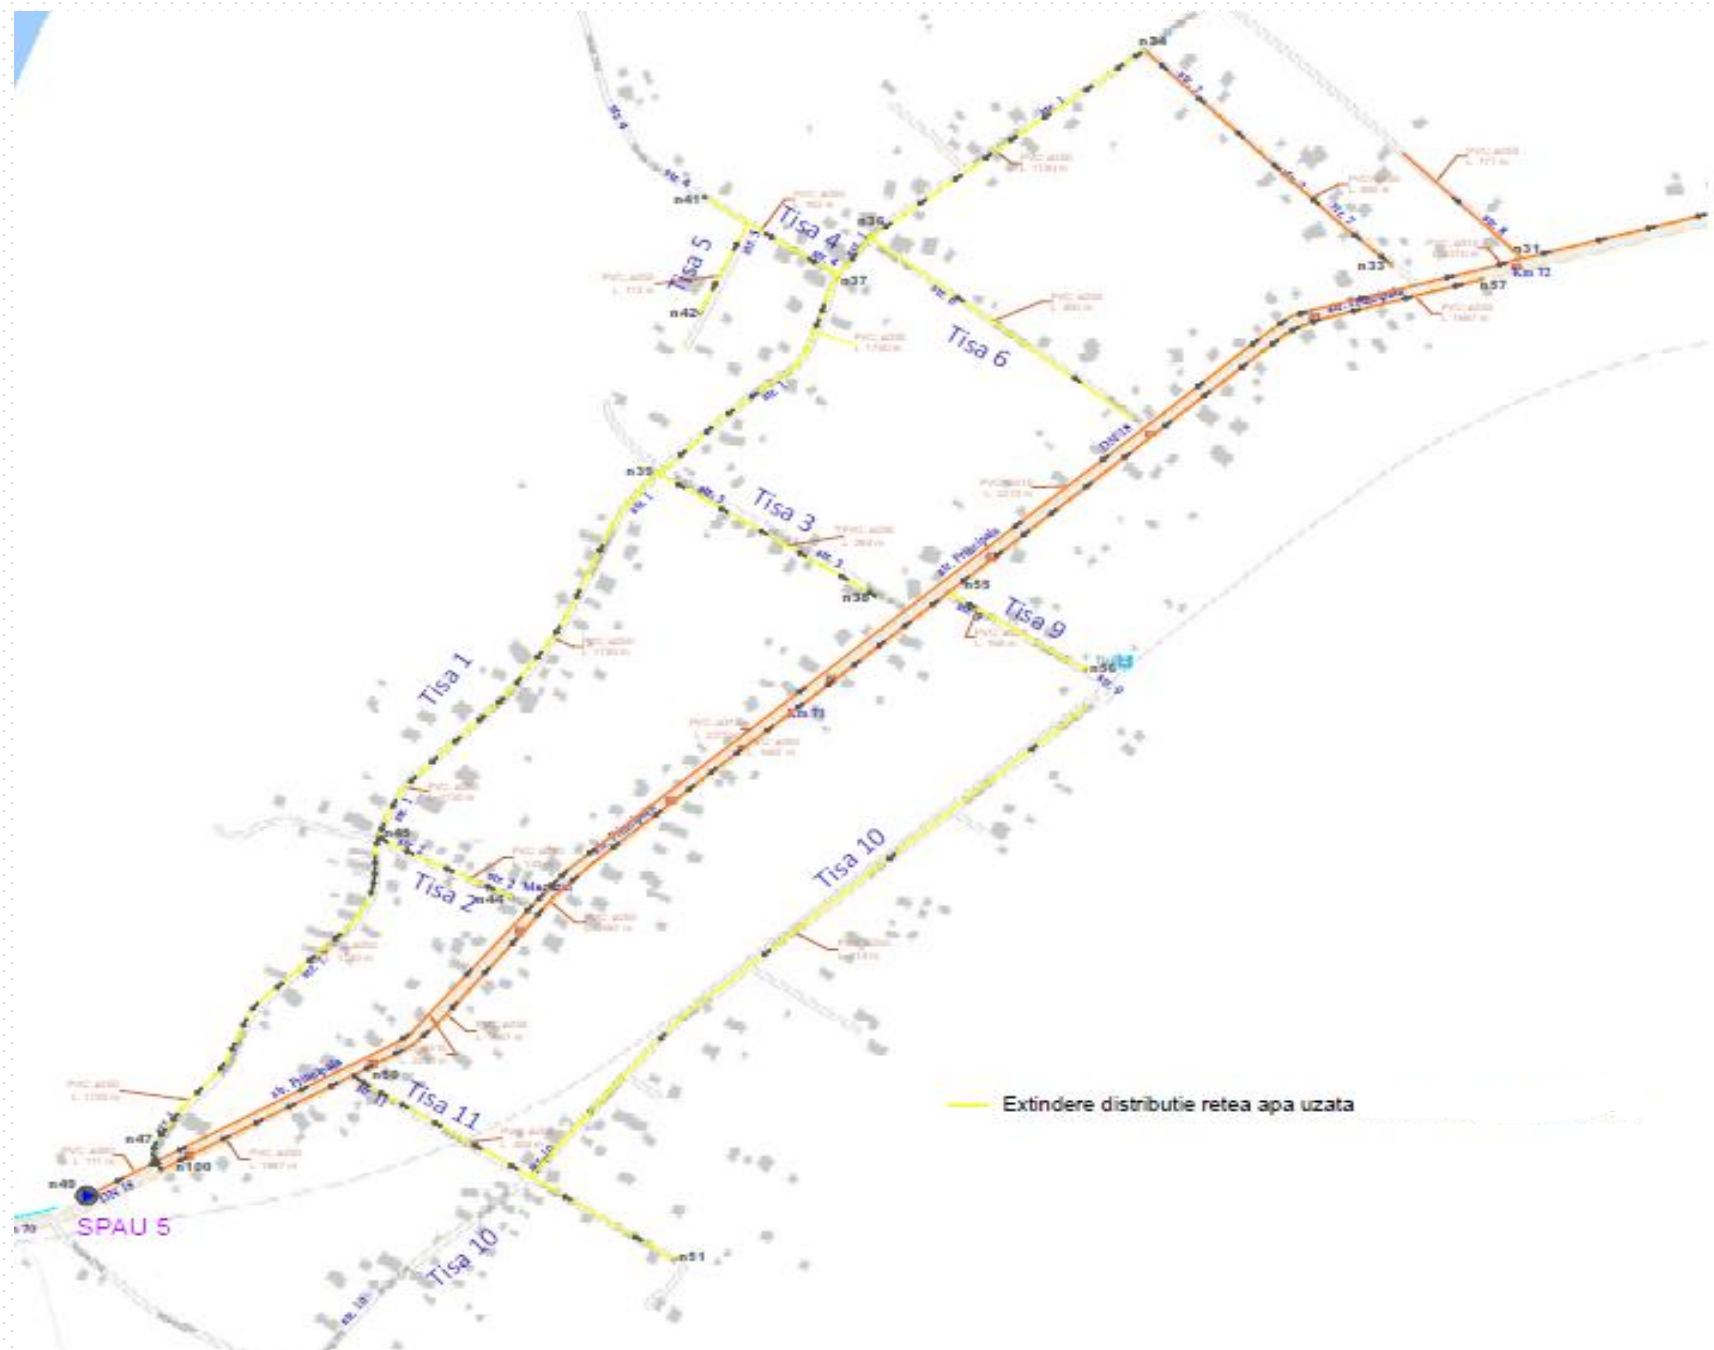

*Lucrari aflate
in executie*

BOCICOIU MARE
Apa uzata

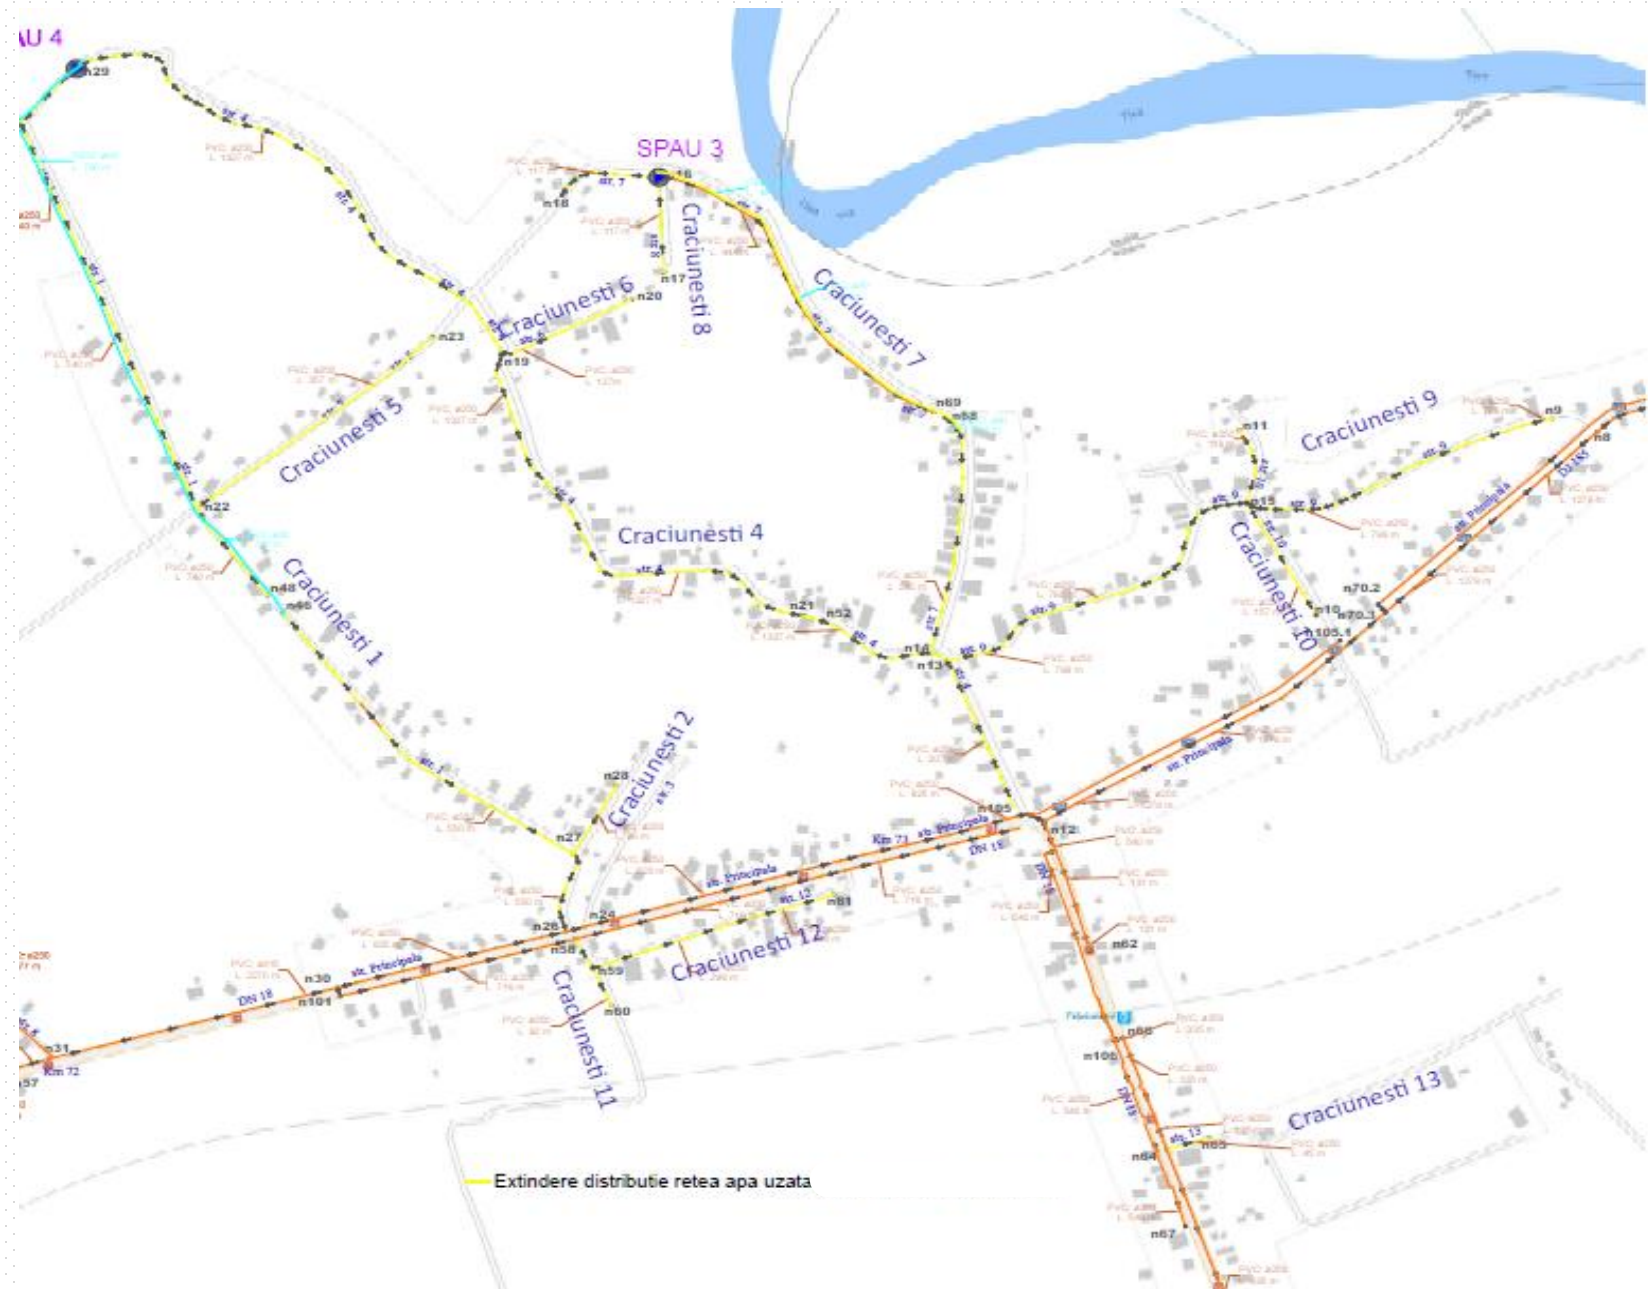

**PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR
DE REPER AFERENTE LUCRARILOR nr. 3 / 03.03.2026, nr. 6 / 29.04.2026**

- **OBIECTIV 1:**
 - Extinderea rețelei de distributie apa potabile – L = 25.119 m;
 - Statii de pompare apa potabila – 2 buc.;
 - Bransamente de retea de distributie existente: 2.910 buc.
- **OBIECTIV 2:**
 - Extinderea rețelei de colectare apa uzata – L = 21.492 m;
 - Statii de pompare ape uzate – 6 buc.;
 - Conducte de refulare SPAU – L = 914 m;

• **PROGRES FIZIC**


**POIENILE DE SUB
MUNTE**

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime (m)	Diamentru (mm)	Lungime executata pana la 30.04.2026
Obiect PDSM-2 EXTINDEREA RETELEI DE COLECTARE APA UZATA APA DIN LOCALITATEA POIENILE DE SUB MUNTE				
VS-2.1 Extindere retea de canalizare		Conform contract		
1	Str. Potocina	147	250	147
TOTAL				147

**Lucrari aflate
in executie**

POIENILE DE SUB MUNTE


Apa

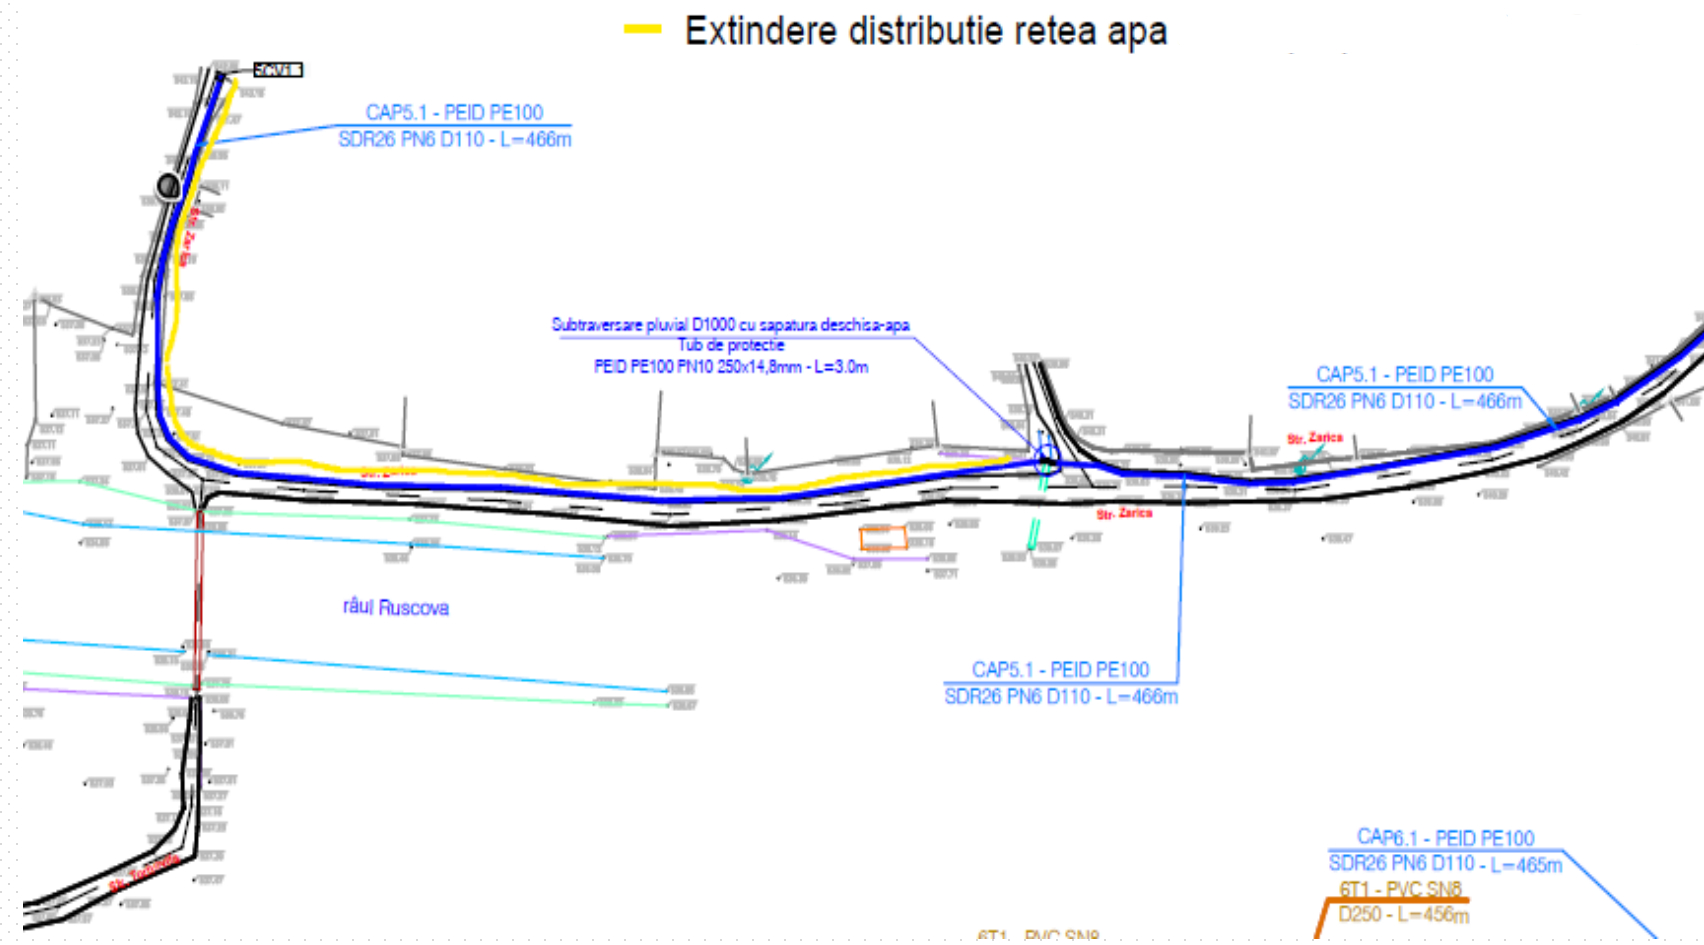

- Extindere distributie retea apa

***Lucrari aflate
in executie***


POIENILE DE SUB MUNTE
Apa

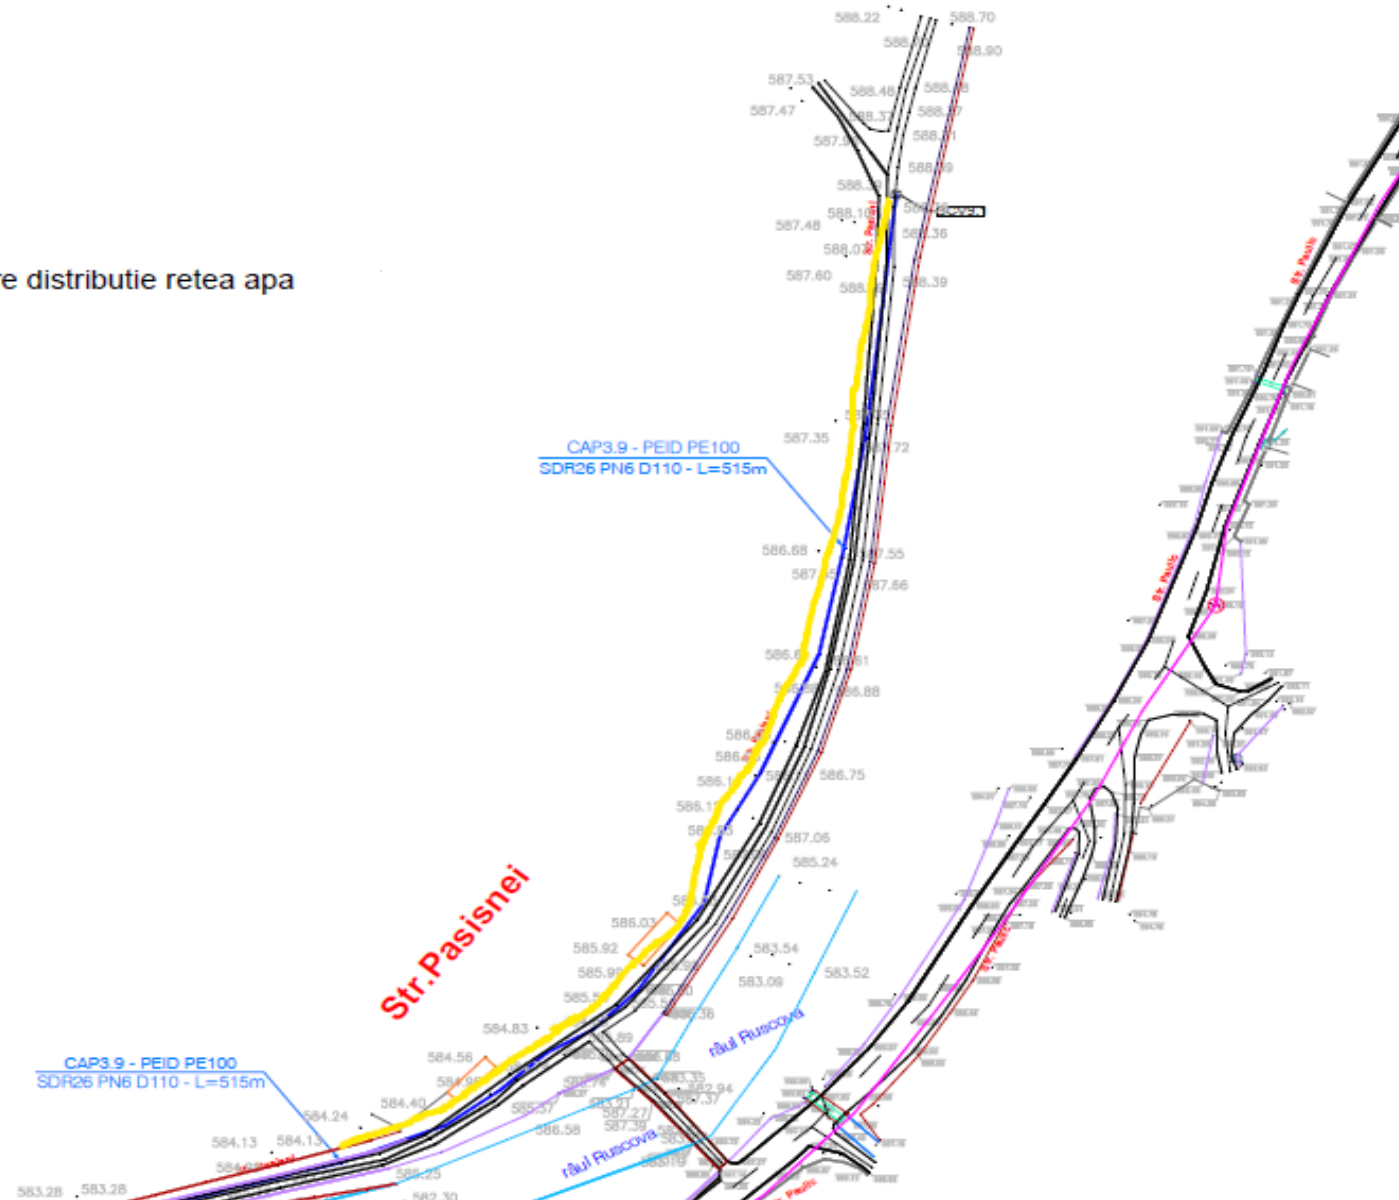

— Extindere distributie retea apa


*Lucrari aflate
in executie*

**POIENILE DE SUB MUNTE
Apa**

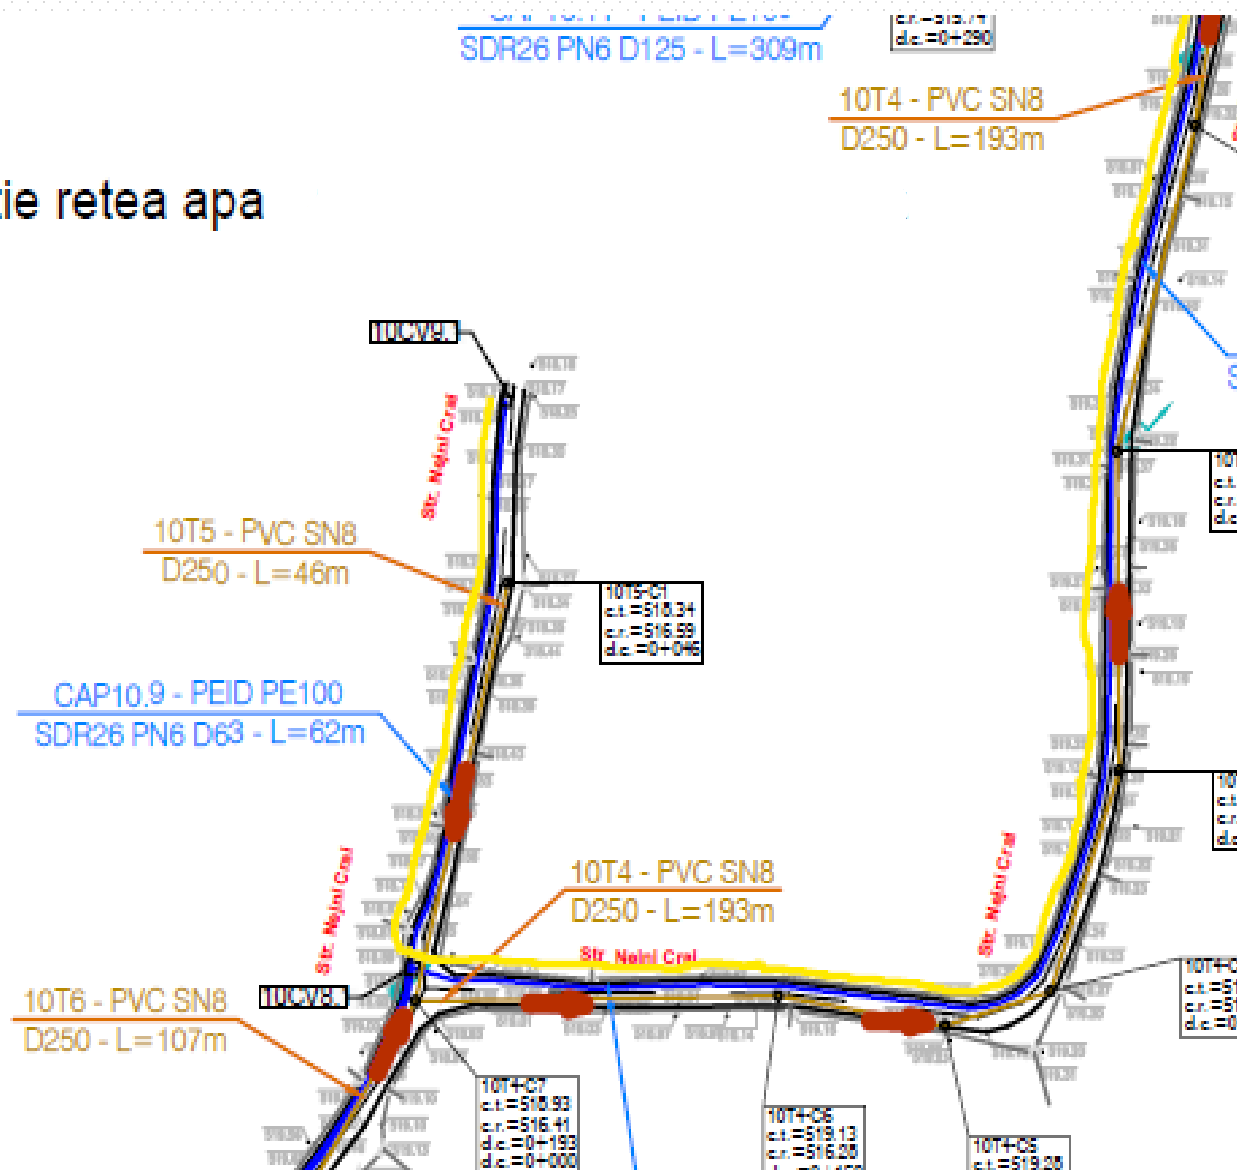


POIENILE DE SUB MUNTE

Apa uzata

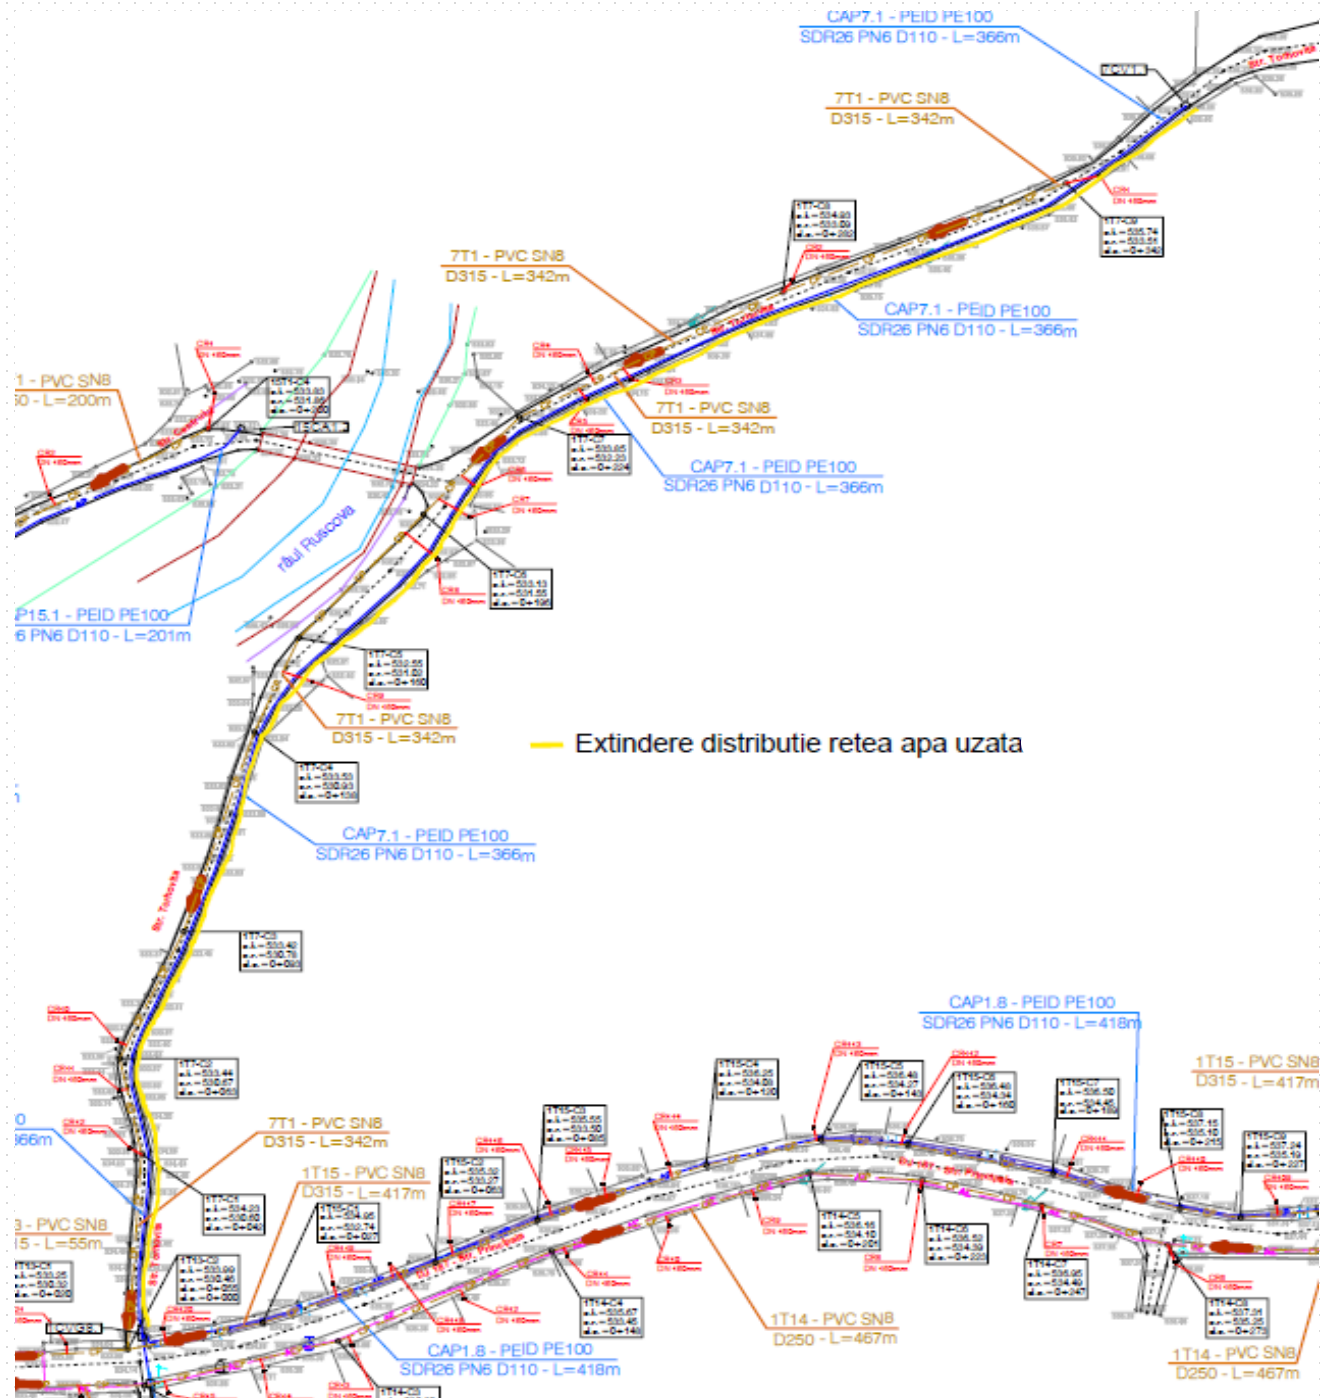

POIENILE DE SUB MUNTE
Apa uzata

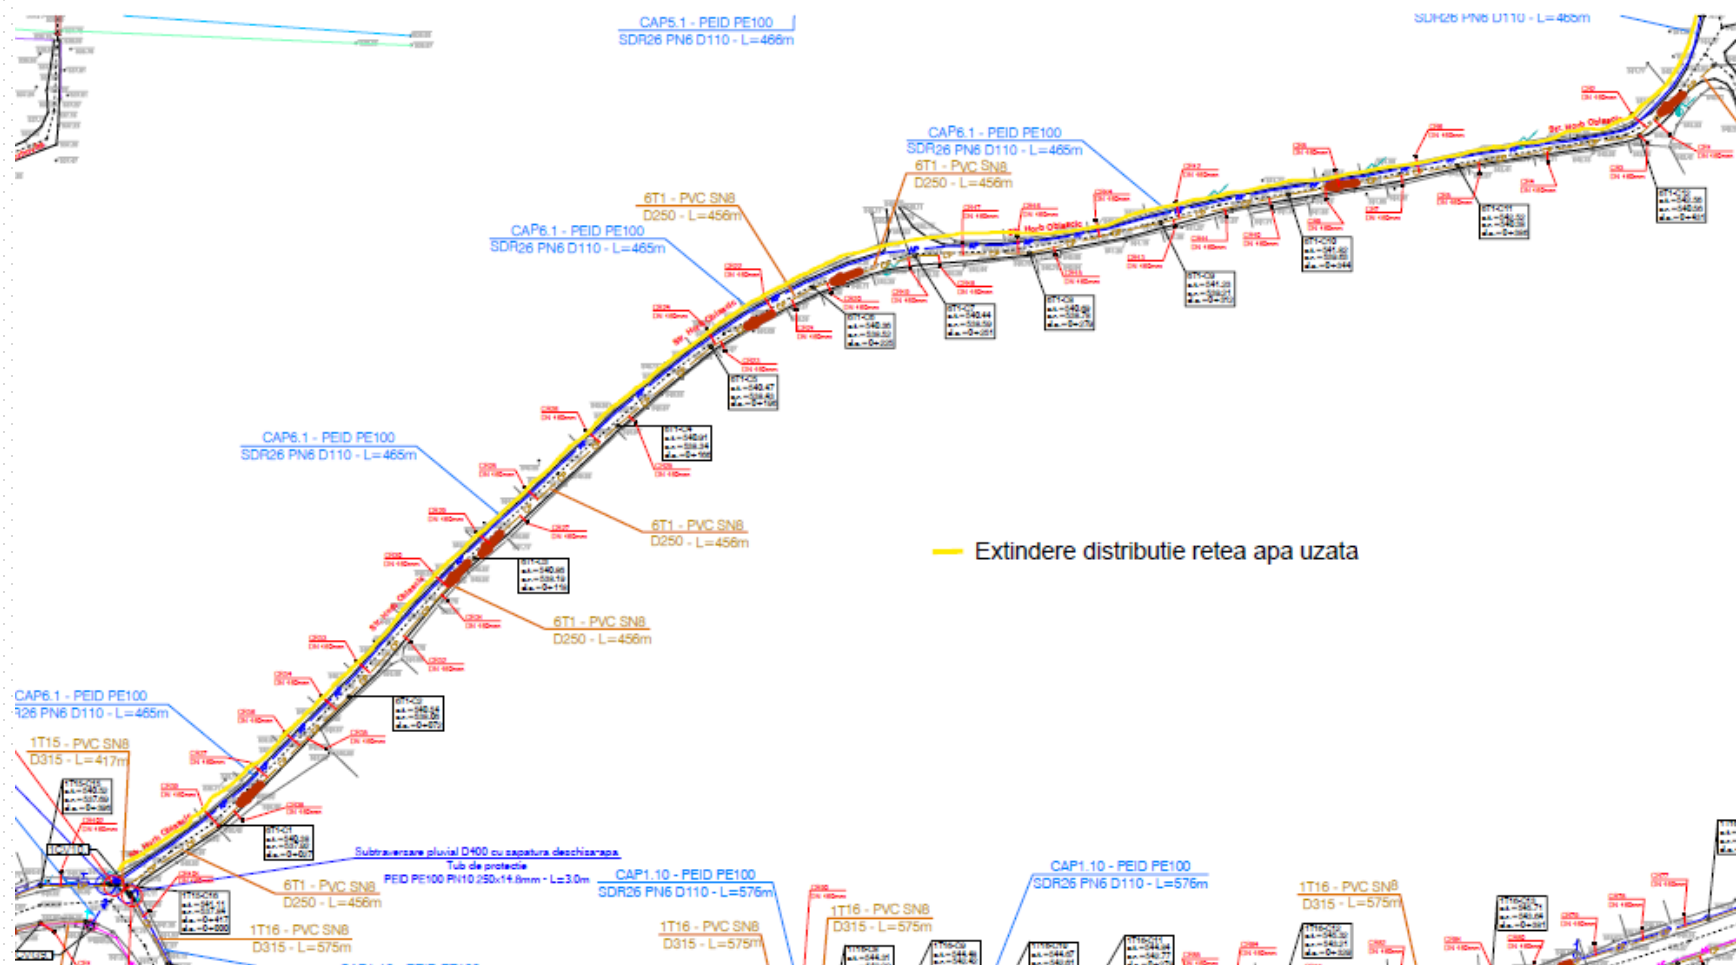


POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Exindere retea distributie apa - str. VALEA RAULUI



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Exindere retea distributie apa - str. VALEA RAULUI

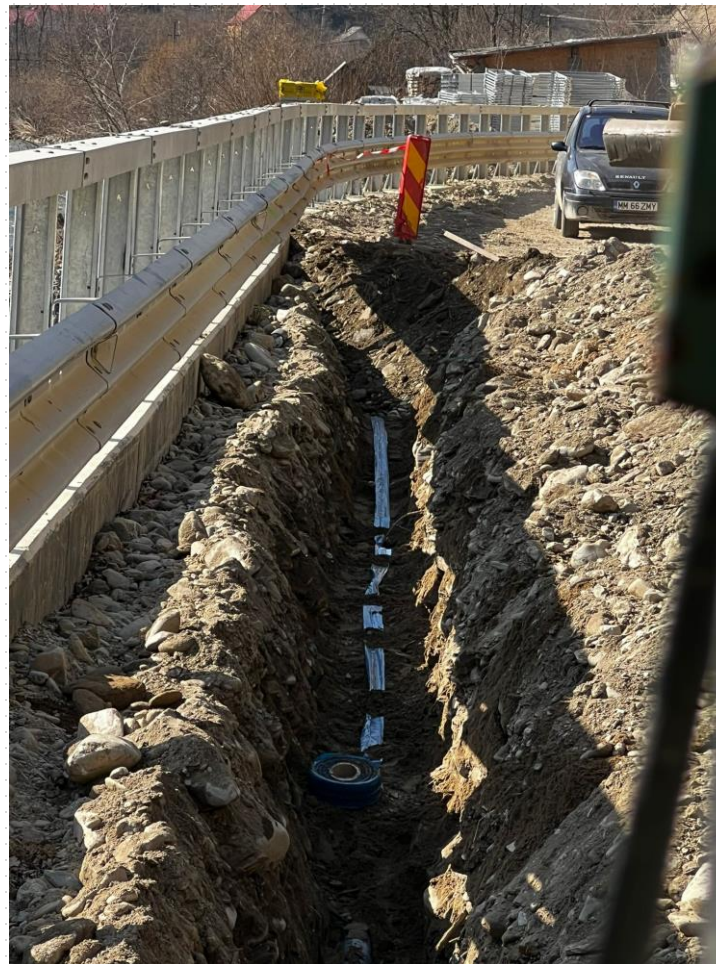


POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Exindere retea distributie apa - str. VALEA RAULUI



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Exindere retea distributie apa - str. VALEA RAULUI

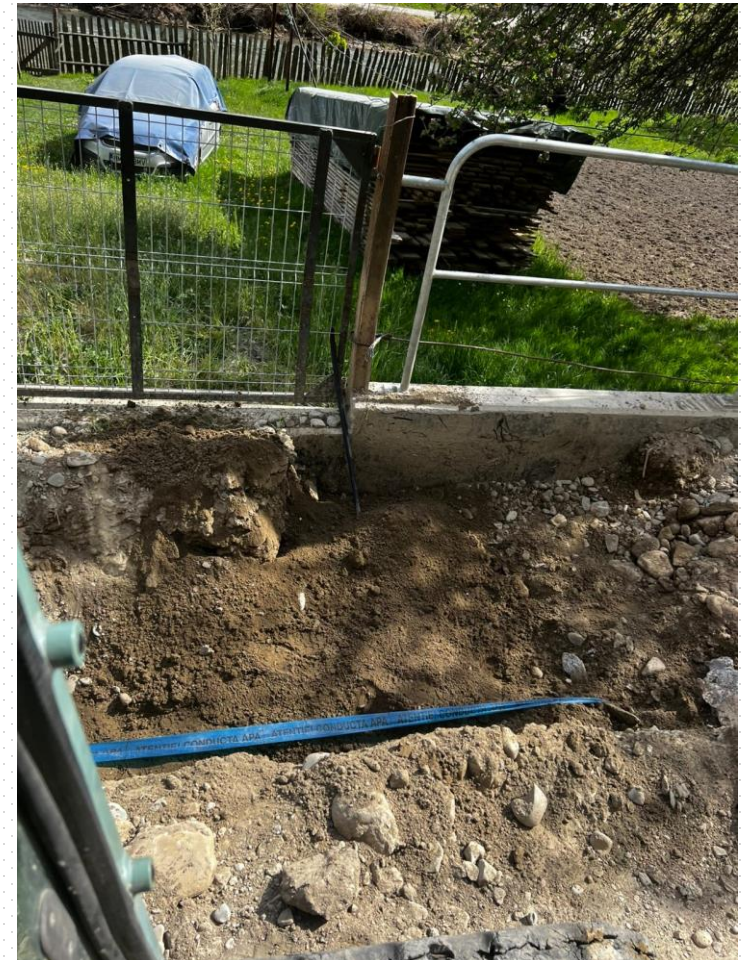

POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Reabilitare retea distributie apa - str. Branduselor 2 Tr 1

Extindere retea canalizare – str. Branduselor Tr1/ Extindere conducte refulare apa uzata SPAU 6 – str. Branduselor 2 TR1



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea canalizare – str. Mierlei 5 Tr 1



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS

Extindere retea canalizare – str. Mierlei 4Tr 1



POZE EXECUTIE UAT VISEU DE SUS
Extindere retea canalizare – str. Mierlei 4 Tr 1/Mierlei 2 Tr 3



POZE EXECUTIE UAT POIENILE DE SUB MUNTE

Extindere retea distributie apa – str. Potocina



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea distributie apa – str. Lunca



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea distributie apa – str. Tisa




POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Tisa



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Tisa

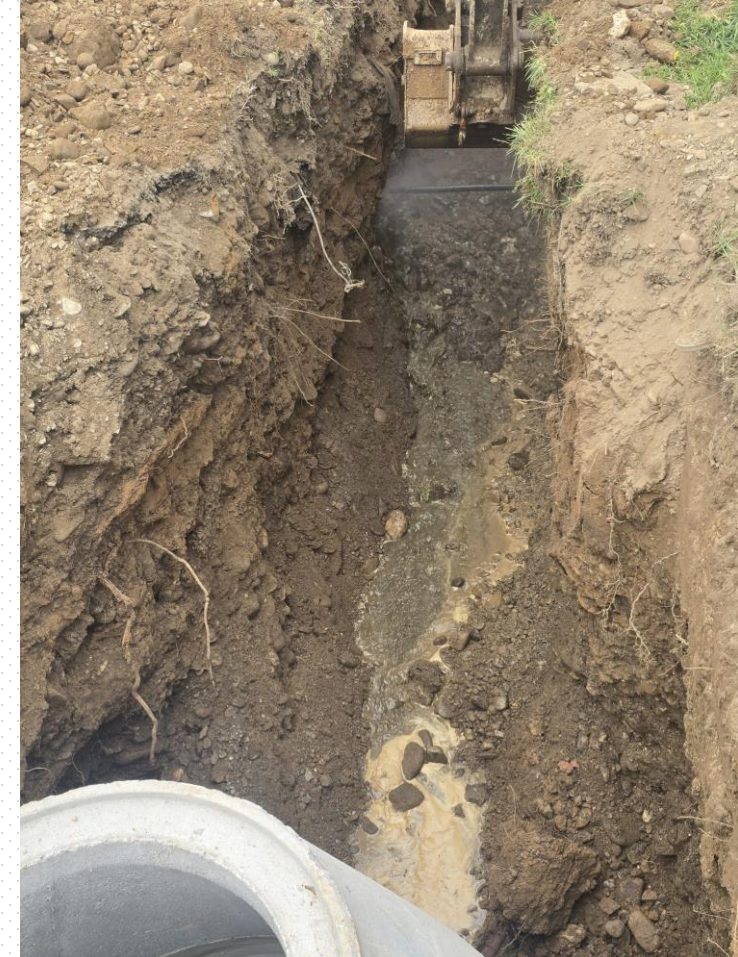

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Tisa



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Tisa




POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Craciunesti





POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Craciunesti

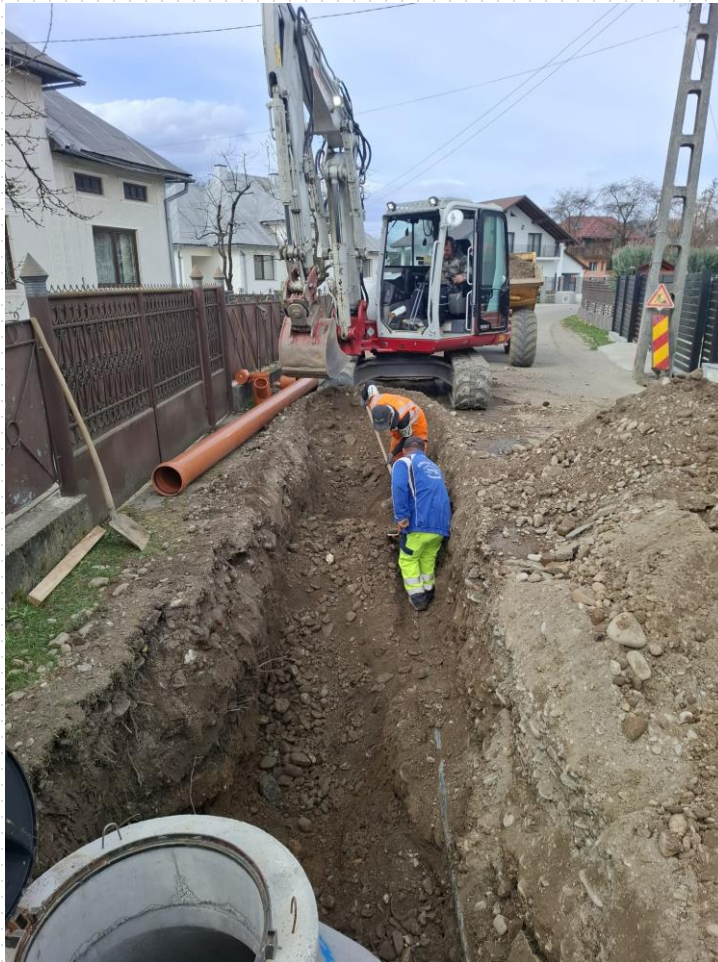


POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Craciunesti

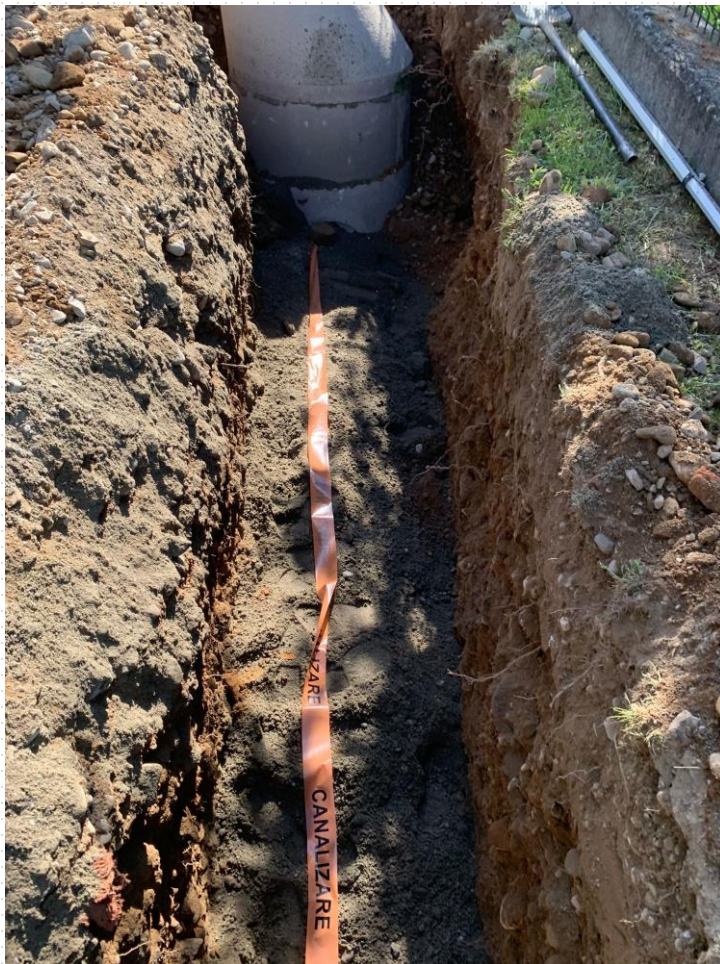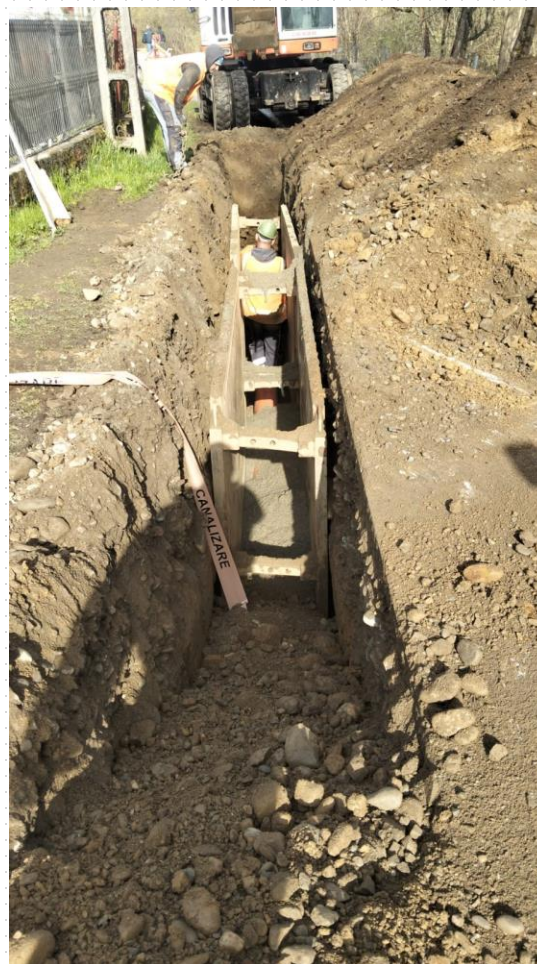

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Craciunesti

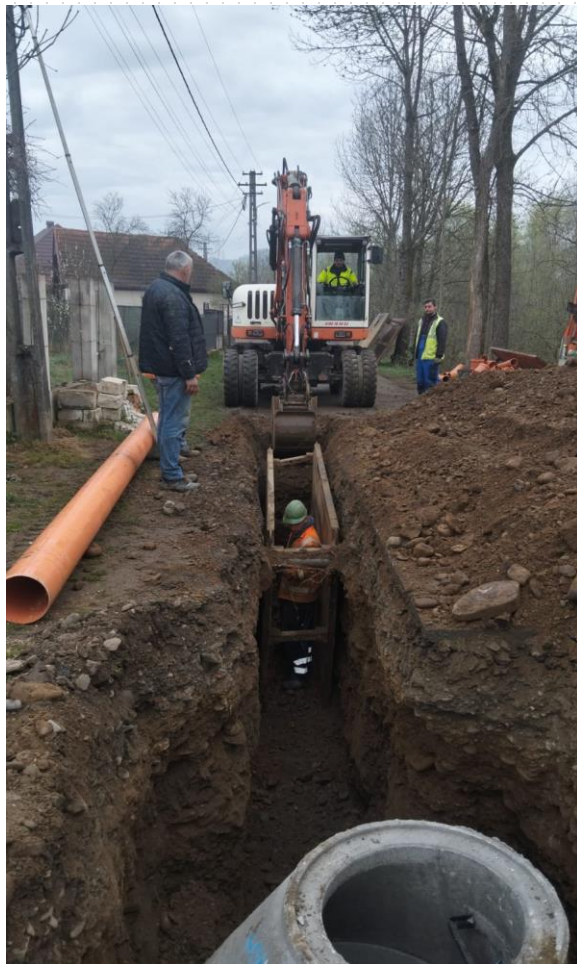

POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – DJ Craciunesti / Bocicoiu Mare



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – DJ Bocicoiu Mare



POZE EXECUTIE UAT BOCICOIU MARE

Extindere retea de canalizare – str. Bocicoiu 2

