

MM-CL-09 - Retele apa si apa uzata: Sighețu Marmatiei, Vadu Izei, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti

BENEFICIAR: SC VITAL SA BAIA MARE

**ANTREPRENOR: ASOCIEREA EUSKADI SRL – AMI SA –
ORIZONT SIGHEȚU MARMĂȚIEI SRL**

SUBANTREPRENORI APROBAȚI:

- **SEBI MARC SRL SIGHEȚU MARMATIEI**
- **NORD TOP CONSTRUCT SRL SIGHEȚU MARMATIEI**
- **URS CONSTRUCT ALBA SRL**



CL-09

UAT SIGHETU MARMATIEI & UAT REMETI

SUBCONTRACTANT: SEBI MARC S.R.L.



Stadiu actual

Sighetu Marmatiei

Strada	Diametru	Lungime cf. ctr.	Total executat	Progres fizic la data prezentei [%]
Reabilitare retea de apa / Solovanului	110	727	297	40.9%
Reabilitare canalizare Solovanului	315 160	477 600	325 43	69.1% 7.2%

Remeti – fara progres

Imagini Reprezentative

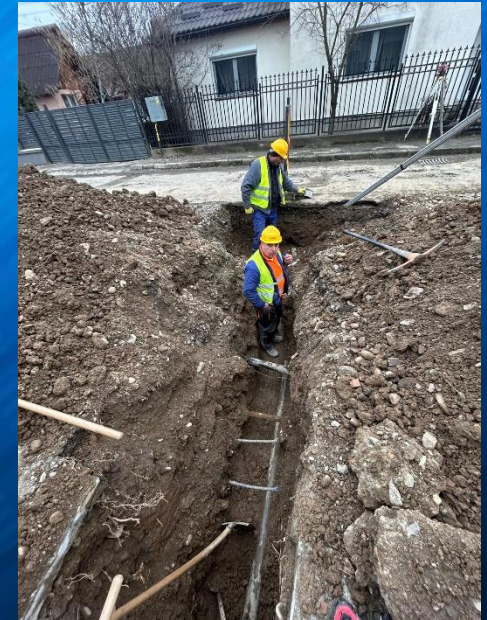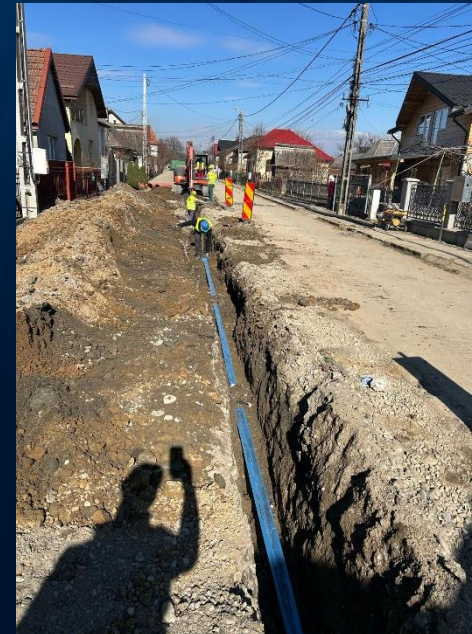



CL-09

UAT VADU IZEI & UAT SARASAU
SUBCONTRACTANT: NORD TOP CONSTRUCT S.R.L.

Stadiu actual

Vadu Izei

Strada	Diametru	Lungime cf. ctr.	Total executat	Progres fizic la data prezentei [%]
Extindere retea apa / Sugau	110	9393	24	0.3%
Extindere conducta transport	160	1589	320	20.1%
Extindere canalizare / Sugau	250	8989	30	0.3%
Extindere canalizare / Str. Batrana	250	1015	60	5.9%

Imagini reprezentative



25 feb. 2026 13:58:47
47.888986666666675 23.9362950000000005
54° NE
Strada Zăvoi
Altitude: 321.8msnm
Speed: 0.0km/h
vital CL09. - Bătrâna



CL-09

UAT CAMPULUNG LA TISA
SUBCONTRACTANT: URS CONSTRUCT

Stadiu actual

Campulung la Tisa

Strada	Diametru	Lungime cf. ctr.	Total executat	Progres fizic la data prezentei [%]
Extindere canalizare / 1 Mai Tr 2	250	359	152	42.3%
Extindere canalizare / Muncii Tr 1	250 160	277 120	44 12	15.9% 10.0%

Imagini reprezentative

