

**MM–CL–05 – Proiectare și execuție
(inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii
10/1995)**

**Sistem transport apă potabilă
Baia Mare – Tăuții Măgherauș – Cicârlău – Seini**


Baia Mare, 18.06.2026

INFORMAȚII GENERALE

2

Antreprenor: Asociera ARL Cluj S.A. – CONSTRUROM S.A.
Valoare: 47.951.844,14 lei fără TVA
Tip Contract: HG1/2018 – Proiectare și Execuție
Proiectare: 6 luni
Execuție: 27 luni
Garanție: 60 luni

- Conducta de transport are punctul de conectare și pornire în zona Variantei Ocolitoare și traversează Nordul localității Săsar și Bozânta Mare.
- În localitatea Bozânta Mare apare prima ramificație secundară care merge spre Ardușat. Aceasta traversează localitățile Bozânta Mică, Arieșu de Câmp și după traversarea râului Someș ajunge la Gospodăria de apă existentă din Ardușat.
- Conducta principală de transport traversează localitățile Bușag și Tăuții Măgherauș. În localitatea Tăuții Măgherauș apare a doua ramificație care va alimenta GA Hoșteze.
- Firul principal traversează apoi localitățile Cicârlău și Ilba unde apare a 3-a ramificație pentru alimentarea Gospodăriei de apă Ilba.
- Din localitatea Ilba conducta de transport urmează traseul spre Gospodăria de apă Seini.
- Pe traseu, rețeaua de transport alimentează 8 rezervoare atât noi, cât și reabilite.

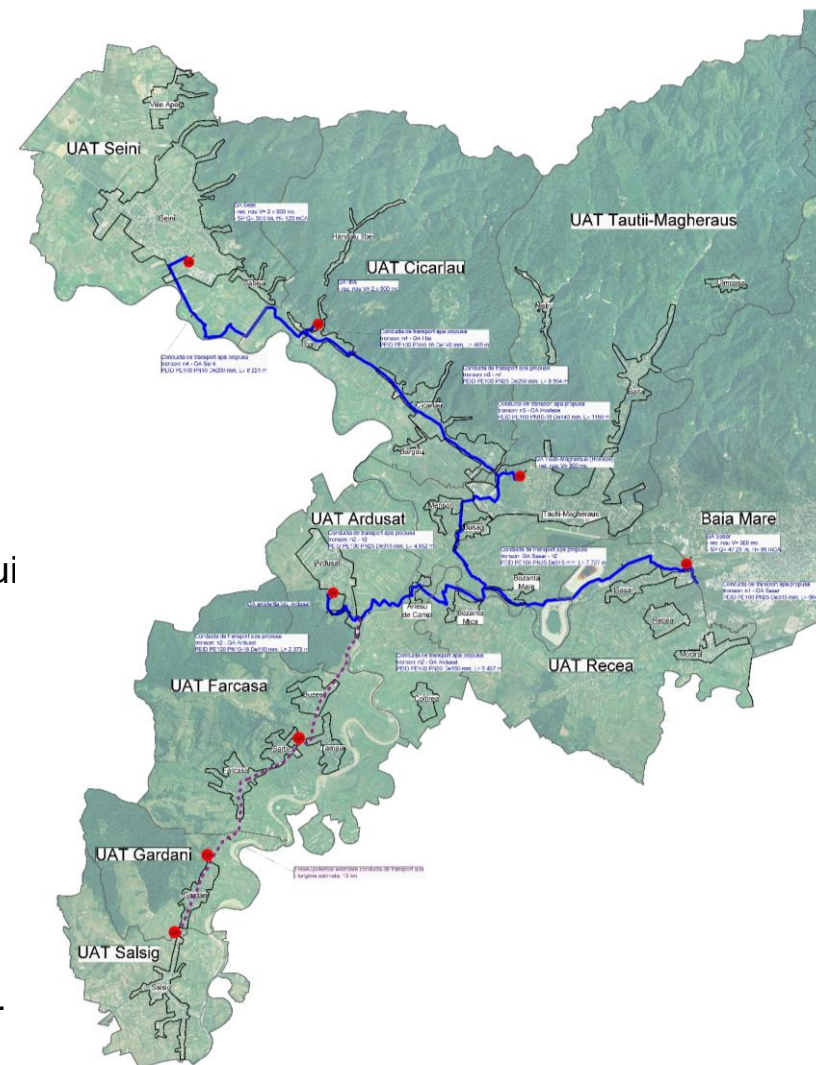

- Obținerea puncte de vedere de la proiectanții șoselelor de centura / drumuri expres;
- Depunere documetație pentru obținerea Certificatului de Urbanism pe noul traseu prin adresa 87. OUT_MM_CL05_02.06.2026;
- S-a trasat rețeaua, calculul hidraulic preliminar si continuăm cu documentațiile pentru obținerea avizelor pana la emiterea noului Certificat de Urbanism;

Studii de teren in lucru(Studii topografice si geotehnice)

Expertizarea tehnica a rezervoarelor de la Ardusat;
