



Sedinta lunara de progres MARTIE 2026

*PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES
SMIS+ 322218*

**MM-CL-10 „ Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus,
Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte ”**

MM-CL-10 „*Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte*”

• 1. DETALII CONTRACT

- Contract nr. 196/28.07.2025 MM-CL-10 „*Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte*”
- Program
 - « *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Maramures* », finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Dezvoltare Durabila 2021 - 2027
- Contractor
 - *Asocierea PRODEXIMP SRL – ALAVAL PROD COM SRL – DACIA ASPHALT SRL*
- Valoarea Contractului LEI
 - **175.247.779,82 lei (fara TVA)**
- Data acordului
 - **28.07.2025**
- Autorizatie de construire
 - **Nr. 37 din 26.09.2025**
- Autorizatie de construire organizare de santier
 - **UAT Viseu de Sus – Nr. 2 din 30.01.2026**
 - **UAT Bocicoiu Mare – Nr. 3 din 28.01.2026**
 - **UAT Poienile de Sub Munte – Nr. 1 din 12.02.2026**
- Durata contractului:
 - **30 LUNI**
- Perioada de garantie
 - **36 LUNI**

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPER AFERENTE LUCRARILOR NR. 1 DIN 27.02.2026

- OBIECTIV 1:

- Reabilitare conducta de transport apa potabile – L = 676 m;
- Extindere conducta de transport apa potabile – L = 5.202 m;
- Reabilitare retea de distributie apa potabile – L = 1.595 m;
- Extindere retea de distributie apa potabile – L = 20.570 m;
- Extindere statii de pompare apa potabile – L = 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA1 (existenta) – Str. Aurel Vlaicu: reabilitare rezervor inmagazinare 1.000 m² – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA2 (noua) – Str. Frasinului: rezervor nou inmagazinare 250 m² – 1 buc. si statie noua clorinare – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA3 (noua) – Str. 1 Mai: statie noua de pompare Q_p = 5 l/s, H_p = 200 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon – 150m² – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA4 (noua) – Str. Randunelelor (DN18): statie noua pompare Q_p = 5 l/s, H_p = 60 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon 150 m² – 1 buc. si statie noua de clorinare - 1 buc.
- Front de captare existent: reabilitare rezervor 150 m³, reabilitare rezervor de inmagazinare 150 m³ = 1 buc.


- OBIECTIV 2:

- Extindere retea canalizare – L = 9.417 m;
- Extindere statii de pompare apa uzata si conducte de refulare apa uzata - 8 buc. SPAU, L = 1.641 m

WISEU DE SUS


*Lucrari propuse
in prima faza*

WISEU DE SUS
Apa

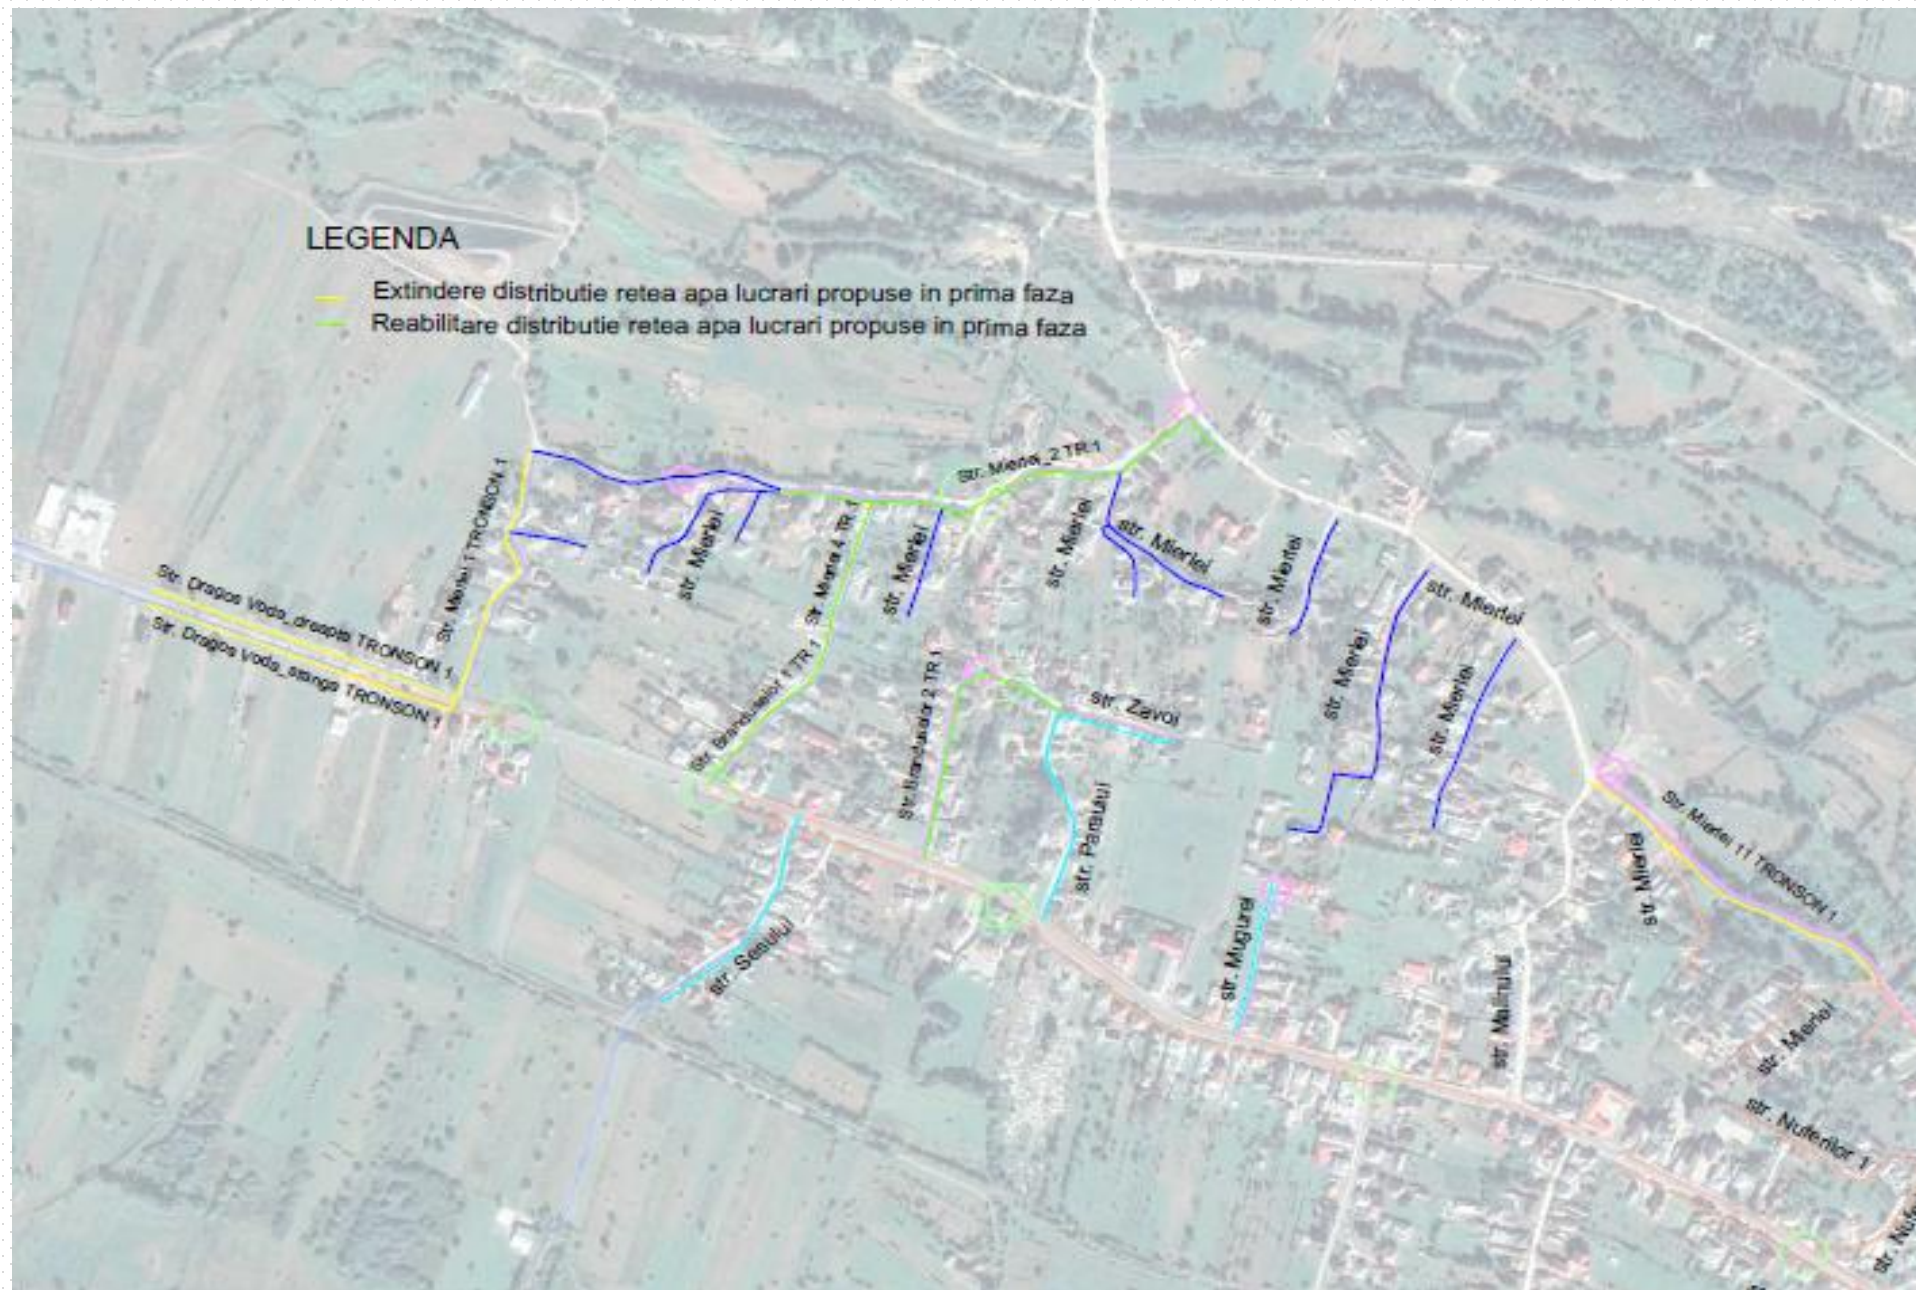


*Lucrari propuse
in prima faza*

WISEU DE SUS
Apa

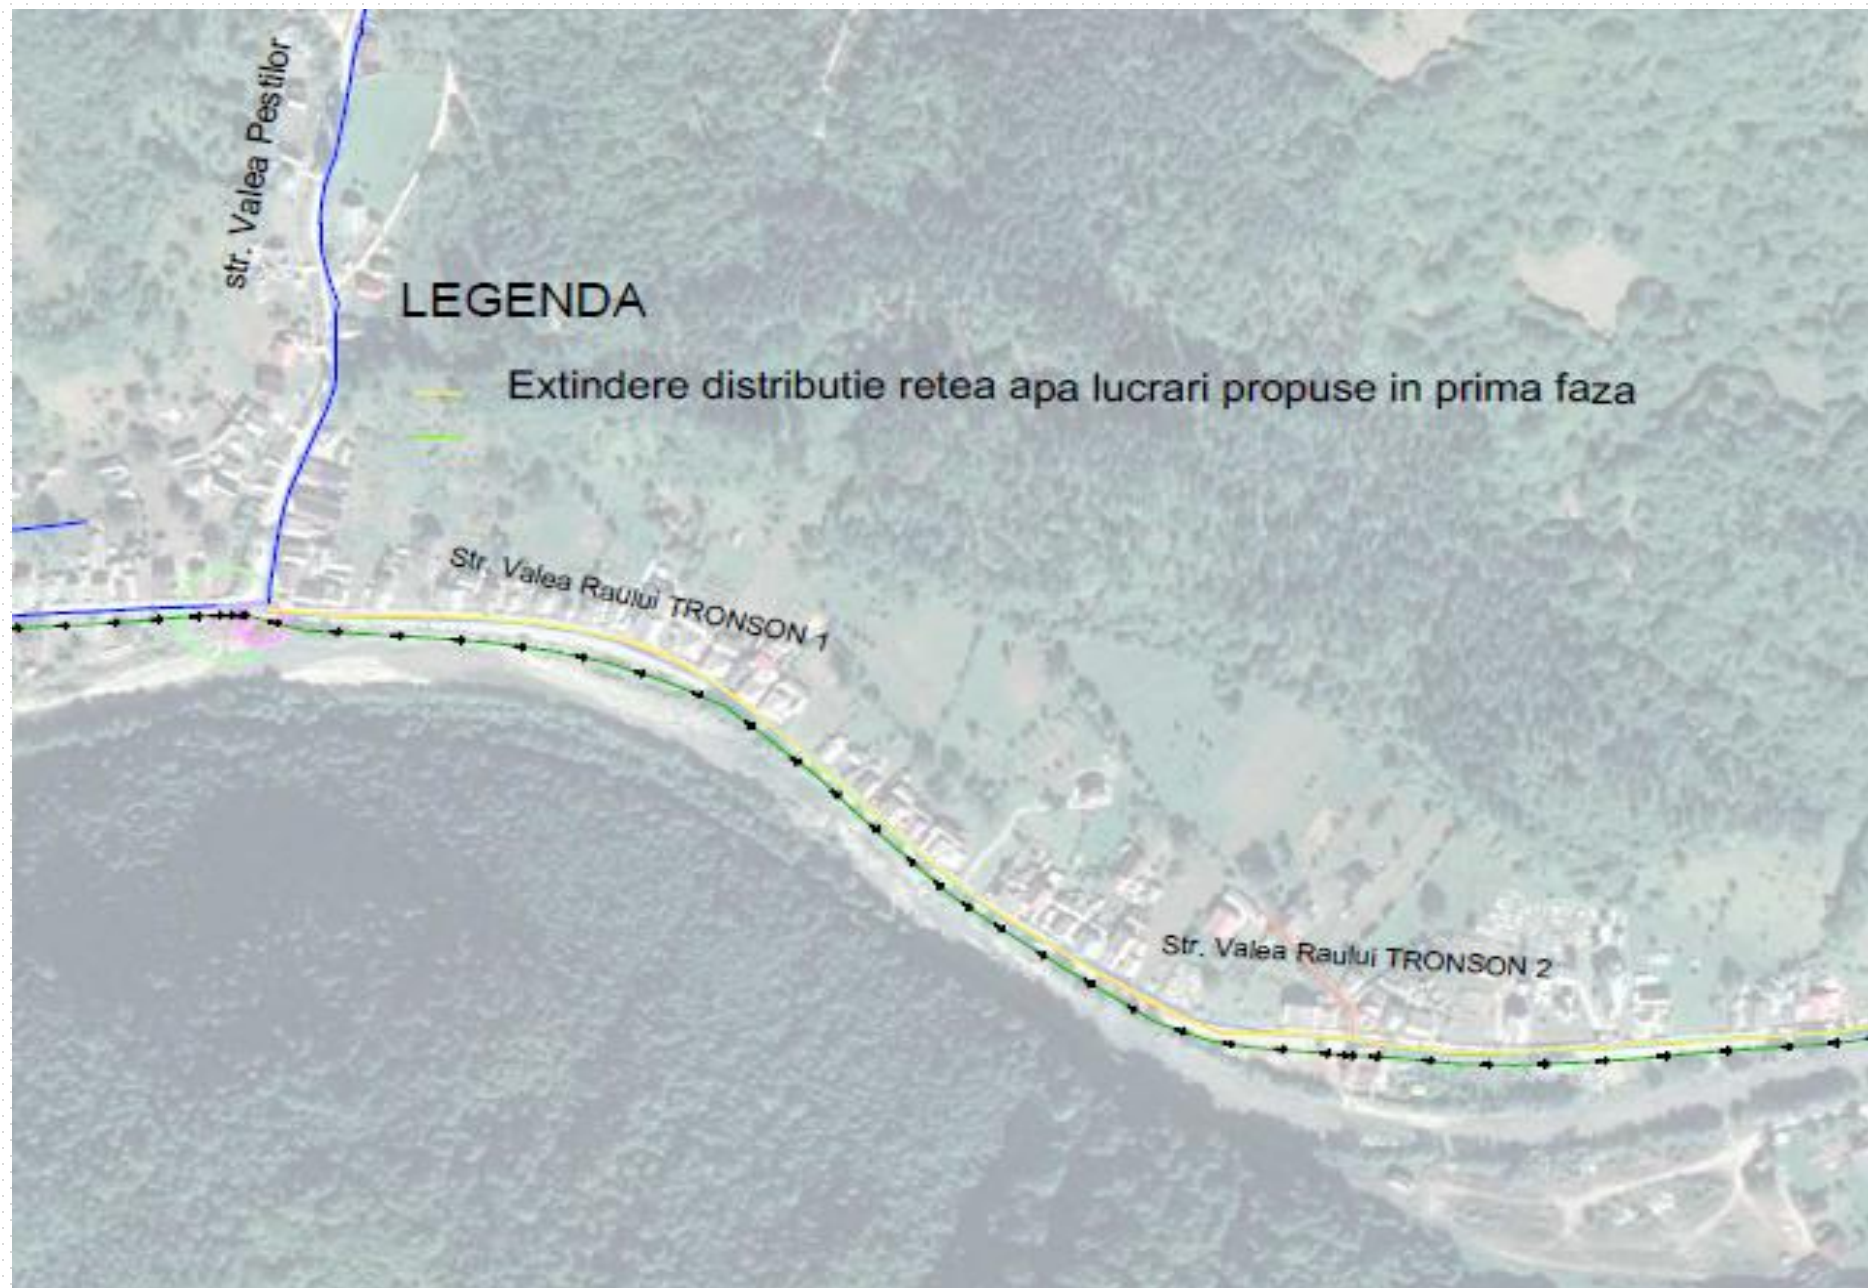

*Lucrari propuse
in prima faza*

WISEU DE SUS
Apa

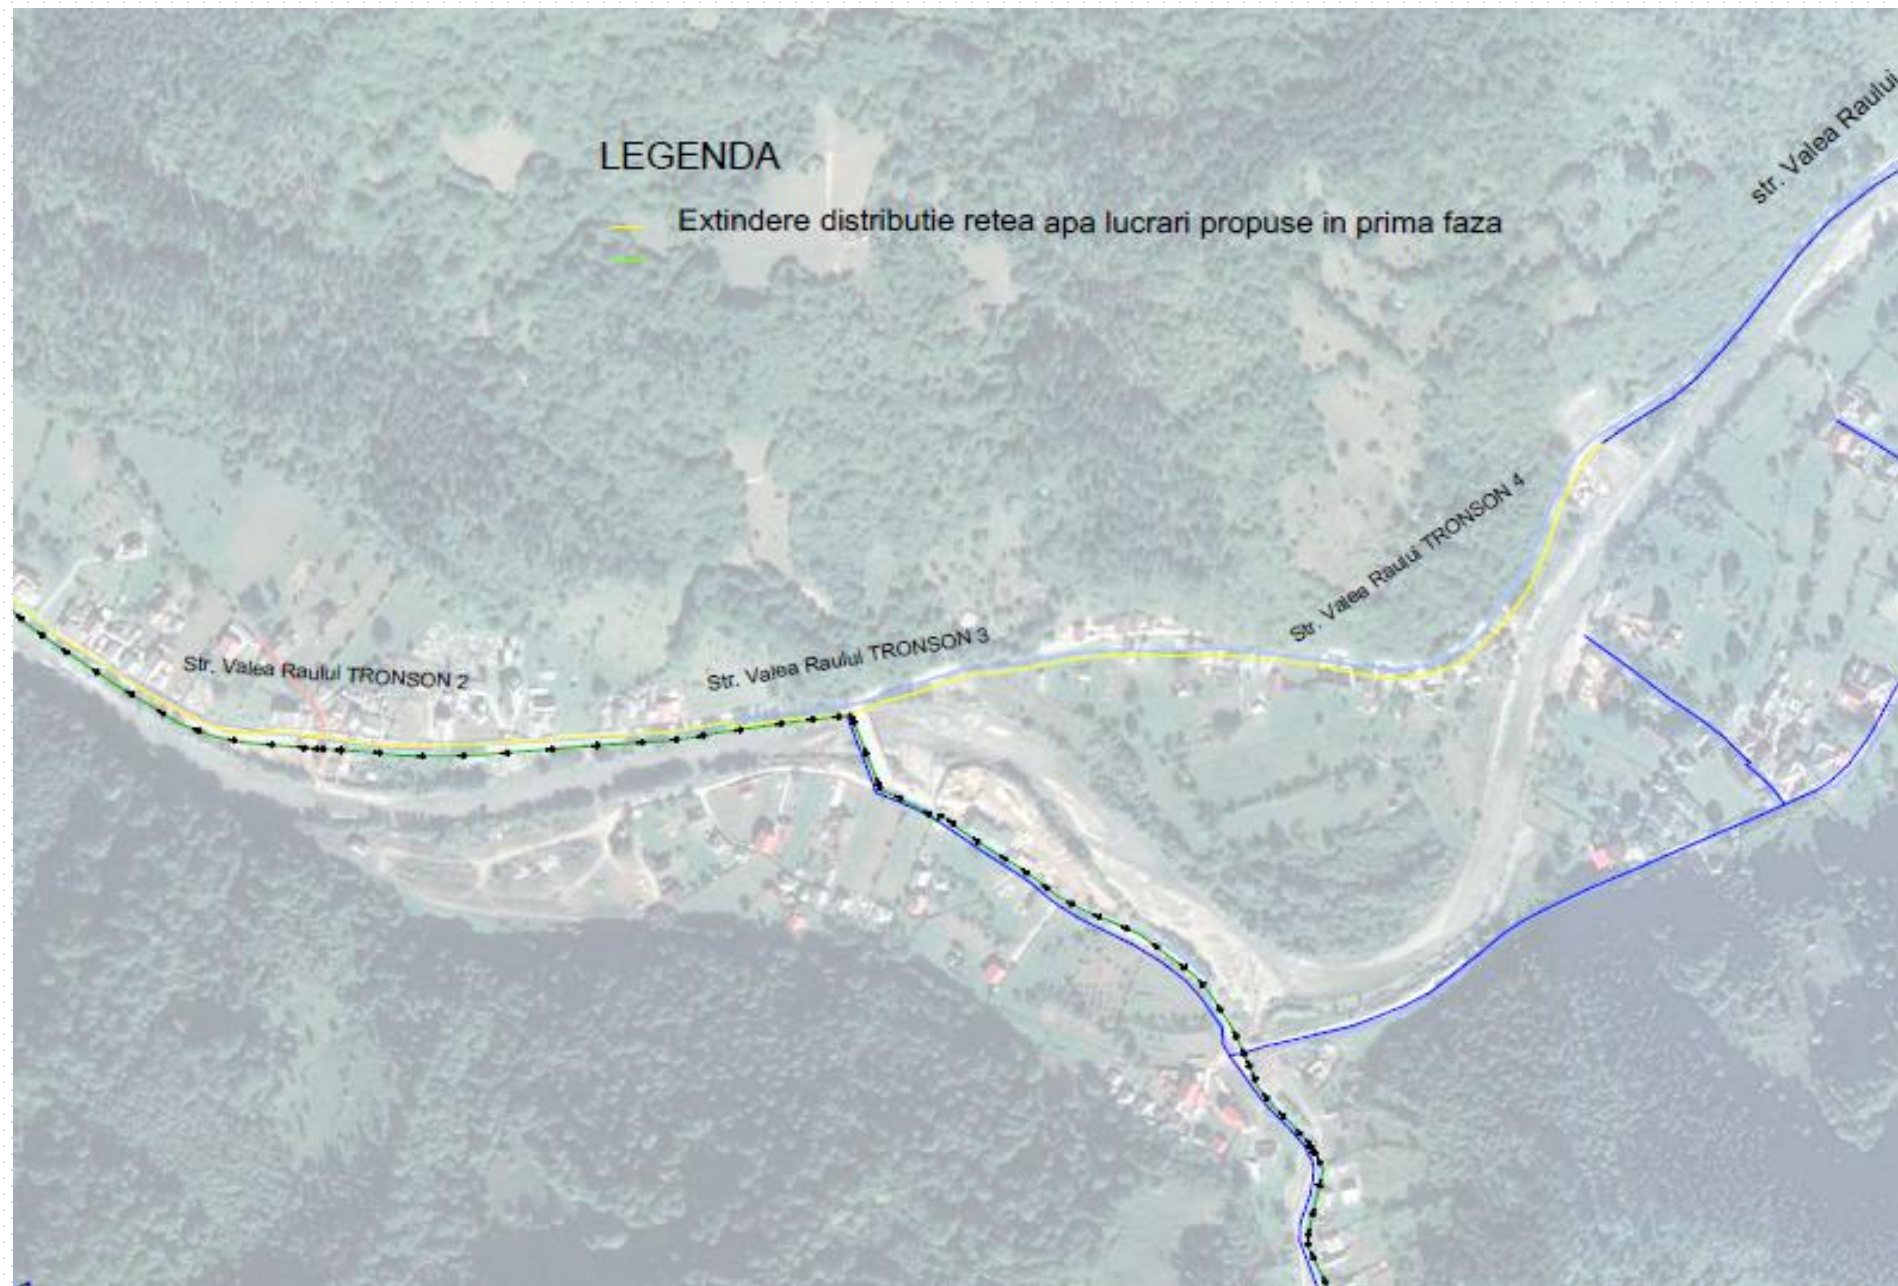

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPER AFERENTE LUCRARILOR NR. 2 DIN 02.03.2026

• OBIECTIV 1:

- Extindere retea de distributie – L = 31.773 m;
- Statie de pompare GA Craciunesti – 1 buc.;
- Gospodaria de apa: rezervor nou de inmagazinare 500 m³ – 2 buc.;
- Statie noua de clorinare – 1 buc.;
- Conducta de transport apa potabile – L = 3.201 m;

• OBIECTIV 2:

- Extinderea sistemului de apa uzata – L = 23.486 m;

• OBIECTIV 3:

- Statie de pompare apa uzata SPAU 1 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 2 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 3 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 4 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 5 – 1 buc.;


• OBIECTIV 4:

- Conducta refulare SPAU 1 – Lref = 676 m;
- Conducta refulare SPAU 2 – Lref = 637 m;
- Conducta refulare SPAU 3 – Lref = 637 m
- Conducta refulare SPAU 4 – Lref = 637 m
- Conducta refulare SPAU 5 – Lref = 637 m

BOCICOIU MARE

*Lucrari propuse
in prima faza*

BOCICOIU MARE
Apa

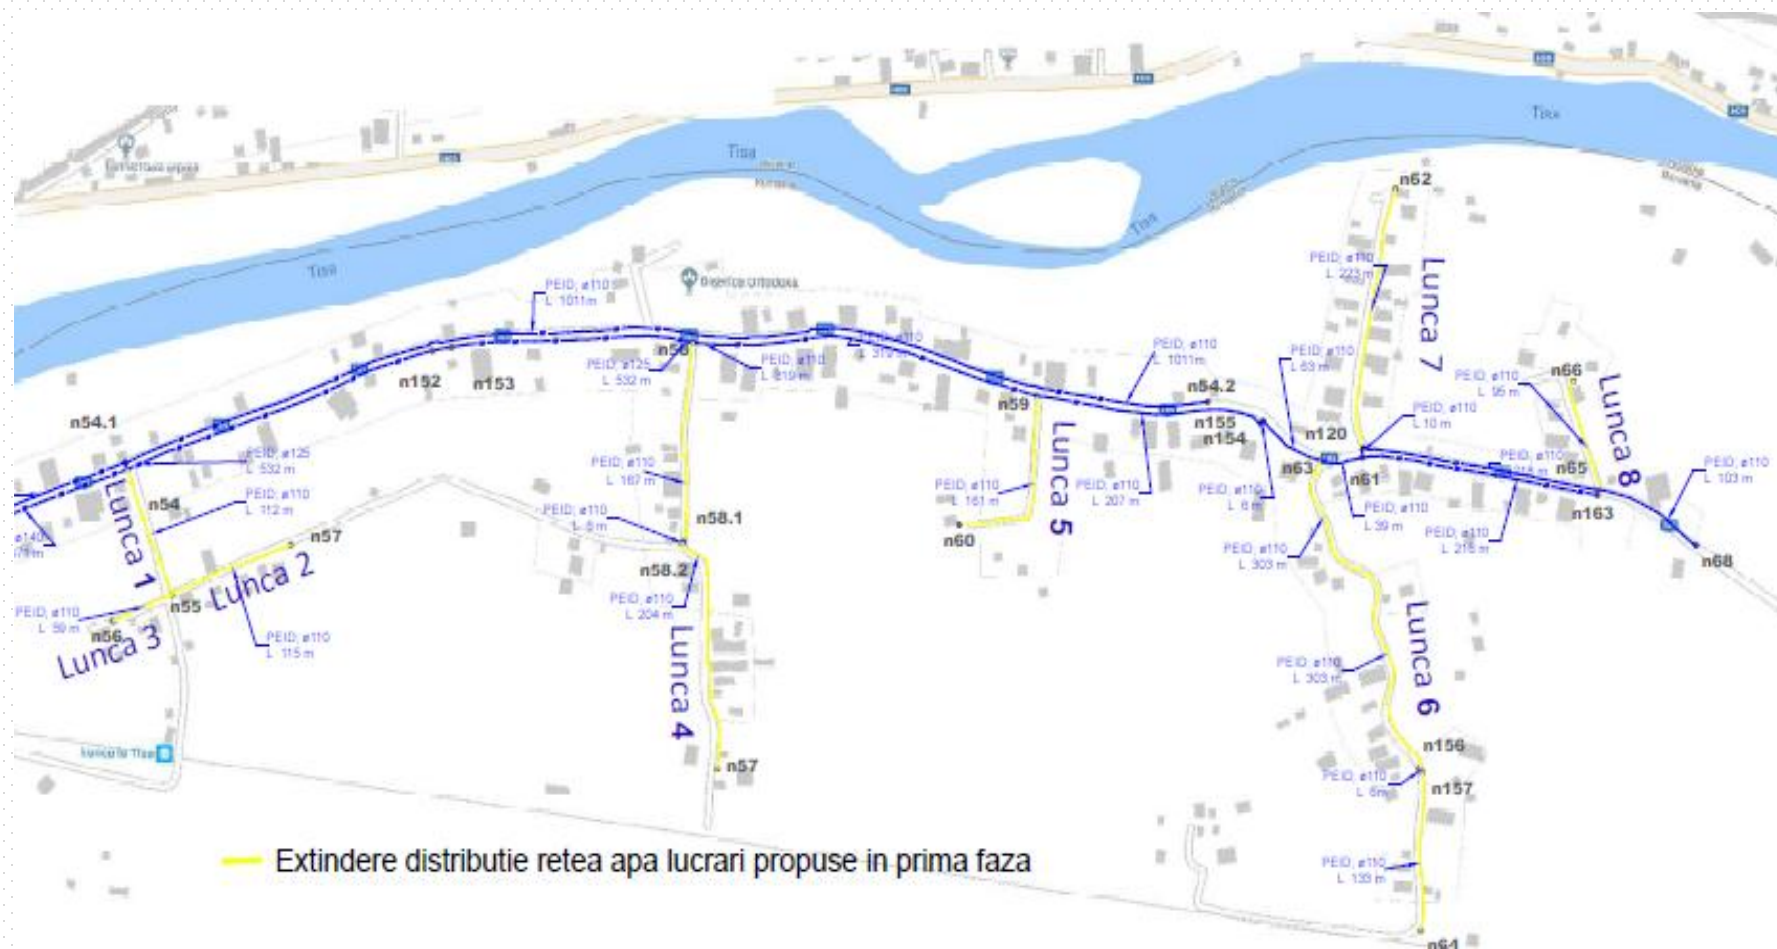


*Lucrari propuse
in prima faza*

**BOCICOIU MARE
Apa**



*Lucrari propuse
in prima faza*

BOCICOIU MARE
Apa

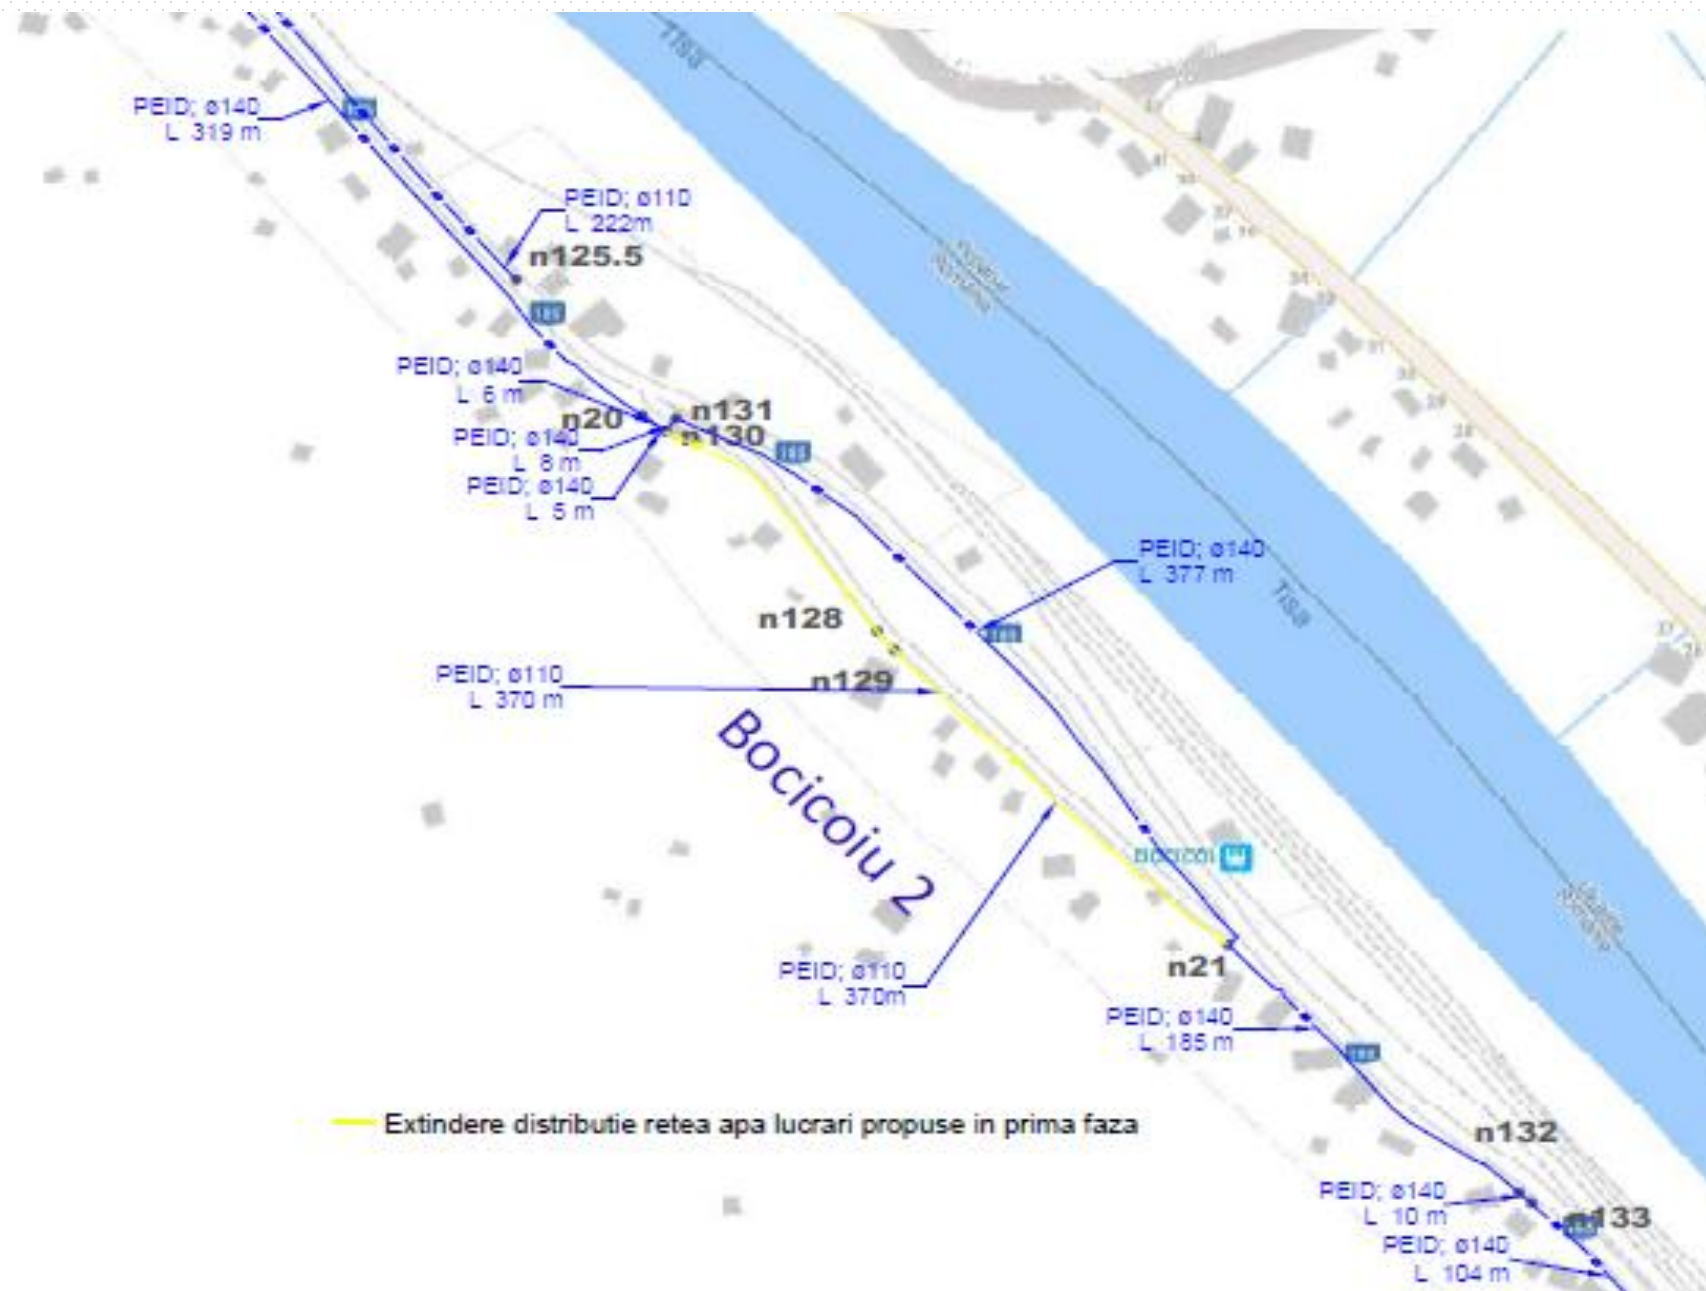


*Lucrari propuse
in prima faza*

BOCICOIU MARE
Apa uzata



*Lucrari propuse
in prima faza*

BOCICOIU MARE
Apa uzata

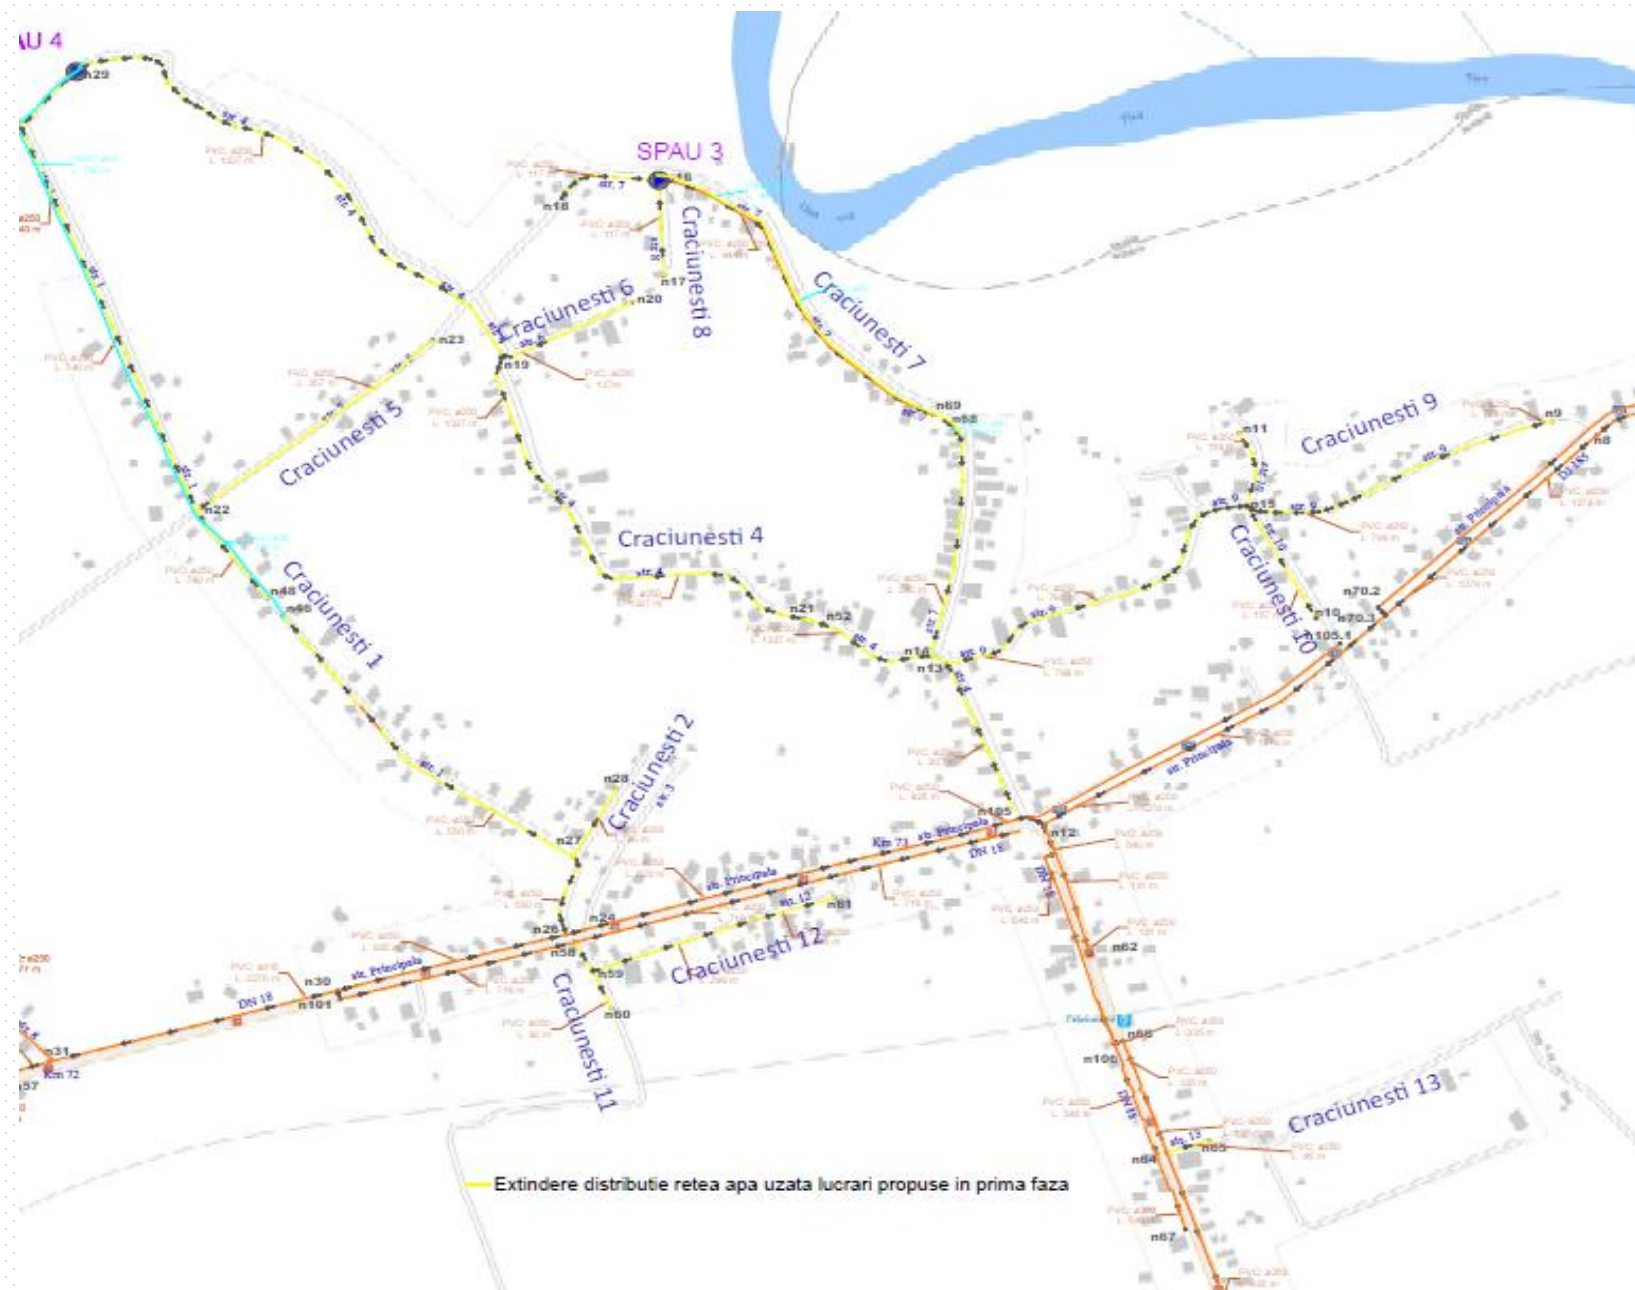


**PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR
DE REPER AFERENTE LUCRARILOR NR. 3 DIN 03.03.2026**

- **OBIECTIV 1:**
 - Extinderea rețelei de distributie apa potabile – L = 25.119 m;
 - Statii de pompare apa potabila – 2 buc.;
 - Bransamente de retea de distributie existente: 2.910 buc.
- **OBIECTIV 2:**
 - Extinderea rețelei de colectare apa uzata – L = 21.492 m;
 - Statii de pompare ape uzate – 6 buc.;
 - Conducte de refulare SPAU – L = 914 m;

*Lucrari propuse
in prima faza*

POIENILE DE SUB MUNTE
Apa


— Extindere distributie retea apa lucrari propuse in prima faza

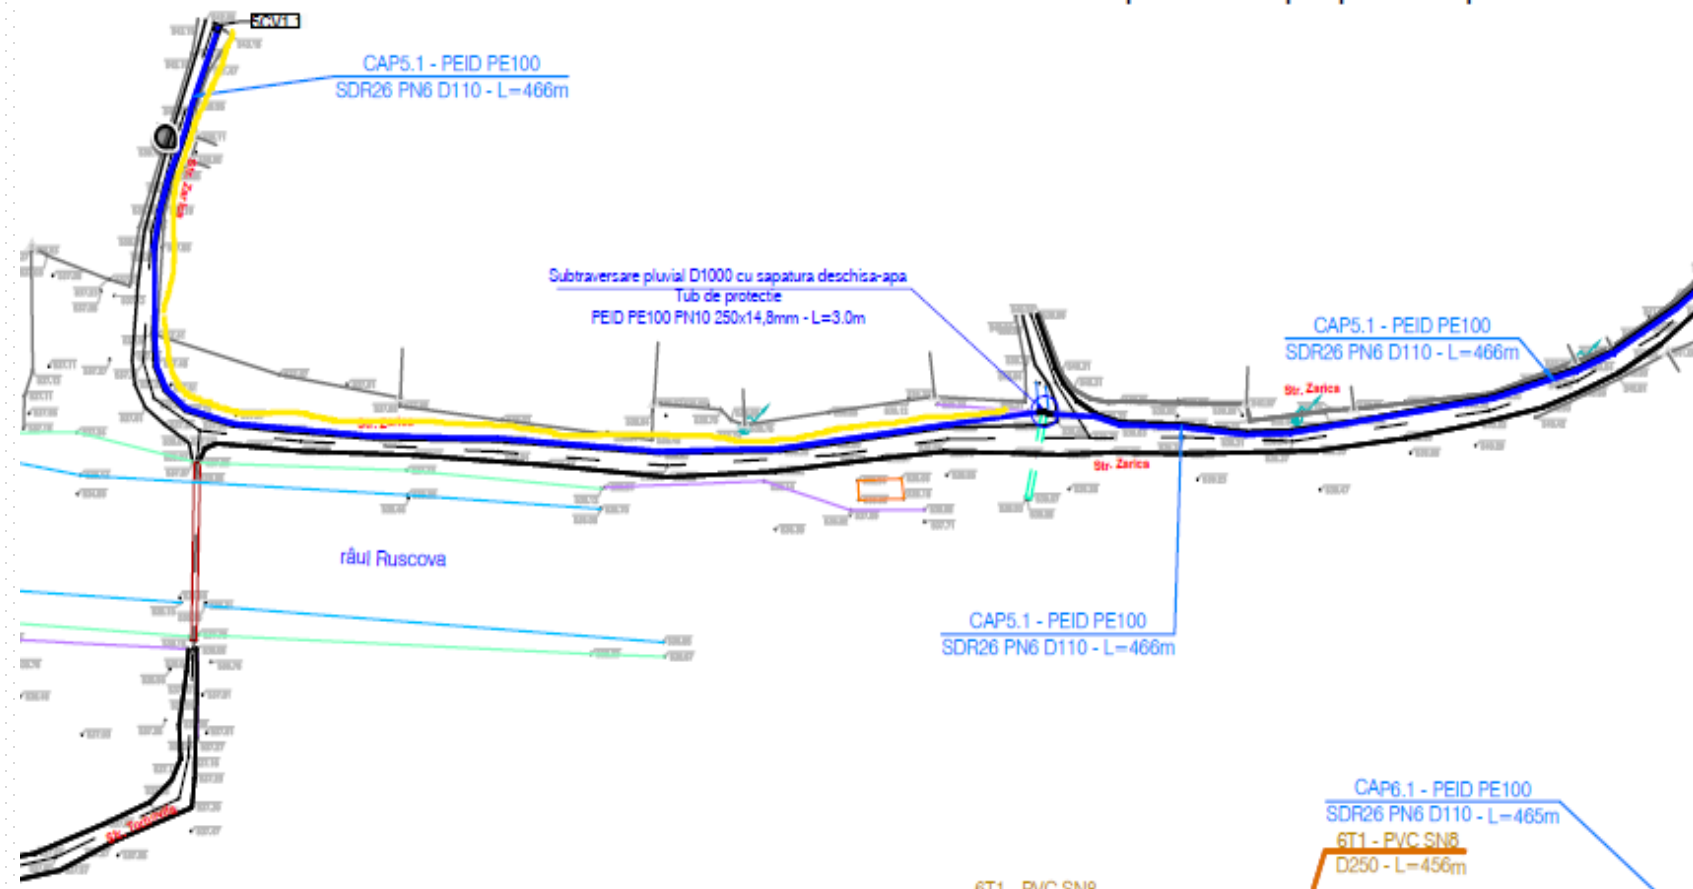

*Lucrari propuse
in prima faza*

**POIENILE DE SUB MUNTE
Apa**


— Extindere distributie retea apa lucrari propuse in prima faza

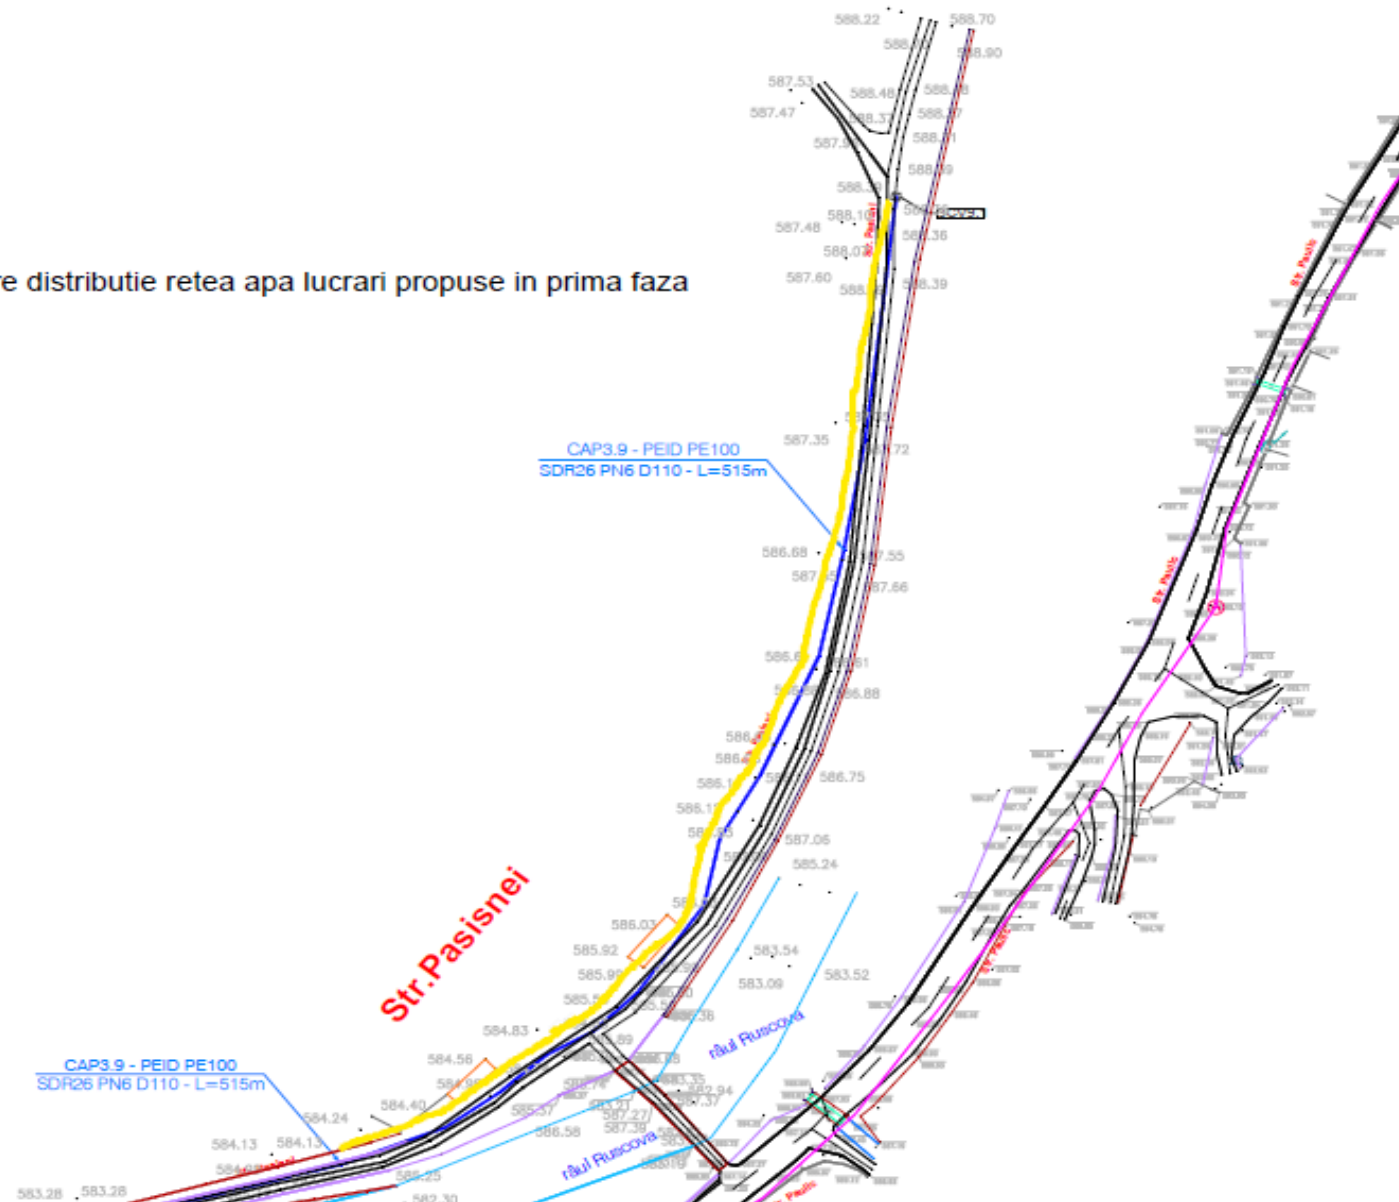

$\epsilon_f = 0.13$
 $d_c = 1 - 230$


— Extindere distributie retea apa lucrari propuse in prima faza

POIENILE DE SUB MUNTE
Apa

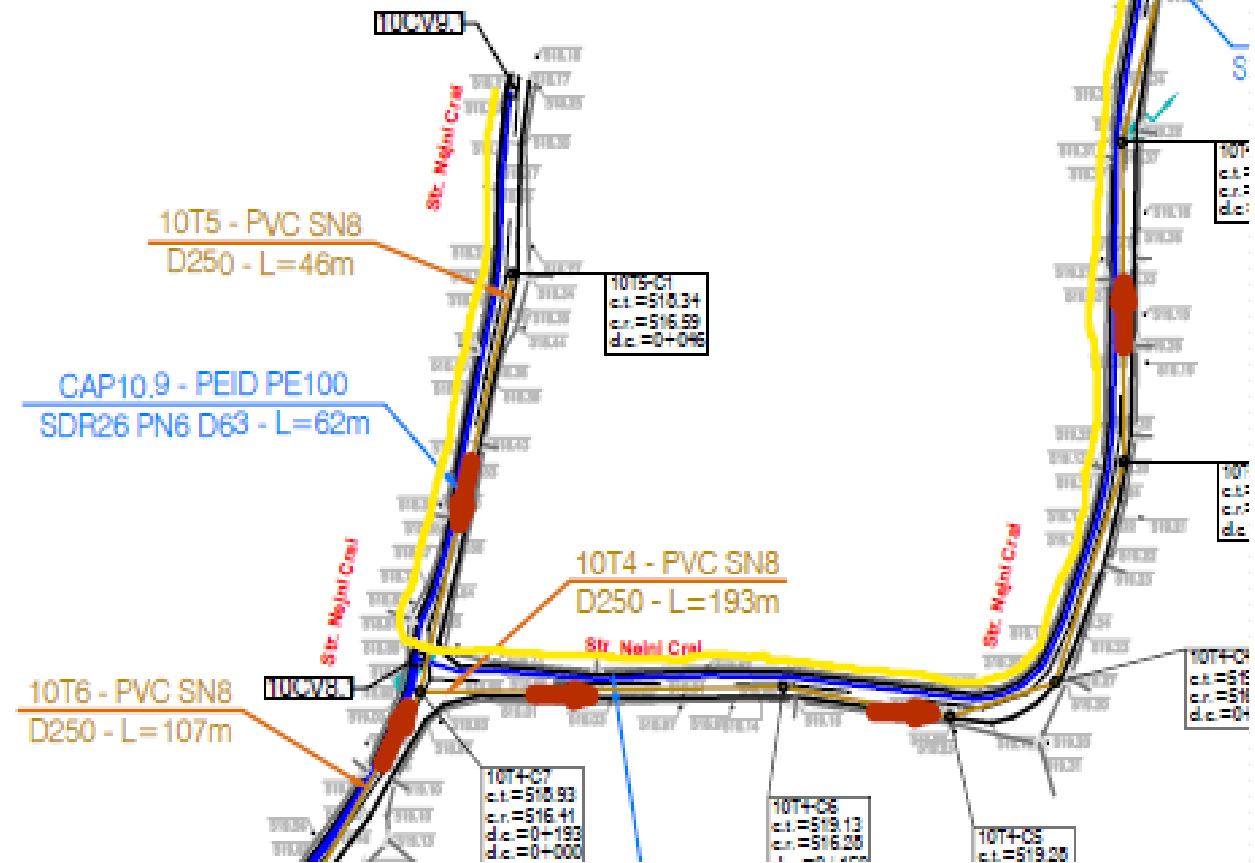


*Lucrari propuse
in prima faza*

POIENILE DE SUB MUNTE
Apa uzata

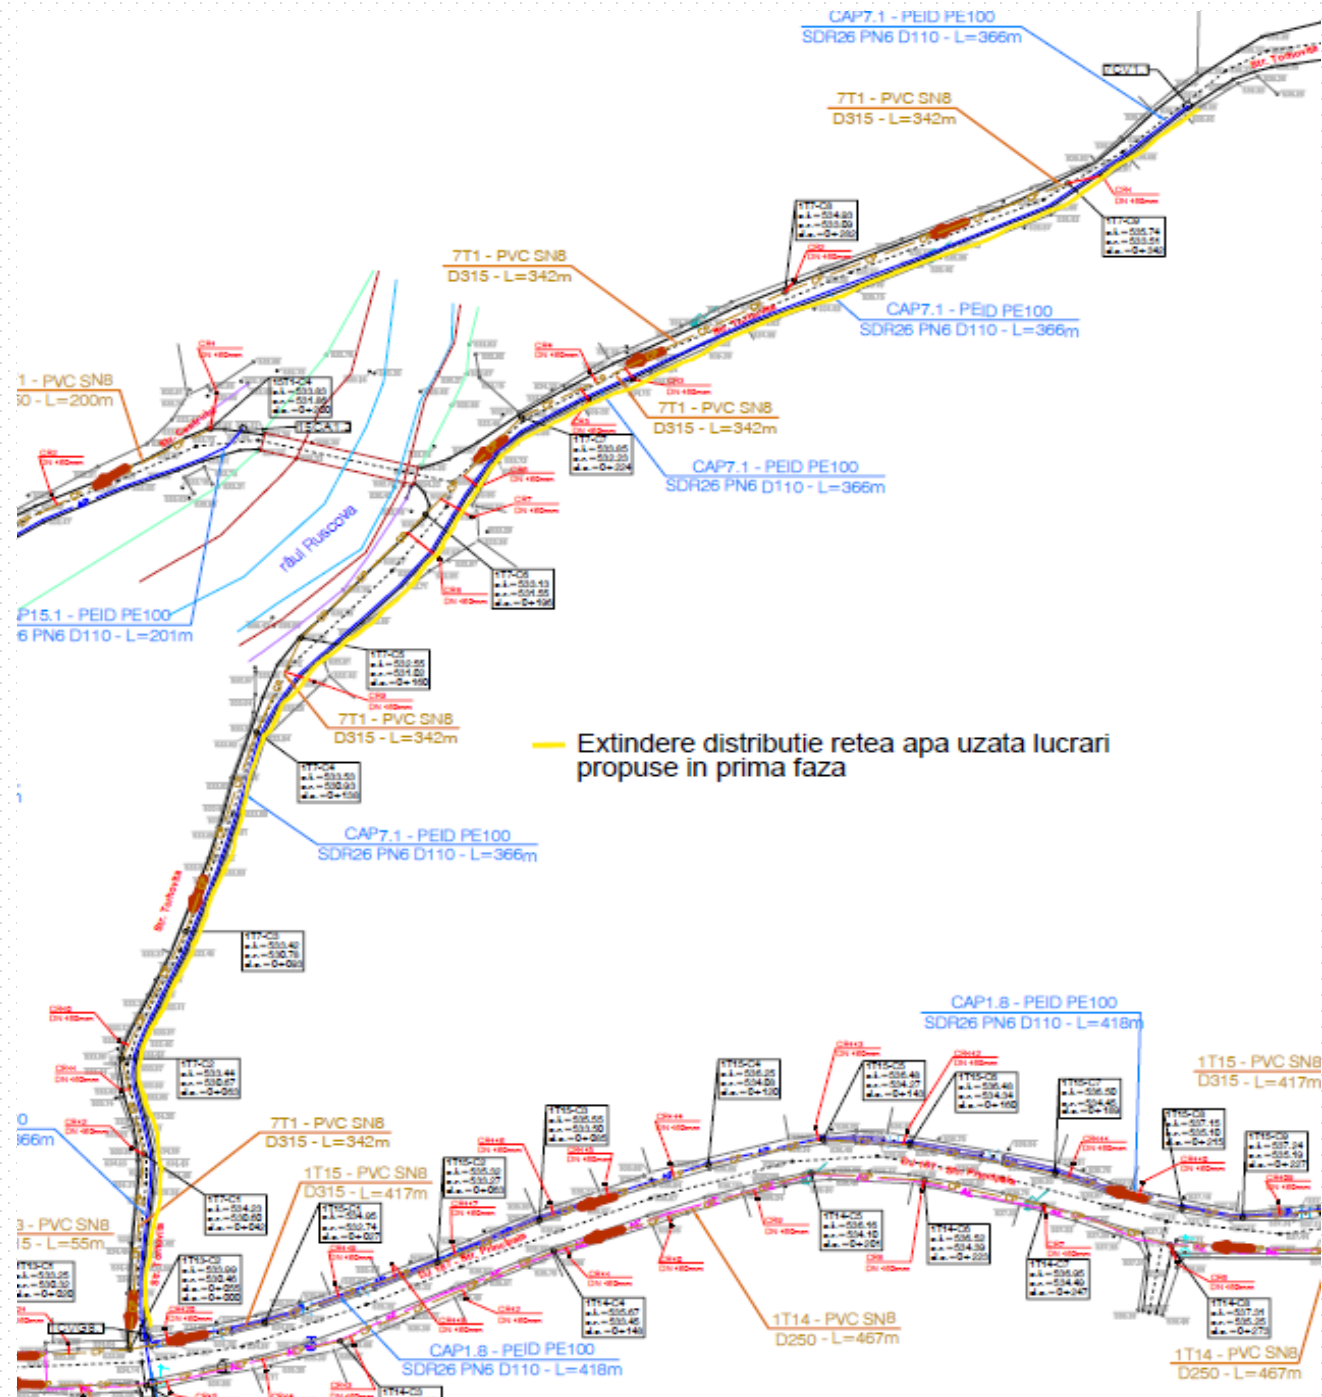

POIENILE DE SUB MUNTE

Apa uzata

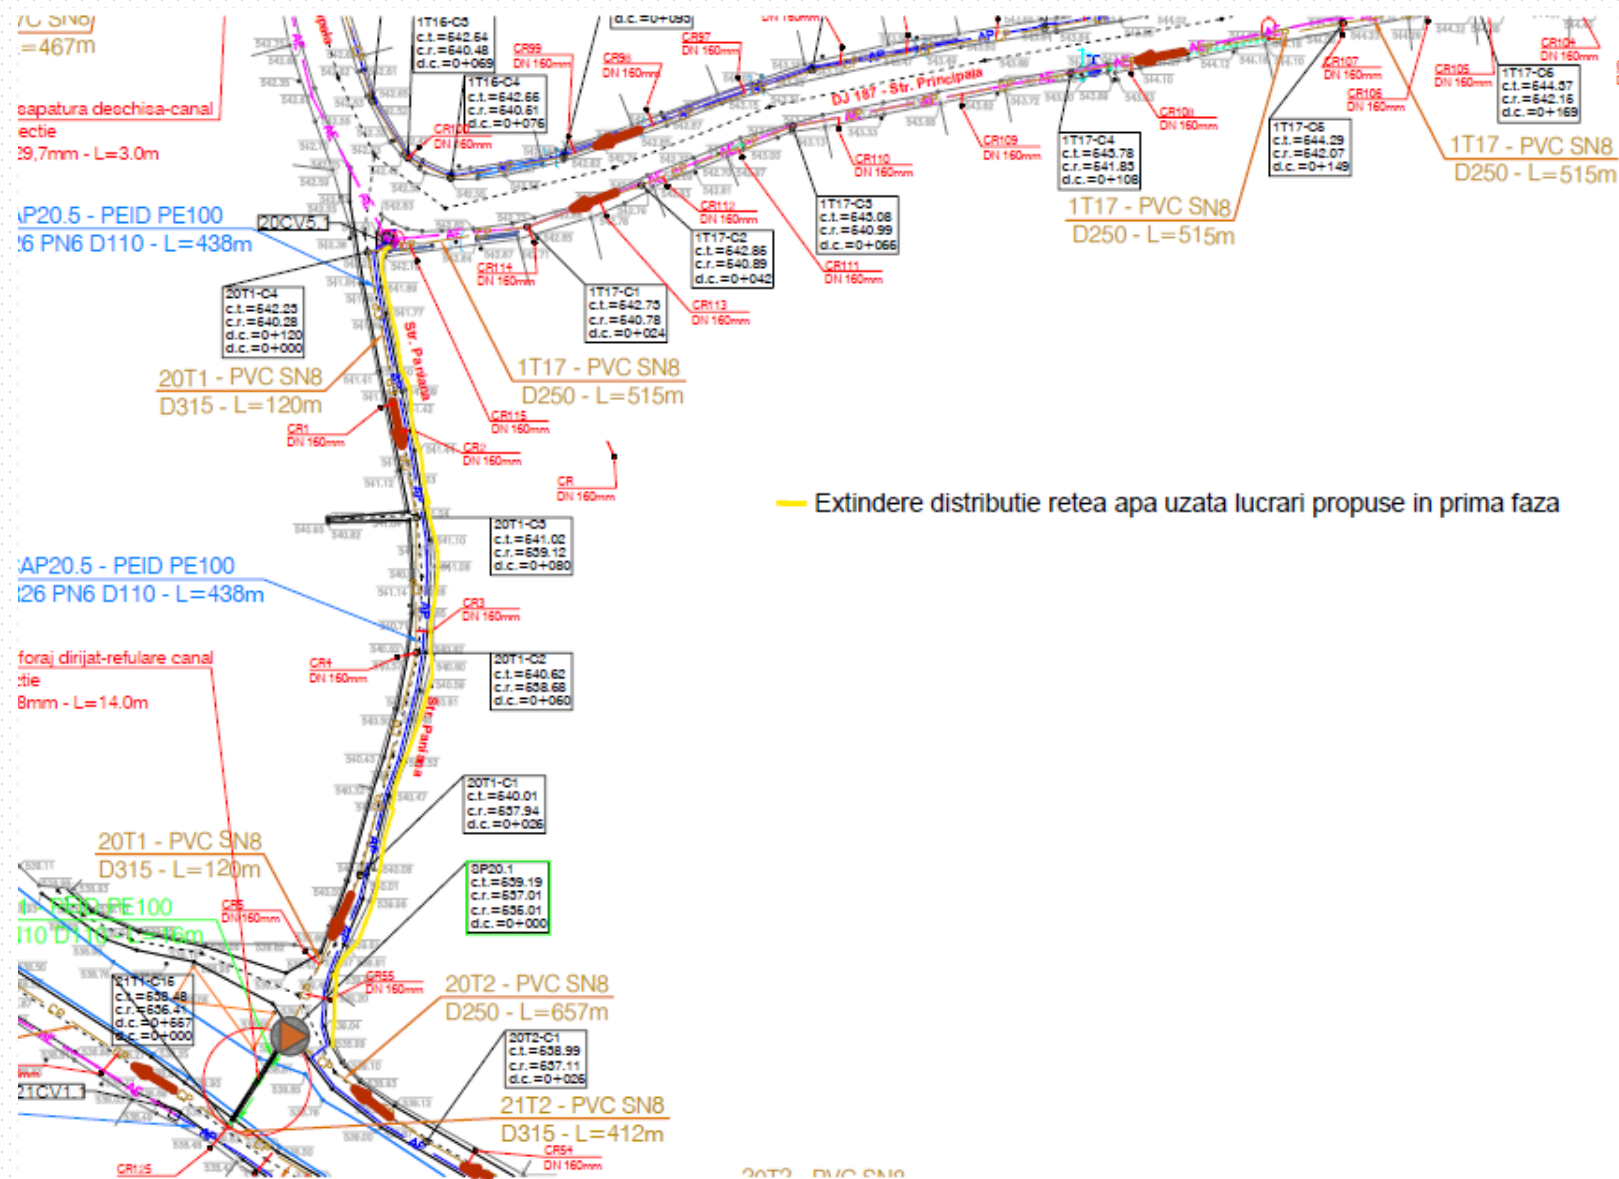

ORGANIZARE DE SANTIER BOCICOIU MARE



ORGANIZARE DE SANTIER VISEU DE SUS



ORGANIZARE DE SANTIER POIENILE DDE SUB MUNTE



PANOURI IDENTIFICARE INVESTITIE





