

Contract de Lucrari

Nr.232/10.10.2024

MM-CL-07 — Retele de apa si apa uzata: Tautii
Magheraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti

Valoarea Contractului: **124.476.986,58 lei, exclusiv TVA**

Beneficiar: **Vital SA**

Supervizor: **Safege SAS**

Antreprenor: **Asocierea Euskadi si Antrepriza Montaj Instalatii SRL**



Datele Contractului

- Semnare Contract: 10.10.2024
- Ordin Începere: 08.01.2025
- Durata Contractului : 30 luni
- Perioada de Garantie : 60 luni

Antreprenor : **Asocierea Euskadi SA si Antrepriza Montaj Instalatii SRL**

Subcontractori : **Euskaltel SRL
Radvior-Com SRL
Tautii Iuga SRL
Xallo Tehnic SRL**

Centralizatorul Investitiei

Lucrari UAT BAIA SPRIE

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT Baia Sprie		
Sub-obiect 1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	L = 488 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	L = 3203 m, PEID PE100 PN10; De 400 mm
Sub-obiect 1.3	Reabilitare retelei de distributie apa potabila	L = 4771 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 4210 m, PEID PE100 PN10+16; De 110+160+280 mm
Sub-obiect 1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila	L = 3962 m, PEID PE100 PN10; De 110+125+160 mm
Sub-obiect 1.6	Statie de pompare apa	Grup pompare (2A+1R), Qp = 10 l/s, Hp=45 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 10 l/s, Hp=125 mCA; Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
		Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=60 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=70 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m
Sub-obiect 1.7	Monitorizare si control hidraulic sistem apa	8 buc
Sub-obiect 1.8	Gospodarii de apa Baia Sprie	2 buc

OBIECT 2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE DIN UAT BAIA SPRIE		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea de canalizare	L = 11207 m, PVC SN8; De 250 mm;
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea de canalizare	L = 6607 m, PVC SN8; Dn 250 mm+Dn 315 mm;
Sub-obiect 2.3	Statie de pompare apa uzata	SPAU1: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 10,0 m, Lref = 146 m, PEID, De 110 mm SPAU2: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 20,0 m, Lref = 291 m, PEID, De 110 mm SPAU3: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 12,0 m, Lref = 146 m, PEID, De 110 mm SPAU4: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 15,0 m, Lref = 258 m, PEID, De 110 mm SPAU5: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 10,0 m, Lref = 187 m, PEID, De 110 mm SPAU6: 1A+1R, Q = 6.0 l/s, Hp = 26,0 m, Lref = 526 m, PEID, De 110 mm

Lucrari UAT SISESTI

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT Sisesti		
Sub-obiect 1.1	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 1996 m, PEID PE100 PN10; De 280 mm
Sub-obiect 1.2	Extinderea retelei de distributie apa potabila	L = 21595 m, PEID PE100 PN10; De 110+250+280 mm
Sub-obiect 1.3	Statie de pompare apa potabila	Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=60 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=70 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m
Sub-obiect 1.4	Monitorizare si control hidraulic sistem apa Sisesti	1 buc

Lucrari TAUTII MAGHERAUS

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT TM-1 - EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-1.1	Extindere retelei de distributie apa potabila Tautii Magheraus	L = 5.464 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT TM-2 -EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-1.2	Statie de pompare apa potabila Tautii Magheraus	1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 8.34 l/s, Hp=30 m
Sub-obiect TM-1.3	Extindere retelei de distributie apa potabila Merisor	L = 345 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.4	Extindere retelei de distributie apa potabila Busag	L = 79 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila Baita	L = 1.301 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.6	Statie de pompare apa potabila Baita	1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.2 l/s, Hp=44 m, 1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.4 l/s, Hp=29 m, 1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.4 l/s, Hp=38 m,
Sub-obiect TM-1.7	Monitorizare si control hidraulic sistem apa Tautii Magheraus	1 buc
OBIECT TM-2 -EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-2.1	Extindere retea de canalizare Tautii Magheraus	L = 4.683 m, PVC SN8; De 250 mm
Sub-obiect TM-2.2	Statie de pompare apa uzata Tautii Magheraus	1 buc - 1A+1R, Q = 1.31 l/s, Hp = 5,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 169 m, PEID, De 110 mm, 1 buc - 1A+1R, Q = 0.87 l/s, Hp = 7,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 220 m, PEID, De 110 mm
Sub-obiect TM-2.3	Conducte de refulare SPAU Tautii Magheraus	L = 389 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-2.4	Extindere retea de canalizare Busag	L = 502 m, PVC SN8; De 250 mm
Sub-obiect TM-2.5	Statie de pompare apa uzata Busag	1 buc - 1A+1R, Q = 1.22 l/s, Hp = 7,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 368 m, PEID, De 110 mm
Sub-obiect TM-2.6	Conducte de refulare SPAU Busag	L = 368 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm

Lucrari UAT RECEA


OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - Retele de distributie apa potabila in localitatea Recea		
Sub-obiect 1.1	Extindere retea alimentare apa	L = 1184 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT 2 - Retele de distributie apa in localitatea Mocira		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea alimentare apa	L = 777 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea alimentare apa	L = 1943 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT 3 – Retele de canalizare menajera in localitatea Recea		
Sub-obiect 3.1	Infiintare retea de canalizare	L = 8489 m, PVC SN8; De 250 mm
OBIECT 4 – Retele de canalizare menajera in localitatea Mocira		
OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
Sub-obiect 4.1	Infiintare retea de canalizare	L = 9191 m, PVC SN8; De 250 mm
OBIECT 5 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Recea		
Sub-obiect 5.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 6398 m, PEID PE100 PN6; De 90 si 200 mm
OBIECT 6 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Mocira		
Sub-obiect 6.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 2078 m, PEID PE100 PN6; De 90 si 110 mm
OBIECT 7 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Sasar		
Sub-obiect 7.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 3362 m, PEID PE100 PN6; De 110 mm
OBIECT 8 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Recea		
Sub-obiect 8.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 1 - 1A+1R, Q = 25.0 l/s, Hp = 70 m SPAU 2 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 30 m SPAU 3 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 4 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 15 m SPAU 5 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 6 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 25 m SPAU 7 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 8 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 12 m
OBIECT 9 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Mocira		
Sub-obiect 9.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 2 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 3 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 13 m SPAU 4 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 5 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 6 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 12 m SPAU 7 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 17 m SPAU 8 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m
OBIECT 10 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Sasar		
Sub-obiect 10.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 1 - 1A+1R, Q = 10.0 l/s, Hp = 49 m

Documente Antreprenor

Denumire Document	Data Depunere	Data Aprobare
Inaintare Plan General de Securitate și ăănătate	28.01.2025	26.03.2025
Inaintare Plan de Management al mediului	28.01.2025	04.04.2025
Inaintare Plan de Management al Traficului	28.01.2025	28.03.2025
Inaintare Plan de Asigurare a Calit, Plan de control al Calitatii	28.01.2025	17.03.2025
Inaintare spre aprobare Organigrama Antreprenorului	03.02.2025	21.02.2025
Solicitare aprobare Program de execuție	07.02.2025	20.02.2025
Inaintare in vederea aprobarii personalului specializat si auxiliar pentru ridicari si planuri topografice	10.02.2025	14.04.2025
Înaintare Asigurări	19.02.2025	14.04.2025
Transmitere Asigurări de răspundere civilă auto	14.03.2025	14.04.2025
Înaintare spre aprobare documente tehnice privind Organizarea de Șantier.	14.03.2025	04.04.2025
Inaintare plan de management social	23.06.2025	23.07.2025

Avize IPJ

nr. Cr t	Tip document	Nr. și data document	UAT	Strazi vizate
1	Aviz IPJ	nr.124058 din 01.04.2025	Recea	<p>Localitatea Mocira</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unirii intre Ulita Mare si Crinilor • Crinilor intre Unirii si Trandafirilor • 1 Decembrie intre Stadionului si Ghiocelor • Ghiocelor intre 1 Decembrie si final de strada 1 Decembrie <p>Localitatea Recea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulita Mare intre Unirii si Aeroportului • Aeroportului intre Ulita Mare si Alea Mocirii • Stadionului intre Europa DN1C si Florilor <p>Localitatea Sasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Morii intre statia de epurare si 1 Decembrie • 1 Decembrie intre Morii si Garii • Garii intre 1 Decembrie si Traversare cale ferata • Daliei intre traversarea caii ferate si Viilor
2	Aviz IPJ	nr.124057 din 01.04.2025	Tautii Magheraus	<p>Tautii Magheraus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strada 67 ,22, 23, 54, 57, 58 Busag • Strada 113 , 114 <p>Merisor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strada 133A, 133B
3	Aviz IPJ	nr. 381604 din 09.04.2025	Baia Sprie	<ul style="list-style-type: none"> • Alea Minerilor , intre Gutinului DN18 si liceul Auto • strada Decebal , intre alea Minerilor si Dragos Voda • strada Pietrosului • strada Olarilor intre Microraion Vest si Gutinului DN 18 • strada 1 Mai • strada Sperantei • strada Islazului
4	Aviz IPJ	nr. 383787 din	Baia Sprie	Magnoliei, Mihai Eminescu, Salcamilor, Tudor Vladimirescu, Strabunilor, Ignisului, Morii,

5	Aviz IPJ	nr. 127007 din 28.07.2025	Tautii Magheraus	153,30,33,38,36,45,41,40,37,84,86,82,39
6	Aviz IPJ	nr. 384452 din 22.08.2025	Sisesti	5,8,9,17,18 Surdesti 21,26 Sisesti
7	Aviz IPJ	nr. 389724 din 06.11.2025	Sisesti	22,37,12 Sisesti
8	Aviz IPJ	nr. 129591 din 17.11.2025	Tautii Magheraus	UAT Tautii Magheraus
9	Aviz IPJ	nr. 389970 din 15.11.2025	Baia Sprie	Str. Pietrosului, Alea Minerilor, Decebal, Olarilor, 1 Mai, Sperantei si Dragos Voda.
10	Aviz IPJ	nr.129592 din 17.11.2025	Recea	UAT Recea
11	Aviz IPJ	673410 din 02.03.2026	Baia Sprie	Str. Pietrosului, Alea Minerilor, Decebal, Str. Olarilor, Str. 1 Mai Str. Sperantei, Str. Islazului Str. Dragos Voda_1
12	Aviz IPJ	673693 din 09.03.2026	Baia Sprie	Plevnei, Crinului, Macului, Murelor, Parului
13	Aviz IPJ	674898 din 24.04.2026	Baia Sprie	Colonia Eliberarii, 23 August, Montana, str. Sasar
14	Aviz IPJ	674870 din 24.04.2026	Sisesti	Str.11,13,16 Sisesti Str. 11,34 Surdesti

Avize Spargere

1	Aviz Spargere	nr. 33 din 03.04.2025	Tautii Magheraus	Tautii Magheraus • Strada 22, 23, 54, 58 Busag • Strada 113 , 114 Merisor • Strada 133A, 133B
2	Aviz Spargere	nr. 27 din 07.04.2025	Recea	Acord amplasare in zona
3	Aviz Spargere	nr.3223 din 11.04.2025	Baia Sprie	• Aleea Minerilor , intre Gutinului DN18 si liceul Auto • strada Decebal , intre aleea Minerilor si Dragos Voda • strada Pietrosului • strada Olarilor intre Microraion Vest si Gutinului DN 18 • strada 1 Mai • strada Sperantei • strada Islazului
4	Aviz Spargere	nr. 86 dinn 22.05.2025	Tautii Magheraus	strazile 67, 25 , 26 ,113 , 114 ,57
5	Aviz Spargere	nr. 6066 din 28.07.2025	Baia Sprie	Magnoliei, Mihai Eminescu, Salcamilor, Tudor Vladimirescu, Strabunilor, Ignisului, Morii, Garii,Gordanului,Pietrarului,Ghiocelulu i
6	Aviz Spargere	nr. 134 din 07.08.2025	Tautii Magheraus	153,30,33,38,36,45,41,40,37,84,86, 82,39



7	Aviz Spargere	nr. 1 din 04.09.2025	Sisesti	5,8,9,17,18 Surdesti / 21,26 Sisesti
8	Aviz Spargere	nr. 2 din 11.11.2025	Sisesti	3,4 Danesti / 22,37,12 Surdesti
9	Aviz Spargere	nr. 1845 din 16.03.2026	Baia Sprie	Aleea Minerilor, Nicolae Balcescu,Microraion Vest,Dragos Voda , Lacului
10	Aviz Spargere	nr. 2193 din 23.03.2026	Baia Sprie	Plevnei, Crinului, Macului, Murelor, Parului
11	Aviz Spargere	Nr. 3492 din 05.05.2026	Baia Sprie	Str. 23 August , str. Sasar, str. Montana, str. Colonia Eliberarii
12	Aviz Spargere	Nr. 1 din 06.05.2026	Sisesti	Str. 11,13,16 Sisesti Str. 11, 34 Surdesti

Predari Amplasament

NR.	Tip document	Nr. și data procesului-verbal	UAT	Străzi predate
1	Predare amplasament	nr. 1 din 25.04.2025	Tăuții Măgherăuș	str. 54 str. 22 si str.23
2	Predare amplasament	nr. 1 din 25.04.2025	Recea	Localitatea Recea : str. Stadionului si str. Daliei Localitatea Mocira: str.Unirii si str. Crinilor Localitatea Sasar: str.Daliei
3	Predare amplasament	nr. 2 din 19.05.2025, OUT766/19.05.2025	Baia Sprie	Aleea Minerilor (între DN18 - Str. Gutinului și Liceul Auto Baia Sprie), -Str. Decebal (între Aleea Minerilor și Str. Dragoș Vodă), Str. Pietrosului, - Str. Olarilor (între Str. Microraion Vest și DN18 Str. Gutinului)Str. 1 Mai, Str. Speranței, Str. Islazului
4	Predare amplasament	nr. 3 din 21.05.2025, OUT804/21.05.2025	Tăuții Măgherăuș	UAT Tautii Magheraus
5	Predare amplasament	nr. 4 din 22.05.2025, OUT821/22.05.2025	Recea	Localitatea Mocira: Str. 1 Decembrie, Str. Ghiocilor, Str. Stejarului, Str. Stadionului; Localitatea Recea: Str. Ulița Mare, Str. Aeroportului, Localitatea Sasar: Victoriei, Morii, 1 Decembrie, Garii
6	Predare amplasament	nr. 5 din 01.07.2025, OUT 1169/ 01.07.2025	Recea	Localitatea Recea : Aleea Mocirii

Predari Amplasament

7	Predare amplasament	nr. 6 din 15.07.2025, OUT1308/15.07.2025	Baia Sprie	str. Aleea Minerilor, sti Decebal
8	Predare amplasament	nr. 7 din 29.07.2025, OUT1308/15.07.2026	Baia Sprie	str. Mihai Eminescu, Salcamlor, Ignisului, Ghiocelului
9	Predare amplasament	nr. 8 din 06.08.2025, OUT1466/06.08.2026	Baia Sprie	Str. Morii, str. Pietrarului, str. Magnoli str. Gordanului
10	Predare amplasament	nr.9 din 28.08.2025 OUT1659/28.08.2025	Tautii Magheraus	Str. 30,36,37,38,39,40,4
11	Predare amplasament	nr. 10 din 09.09.2025 OUT1735/09.09.2025	Sisesti	Str. 5,8,9,17,18 (Surdest Str. 21,26 (Sisesti)
12	Predare amplasament	nr. 12 din 29.10.2025 OUT2201/29.10.2025	Baia Sprie	Tudor Vladimirescu ,Dragos Voda_1,Drago Voda_2
13	Predare amplasament	nr. 12 din 29.10.2025 OUT2262/04.11.2025	Recea	Str. Unirii
14	Predare amplasament	nr. 14/04.03.2026	Baia Sprie	Minerilor, Lacului, Avra Iancu, Nicolae Balcescu
15	Predare amplasament	31.03.2026	Baia Sprie	Plevnei, Crinului, Macului, Murel Parului

Predari amplasament

16	Predare amplasament	Nr.16/ 22.04.2026	Tautii Magheraus	SPAU/SPAP
17	Predare amplasament	Nr.18/ 22.04.2026	Recea	Trandafirilor_M1,M2,M3,M4, M5, SPAU3 Mocira, Trandafirilor3_1,3_2,3_3, Trandafirilor_2, Trandafirilor_1, Dragostei_2, Dragostei_3, Dragostei, Mihai Viteazu, Lazarescu
18	Predare amplasament	Nr.20/ 05.05.2026	Baia Sprie	Colonia Eliberarii, Sasar, Montana, 23 August

Derularea Contractului

Ordin Incepere : 08.01.2025

- Autorizatie de Construire nr.4 din 21.02.2025 – primita in 26.02.2025
- FAM-uri depuse pentru aprobare

Aprobate : 46

Respinse:13

In lucru : 8

Drept Acces Santier : 19.03.2025

Incepere Lucrari : 05.05.2025

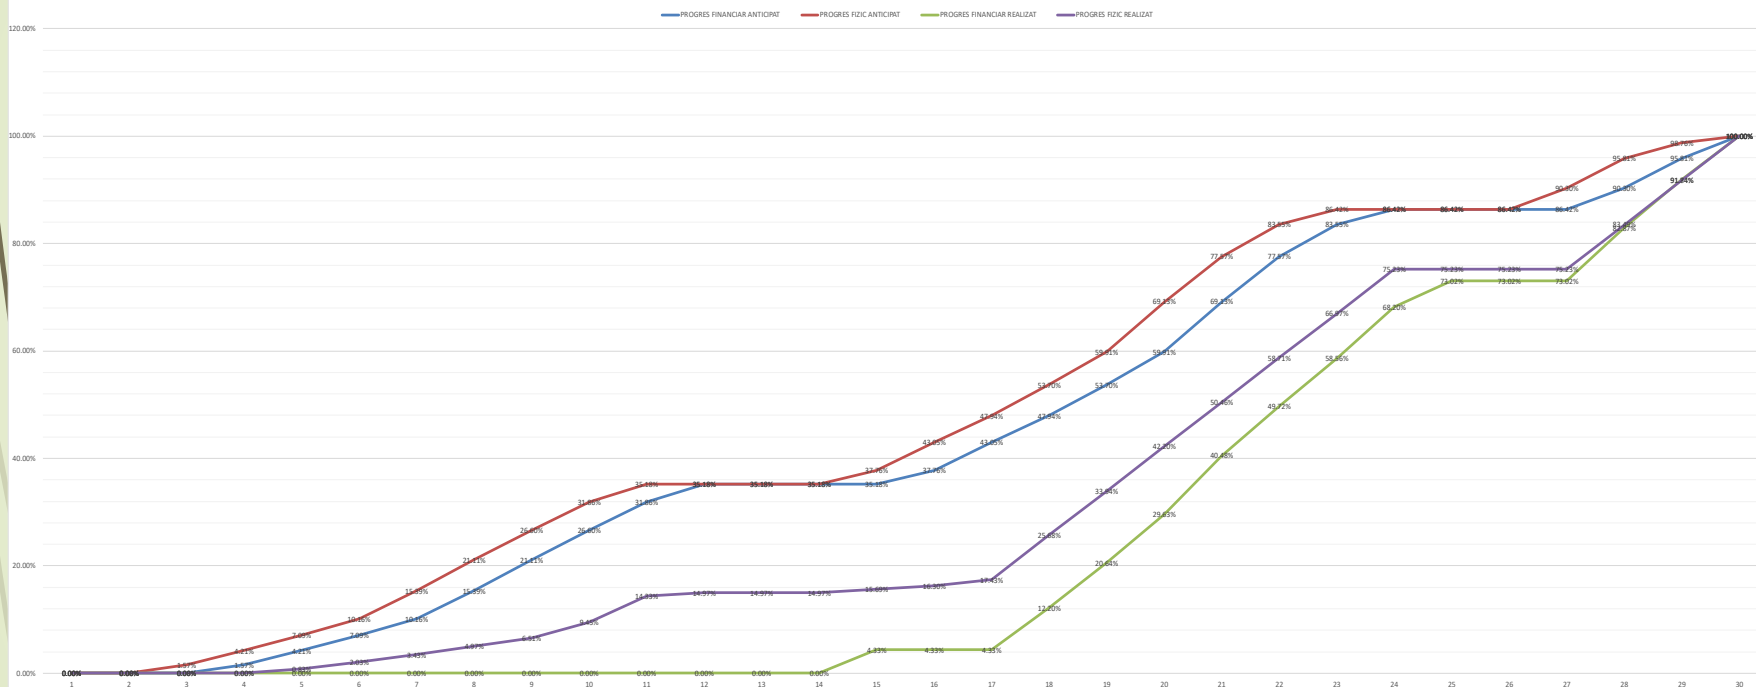
Situatia Financiara

Sumarul Progresului Financiar (%) – estimat valoric si actualizat conform
Fluxului de numerar din data de 30.05.2026

Stadiu fizic estimat												
				Valori conform Contract			Modificări		Valoare executata anterior	Progres Luna MAI 2026		
	Cod lista articol	Descriere	U.M.	Cantitate	Pret unitate (RON)	Valoarea totala (RON)	Cantitate M01 (RON)	Valoare M01 (RON)	Valoarea totala (RON)	CANTITATE	Valoarea totala (RON)	CUMULAT
		TOTAL Lista Nr. D-1.3-7 - Str. Islazului				436,221.18		436,221.18	35,727.00		37,962.94	21.96%
		TOTAL Lista Nr. D-1.3-9 - Str. Macului				491,714.31		491,714.31	0.00		110,470.14	32.23%
		TOTAL Lista Nr. D-2.1-10 - Str. Islazului, Baia Sprie				883,310.75		883,310.75	134,341.57		1,268.34	15.35%
		TOTAL Lista Nr. D-2.1-17 - Str. Parului, Baia Sprie				365,674.16		365,674.16	0.00		78,456.30	21.46%
		TOTAL Lista Nr. D-2.3-1 - Conducta de refulare SPAUI				73,169.04		73,169.04	0.00		8,860.00	12.11%
		TOTAL Lista Nr. D-2.1-4 Str Stejarului				175,275.83		175,275.83	0.00		28,355.12	16.18%
		TOTAL Lista Nr. D-2.2.1-2 Str Trandafirilor_1				52,712.55		52,712.55	0.00		26,229.84	49.76%
		TOTAL Lista Nr. D-2.2.2-5 Str. Trandafirilor_1				340,510.86		340,510.86	0.00		23,981.30	7.04%
		TOTAL Lista Nr. D-2.3.3 - Str. Aeroportului_3				773,978.41		773,978.41	131,706.93		4,592.72	34.46%
		TOTAL Lista Nr. D-2.3.28 - Str. Viilor_3				88,820.46		88,820.46	0.00		27,623.63	31.10%
		TOTAL Lista Nr. D-2.3.29 - Str. Viilor_4				187,076.47		187,076.47	0.00		41,453.81	22.16%
		TOTAL Lista Nr. D-2.4.1 - Aleea Mocirii_1				87,205.37		87,205.37	0.00		14,886.76	17.07%
		TOTAL Lista Nr. D-2.4.11 - Str. Dragostei_2				396,633.92		396,633.92	0.00		14,589.68	3.68%
		TOTAL Lista Nr. D-2.4.23 - Str. Mihai Viteazu				314,509.77		314,509.77	0.00		77,489.82	24.64%
		TOTAL Lista Nr. D-2.8-8 - Conducta de refulare SPAUI				62,855.57		62,855.57	0.00		8,555.89	13.61%
		TOTAL Lista Nr. D-1.2-4 - Str. Nr.3-Danesti, Sisesti				95,790.38		95,790.38	0.00		23,182.54	66.48%
		TOTAL Lista Nr. D-1.2-9 - Str. Nr.11-Sisesti, Sisesti				972,888.47		972,888.47	0.00		27,680.04	2.85%
		TOTAL Lista Nr. D-1.2-13 - Str. Nr.16-Sisesti, Sisesti				613,903.83		613,903.83	0.00		292,979.23	47.72%
		TOTAL Lista Nr. D-1.2-15 - Str. Nr.18-Surdesti, Sisesti				135,428.44		135,428.44	46,577.18		15,148.29	45.58%
		TOTAL Lista Nr. D-1.2-19 - Str. Nr.22-Surdesti, Sisesti				500,937.54		500,937.54	0.00		130,003.01	45.05%
		TOTAL GENERAL				124,476,986.58		122,125,287.40	18,628,532.79		993,769.40	

Curba S – luna mai 2026

ANEXA 3; ANEXA 4- CURBA S DE PROGRES FIZIC SI VALORIC APRILIE 2026





Organizarea Santierului

- Obținerea terenului:

Hotărârea Consiliului Local Recea – HCL nr.13 din 27.02.2025

- Proiectarea organizării santier:

Aprobarea DTOE prin adresa OUT 505/04.04.2025

- Obținerea Autorizației de Construire

Certificat de Urbanism nr.312 din 10.03.2025

Autorizația de Construire nr. 99 din 14.04.2025

- Recepția Organizării de Santier

La data de 20.05.2025, s-a întocmit Procesul verbal de recepție calitativă lucrări nr. 181, cu ocazia verificărilor efectuate la organizarea de santier Recea. Acesta a fost înregistrat la Antreprenor cu nr. MM01/VTL24-XLVII-188 din 21.05.2025.

Detalii si activitati in luna de raportare : MAI 2026

In **UAT Tautii-Magheraus**, s- au executat refaceri pe strazile :

36,37,38,39

In **UAT Recea**, lucrarile aferente retelei de apa s-au executat pe strazile **Crinilor (probe) si**

1 Decembrie (probe), Stejarului iar lucrarile aferente retelei de canalizare s-au executat pe strazile **Aeroportului_3, Aleea Mocirii_1, Trandafirilor_1, Viilor_3 si 4, Mihai Viteazu, Dragostei_2, si si refulare SPAU1 Recea.**

In **UAT Baia Sprie**, lucrarile aferente retelei de canalizare s-au executat pe strazile **Islazului, Parului si refulare SPAU1**, iar lucrarile aferente retelei de apa s-au executat pe strada **Macului.**

In **UAT SISESTI**, lucrarile aferente retelei de apa s-au executat pe strazile, **3, 11,18,22,16.**

Baia Sprie





Sisesti



Recea





Tautii Magheraus





Utilaje pe santier

- Autocamion UMT AMT 125
- Buldoexcavatoare JCB 3CX
- Excavatoare Takeuchi 5T, 9T, 10T
- Bobcat, Dumpere, Camioane 8x4

Total: 32 utilaje asigurate și asigurate conform clauzei 16.2B

Personal pe santier

Nr. Crt	Denumire	Numar
1	Sef Santier	1
2	Ingineri Santier	2
3	Ingineri Topografi	2
4	Sef Echipa	6
5	Muncitori Calificati - Instalatori	6
6	Muncitori Necalificati	36

- Interval orar: 07:30 – 17:30
- Zilele de weekend: fără activitate



Aspecte de protectia mediului.

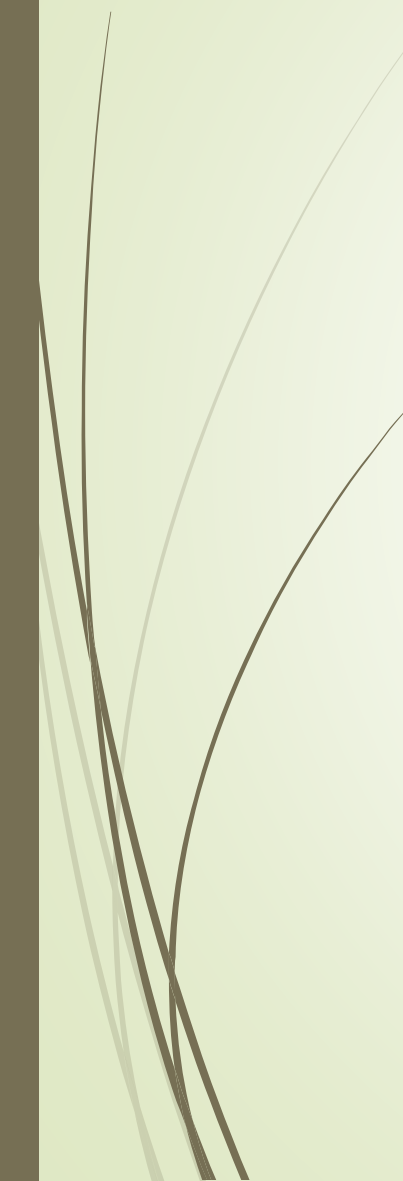
In perioada raportata nu s-au inregistrat incidente de mediu sau reclamatii, iar toate masurile de prevenire si monitorizare au fost implementate conform Planului de Management al Mediului.

Monitorizarea mediului a fost realizata in mod corespunzator, fara a identifica neconformitati.

Alte aspecte

Probleme constatate (36 note)

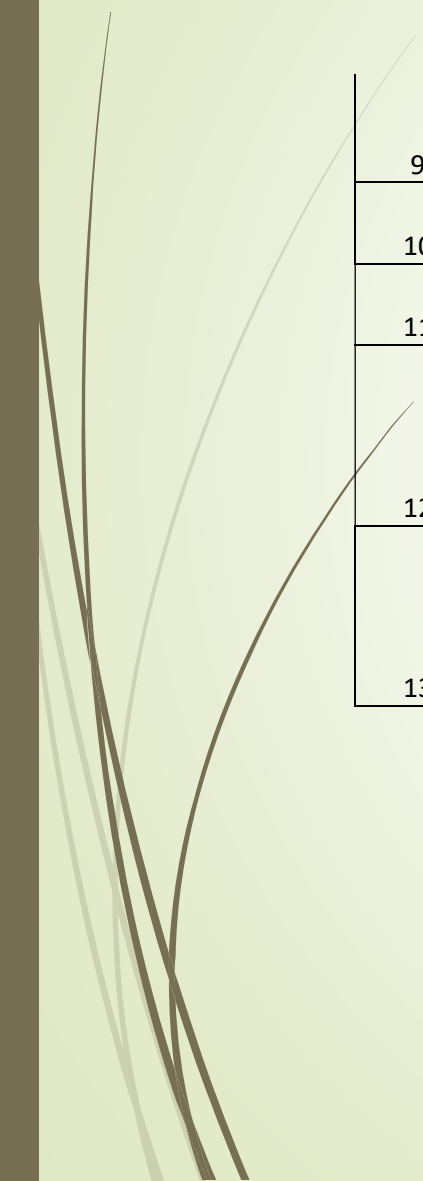
Nr.Crt	Data Document	Denumire Document	Strada Vizata	Raspuns
1	15.05.2025	01/ Nota Constatate	22 - Tautii Magheraus	OUT1100/24.06.2025
2	15.05.2025	02/ Nota Constatate	23 - Tautii Magheraus	OUT1101/24.06.2025
3	15.05.2025	03/ Nota Constatate	Unirii - Recea	OUT1119/25.06.2025
4	15.05.2025	04/ Nota Constatate	Stadionului -Recea	OUT1213/07.07.2025
5	15.05.2025	05/ Nota Constatate	Crinilor -Recea	OUT1184/03.07.2025
6	15.05.2025	06/ Nota Constatate	Daliei - Recea	OUT1230/08.07.2025
7	02.06.2025	07/ Nota Constatate	Islazului - Baia Sprie	nu
8	03.06.2025	08/ Nota Constatate	1 Decembrie - Mocira	OUT1185/03.07.2025
9	03.06.2025	09/ Nota Constatate	Stadionului - Mocira	OUT1214/07.07.2025
10	03.06.2025	10/ Nota Constatate	Ghiocailor - Mocira	OUT1190/03.07.2025
11	03.06.2025	11/ Nota Constatate	Scolii - Mocira	OUT1192/03.07.2025
12	03.06.2025	12/ Nota Constatate	67 - Tautii Magheraus	OUT1344/18.07.2025
13	03.06.2025	13/ Nota Constatate	113 - Tautii Magheraus	OUT1268/11.07.2025
14	03.06.2025	14/ Nota Constatate	114 - Tautii Magheraus	OUT1232/08.07.2025
15	03.06.2025	15/ Nota Constatate	133A - Tautii Magheraus	OUT1233/08.07.2025
16	03.06.2025	16/ Nota Constatate	133B - Tautii Magheraus	OUT1234/08.07.2025
17	03.06.2025	17/ Nota Constatate	57 - Tautii Magheraus	OUT1269/11.07.2025
18	03.06.2025	18/ Nota Constatate	58 - Tautii Magheraus	OUT1270/11.07.2025
19	03.06.2025	19/ Nota Constatate	26 - Tautii Magheraus	OUT1271/11.07.2025
20	04.08.2025	20/Nota Constatate	Aleea Minerilor -Baia Sprie	OUT1715/04.09.2025
21	05.08.2025	21/Nota Constatate	str. Decebal - Baia Sprie	OUT1715/04.09.2025

22	11.08.2025	22/Nota Constatare	Str. Calinisia -Recea	nu
23	12.08.2025	23/Nota Constatare	Str.54 -Tautii Magheraus	nu
24	12.03.2026	24/Nota Constatare	str. Lacului - Baia Sprie-canal	nu
25	12.03.2026	25/Nota Constatare	str. Lacului - Baia Sprie-apa	nu
26	12.03.2026	26/Nota Constatare	str. Avram Iancu - Baia Sprie - canal	nu
27	12.03.2026	27/Nota Constatare	str. Nicolae Balcescu - Baia Sprie - canal	nu
28	12.03.2026	28/Nota Constatare	str. Nicolae Balcescu - Baia Sprie - apa	nu
29	23.03.2026	29/Nota Constatare	str. Microraion Vest - Baia Sprie - canal	nu
30	23.03.2026	30/Nota Constatare	str. Minerilor - Baia Sprie - canal	nu
31	23.03.2026	31/Nota Constatare	Str. Ghiocelului - Baia Sprie - canal	nu
32	23.03.2026	32/Nota Constatare	Str. Ghiocelului - Baia Sprie - apa	nu
33	26.03.2026	33/Nota Constare	str. Unirii_1-Mocira - canal	nu
34	26.03.2026	34/Nota Constatare	Str. Aeroportului_1 - Recea - canal	nu
35	26.03.2026	35/Nota Constatare	str. Aeroportului_3 -Recea - canal	nu
36	26.03.2026	36/Nota Constatare	str. Trandafirilor_2 -canal si refulare	nu

Revendicari

N R. C R T	Adresa	Subiect	Raspuns
1	MM01VTL24-XLVII-370 din 05.09.2025	Notificare de revendicare nr. 1 - Aleea Minerilor si Decebal - Baia Sprie.	OUT1927/03.10.2025 - Respingere Notificare de revendicare nr.1 Aleea Minerilor si Decebal
2	MM01VTL24-XLVII-416 din 14.10.2025	Dezacord și solicitare reanalizare adresă OUT 1927 din 03.10.2025- Respingere Notificare de revendicare nr. 1.	
3	MM01VTL24-XLVII-437 din 31.10.2025	Notificare de revendicare nr 2 - Aleea Minerilor si Decebal - Baia Sprie	
4	MM01VTL24-XLVII-497 din 28.11.2025	Revendicare nr.2 – interimară I – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie, lista D-2.2-1 - Reabilitare rețea canalizare Aleea Minerilor și D-2.2-3 – Reabilitare rețea canalizare strada Decebal.	
5	MM01VTL24-XLVII-566 din 29.12.2025	Revendicare nr.2 – interimară II – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie.	
6	MM01VTL24-XLVII-586 din 29.01.2026	Revendicare nr.2 – interimară III – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie, lista D-2.2-1 - Reabilitare rețea canalizare Aleea Minerilor și D-2.2-3 – Reabilitare rețea canalizare strada Decebal.	
7	MM01VTL24-XLVII-634 din 27.02.2026	Revendicare nr.2 – interimară IV – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie.	
8	MM01VTL24-XLVII-746 din 23.04.2026	Notificare de revendicare nr. 4 în conformitate cu prevederile Clauzei 69a.1-Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie.	

9	MM01VTL24-XLVII-761 din 29.04.2026	Revendicare nr.2 – interimara VI la nr 2 - Aleea Minerilor si Decebal - Baia Sprie	
10	MM01VTL24-XLVII-807 din 15.05.2026	Notificare de revendicare nr. 5	
11	MM01VTL24-XLVII-817 din 20.05.2026	Notificare de revendicare nr. 6.	
12	MM01VTL24-XLVII-820 din 22.05.2026	Revendicare nr.4, interimară I– Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie, lista D-2.2-6 - Reabilitare rețea canalizare Micraion Vest	
13	MM01VTL24-XLVII-829 din 29.05.2026	Revendicare nr. 2 interimară VII la nr. 2 - Aleea Minerilor și Decebal - Baia Sprie.	
