

Contract de Lucrari

Nr.232/10.10.2024

MM-CL-07 — Retele de apa si apa uzata: Tautii
Magheraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti

Valoarea Contractului: **124.476.986,58 lei, exclusiv TVA**

Beneficiar: **Vital SA**

Antreprenor: **Asocierea Euskadi si Antrepriza Montaj Instalatii SRL**



Datele Contractului

- Semnare Contract: 10.10.2024
- Ordin Începere: 08.01.2025
- Durata Contractului : 30 luni
- Perioada de Garantie : 60 luni

Antreprenor : **Asocierea Euskadi SA si Antrepriza Montaj Instalatii SRL**

Subcontractori : **Euskaltel SRL
Radvior-Com SRL
Tautii Iuga SRL
Xallo Tehnic SRL**

Centralizatorul Investitiei

Lucrari UAT BAIA SPRIE

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT Baia Sprie		
Sub-obiect 1.1	Reabilitare conducta de aductiune apa bruta	L = 488 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila	L = 3203 m, PEID PE100 PN10; De 400 mm
Sub-obiect 1.3	Reabilitare retelei de distributie apa potabila	L = 4771 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 1.4	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 4210 m, PEID PE100 PN10+16; De 110+160+280 mm
Sub-obiect 1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila	L = 3962 m, PEID PE100 PN10; De 110+125+160 mm
Sub-obiect 1.6	Statie de pompare apa	Grup pompare (2A+1R), Qp = 10 l/s, Hp=45 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 10 l/s, Hp=125 mCA; Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
		Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=60 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=70 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m
Sub-obiect 1.7	Monitorizare si control hidraulic sistem apa	8 buc
Sub-obiect 1.8	Gospodarii de apa Baia Sprie	2 buc

OBIECT 2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE DIN UAT BAIA SPRIE		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea de canalizare	L = 11207 m, PVC SN8; De 250 mm;
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea de canalizare	L = 6607 m, PVC SN8; Dn 250 mm+Dn 315 mm;
Sub-obiect 2.3	Statie de pompare apa uzata	SPAU1: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 10,0 m, Lref = 146 m, PEID, De 110 mm SPAU2: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 20,0 m, Lref = 291 m, PEID, De 110 mm SPAU3: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 12,0 m, Lref = 146 m, PEID, De 110 mm SPAU4: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 15,0 m, Lref = 258 m, PEID, De 110 mm SPAU5: 1A+1R, Q = 5.0 l/s, Hp = 10,0 m, Lref = 187 m, PEID, De 110 mm SPAU6: 1A+1R, Q = 6.0 l/s, Hp = 26,0 m, Lref = 526 m, PEID, De 110 mm

Lucrari UAT SISESTI

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT Sisesti		
Sub-obiect 1.1	Extindere conducte de transport apa potabila	L = 1996 m, PEID PE100 PN10; De 280 mm
Sub-obiect 1.2	Extinderea retelei de distributie apa potabila	L = 21595 m, PEID PE100 PN10; De 110+250+280 mm
Sub-obiect 1.3	Statie de pompare apa potabila	Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=60 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m Grup pompare (2A+1R), Qp = 20 l/s, Hp=70 mCA Dimensiuni constructie: 5,0 x 2,5 x 2,5 m
Sub-obiect 1.4	Monitorizare si control hidraulic sistem apa Sisesti	1 buc

Lucrari TAUTII MAGHERAUS

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT TM-1 - EXTINDEREA RETELEI DE APA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-1.1	Extindere retelei de distributie apa potabila Tautii Magheraus	L = 5.464 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT TM-2 -EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-1.2	Statie de pompare apa potabila Tautii Magheraus	1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 8.34 l/s, Hp=30 m
Sub-obiect TM-1.3	Extindere retelei de distributie apa potabila Merisor	L = 345 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.4	Extindere retelei de distributie apa potabila Busag	L = 79 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.5	Extindere retelei de distributie apa potabila Baita	L = 1.301 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-1.6	Statie de pompare apa potabila Baita	1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.2 l/s, Hp=44 m, 1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.4 l/s, Hp=29 m, 1 buc - Grup pompare (1A+1R), Q = 5.4 l/s, Hp=38 m,
Sub-obiect TM-1.7	Monitorizare si control hidraulic sistem apa Tautii Magheraus	1 buc
OBIECT TM-2 -EXTINDEREA RETELEI DE APA UZATA DIN UAT TAUTII MAGHERAUS		
Sub-obiect TM-2.1	Extindere retea de canalizare Tautii Magheraus	L = 4.683 m, PVC SN8; De 250 mm
Sub-obiect TM-2.2	Statie de pompare apa uzata Tautii Magheraus	1 buc - 1A+1R, Q = 1.31 l/s, Hp = 5,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 169 m, PEID, De 110 mm, 1 buc - 1A+1R, Q = 0.87 l/s, Hp = 7,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 220 m, PEID, De 110 mm
Sub-obiect TM-2.3	Conducte de refulare SPAU Tautii Magheraus	L = 389 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect TM-2.4	Extindere retea de canalizare Busag	L = 502 m, PVC SN8; De 250 mm
Sub-obiect TM-2.5	Statie de pompare apa uzata Busag	1 buc - 1A+1R, Q = 1.22 l/s, Hp = 7,0 m, P = 1,5 kW, Lref = 368 m, PEID, De 110 mm
Sub-obiect TM-2.6	Conducte de refulare SPAU Busag	L = 368 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm

Lucrari UAT RECEA

OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
OBIECT 1 - Retele de distributie apa potabila in localitatea Recea		
Sub-obiect 1.1	Extindere retea alimentare apa	L = 1184 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT 2 - Retele de distributie apa in localitatea Mocira		
Sub-obiect 2.1	Extindere retea alimentare apa	L = 777 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
Sub-obiect 2.2	Reabilitare retea alimentare apa	L = 1943 m, PEID PE100 PN10; De 110 mm
OBIECT 3 – Retele de canalizare menajera in localitatea Recea		
Sub-obiect 3.1	Infiintare retea de canalizare	L = 8489 m, PVC SN8; De 250 mm
OBIECT 4 – Retele de canalizare menajera in localitatea Mocira		
OBIECT	LUCRARI PROIECTATE	CANTITATE/CARACTERISTICI
Sub-obiect 4.1	Infiintare retea de canalizare	L = 9191 m, PVC SN8; De 250 mm
OBIECT 5 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Recea		
Sub-obiect 5.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 6398 m, PEID PE100 PN6; De 90 si 200 mm
OBIECT 6 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Mocira		
Sub-obiect 6.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 2078 m, PEID PE100 PN6; De 90 si 110 mm
OBIECT 7 – Conducte de refulare apa uzata in localitatea Sasar		
Sub-obiect 7.1	Conducte de refulare apa uzata	L = 3362 m, PEID PE100 PN6; De 110 mm
OBIECT 8 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Recea		
Sub-obiect 8.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 1 - 1A+1R, Q = 25.0 l/s, Hp = 70 m SPAU 2 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 30 m SPAU 3 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 4 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 15 m SPAU 5 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 6 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 25 m SPAU 7 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 23 m SPAU 8 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 12 m
OBIECT 9 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Mocira		
Sub-obiect 9.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 2 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 3 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 13 m SPAU 4 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 5 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m SPAU 6 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 12 m SPAU 7 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 17 m SPAU 8 - 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 16 m
OBIECT 10 - Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Sasar		
Sub-obiect 10.1	Statii pompare ape uzate	SPAU 1 - 1A+1R, Q = 10.0 l/s, Hp = 49 m

Documente Antreprenor

Denumire Document	Data Depunere	Data Aprobare
Inaintare Plan General de Securitate și ăănătate	28.01.2025	26.03.2025
Inaintare Plan de Management al mediului	28.01.2025	04.04.2025
Inaintare Plan de Management al Traficului	28.01.2025	28.03.2025
Inaintare Plan de Asigurare a Calit, Plan de control al Calitatii	28.01.2025	17.03.2025
Inaintare spre aprobare Organigrama Antreprenorului	03.02.2025	21.02.2025
Solicitare aprobare Program de execuție	07.02.2025	20.02.2025
Inaintare in vederea aprobarii personalului specializat si auxiliar pentru ridicari si planuri topografice	10.02.2025	14.04.2025
Înaintare Asigurări	19.02.2025	14.04.2025
Transmitere Asigurări de răspundere civilă auto	14.03.2025	14.04.2025
Înaintare spre aprobare documente tehnice privind Organizarea de Șantier.	14.03.2025	04.04.2025
Inaintare plan de management social	23.06.2025	23.07.2025

Avize IPJ

Aviz IPJ	nr.124058 din 01.04.2025	Recea	Localitatea Mocira <ul style="list-style-type: none"> • Unirii intre Ulita Mare si Crinilor • Crinilor intre Unirii si Trandafirilor • 1 Decembrie intre Stadionului si Ghiocelilor • Ghiocelilor intre 1 Decembrie si final de strada 1 Decembrie Localitatea Recea <ul style="list-style-type: none"> • Ulita Mare intre Unirii si Aeroportului • Aeroportului intre Ulita Mare si Alea Mocirii • Stadionului intre Europa DN1C si Florilor Localitatea Sasar <ul style="list-style-type: none"> • Morii intre statia de epurare si 1 Decembrie • 1 Decembrie intre Morii si Garii • Garii intre 1 Decembrie si Traversare cale ferata • Daliei intre traversarea caii ferate si Viilor
Aviz IPJ	nr.124057 din 01.04.2025	Tautii Magheraus	Tautii Magheraus <ul style="list-style-type: none"> • Strada 67 ,22, 23, 54, 57, 58 Busag • Strada 113 , 114 Merisor <ul style="list-style-type: none"> • Strada 133A, 133B
Aviz IPJ	nr. 381604 din 09.04.2025	Baia Sprie	<ul style="list-style-type: none"> • Alea Minerilor , intre Gutinului DN18 si liceul Auto • strada Decebal , intre alea Minerilor si Dragos Voda • strada Pietrosului • strada Olarilor intre Microraion Vest si Gutinului DN 18 • strada 1 Mai • strada Sperantei • strada Islazului
Aviz IPJ	nr. 383787 din 27.07.2025	Baia Sprie	Magnoliei, Mihai Eminescu, Salcamilor, Tudor Vladimirescu, Strabunilor, Ignisului, Morii, Garii, Gordanului, Pietrarului, Ghiocelului

Avize IPJ

Aviz IPJ	nr. 127007 din 28.07.2025	Tautii Magheraus	153,30,33,38,36,45,41,40,37,84,86,82,39
Aviz IPJ	nr. 384452 din 22.08.2025	Sisesti	5,8,9,17,18 Surdesti 21,26 Sisesti
Aviz IPJ	nr. 389724 din 06.11.2025	Sisesti	22,37,12 Sisesti
Aviz IPJ	nr. 129591 din 17.11.2025	Tautii Magheraus	UAT Tautii Magheraus
Aviz IPJ	nr. 389970 din 15.11.2025	Baia Sprie	Str. Pietrosului, Alea Minerilor, Decebal, Olarilor, 1 Mai, Sperantei si Dragos Voda.
Aviz IPJ	nr.129592 din 17.11.2025	Recea	UAT Recea

Avize Spargere

Aviz Spargere	nr. 33 din 03.04.2025	Tautii Magheraus	Tautii Magheraus <ul style="list-style-type: none"> • Strada 22, 23, 54, 58 Busag • Strada 113 , 114 Merisor <ul style="list-style-type: none"> • Strada 133A, 133B
Aviz Spargere	nr. 27 din 07.04.2025	Recea	Acord amplasare in zona
Aviz Spargere	nr.3223 din 11.04.2025	Baia Sprie	<ul style="list-style-type: none"> • Aleea Minerilor , intre Gutinului DN18 si liceul Auto • strada Decebal , intre aleea Minerilor si Dragos Voda • strada Pietrosului • strada Olarilor intre Microraion Vest si Gutinului DN 18 • strada 1 Mai • strada Sperantei • strada Islazului
Aviz Spargere	nr. 86 dinn 22.05.2025	Tautii Magheraus	strazile 67, 25 , 26 ,113 , 114 ,57
Aviz Spargere	nr. 6066 din 28.07.2025	Baia Sprie	Magnoliei, Mihai Eminescu, Salcamilor, Tudor Vladimirescu, Strabunilor, Ignisului, Morii, Garii,Gordanului,Pietrarului,Ghiocelului
Aviz Spargere	nr. 134 din 07.08.2025	Tautii Magheraus	153,30,33,38,36,45,41,40,37,84,86,82,39
Aviz Spargere	nr. 1 din 04.09.2025	Sisesti	5,8,9,17,18 Surdesti / 21,26 Sisesti
Aviz Spargere	nr. 2 din 11.11.2025	Sisesti	3,4 Danesti / 22,37,12 Surdesti

Predari Amplasament

NR.	Tip document	Nr. și data procesului-verbal	UAT	Străzi predate
1	Predare amplasament	nr. 1 din 25.04.2025	Tăuții Măgherăuș	str. 54 str. 22 si str.23
2	Predare amplasament	nr. 1 din 25.04.2025	Recea	Localitatea Recea : str. Stadionului si str. Daliei Localitatea Mocira: str.Unirii si str. Crinilor Localitatea Sasar: str.Daliei
3	Predare amplasament	nr. 2 din 19.05.2025, OUT766/19.05.2025	Baia Sprie	Aleea Minerilor (între DN18 - Str. Gutinului și Liceul Auto Baia Sprie), -Str. Decebal (între Aleea Minerilor și Str. Dragoș Vodă), Str. Pietrosului, - Str. Olarilor (între Str. Microraiion Vest și DN18 Str. Gutinului)Str. 1 Mai, Str. Speranței, Str. Islazului
4	Predare amplasament	nr. 3 din 21.05.2025, OUT804/21.05.2025	Tăuții Măgherăuș	UAT Tautii Magheraus
5	Predare amplasament	nr. 4 din 22.05.2025, OUT821/22.05.2025	Recea	Localitatea Mocira: Str. 1 Decembrie, Str. Ghiocilor, Str. Stejarului, Str. Stadionului; Localitatea Recea: Str. Ulița Mare, Str. Aeroportului, Localitatea Sasar: Victoriei, Morii, 1 Decembrie, Garii
6	Predare amplasament	nr. 5 din 01.07.2025, OUT 1169/ 01.07.2025	Recea	Localitatea Recea : Aleea Mocirii

Predari Amplasament

7	Predare amplasament	nr. 6 din 15.07.2025, OUT1308/15.07.2025	Baia Sprie	str. Aleea Minerilor, str. Decebal
8	Predare amplasament	nr. 7 din 29.07.2025, OUT1308/15.07.2026	Baia Sprie	str. Mihai Eminescu, Salcamilor, Ignisului, Ghiocelului
9	Predare amplasament	nr. 8 din 06.08.2025, OUT1466/06.08.2026	Baia Sprie	Str. Morii,str. Pietrarului,str.Magnoliei str. Gordanului
10	Predare amplasament	nr.9 din 28.08.2025 OUT1659/28.08.2025	Tautii Magheraus	Str. 30,36,37,38,39,40,41
11	Predare amplasament	nr. 10 din 09.09.2025 OUT1735/09.09.2025	Sisesti	Str. 5,8,9,17,18 (Surdesti) Str. 21,26 (Sisesti)
12	Predare amplasament	nr. 12 din 29.10.2025 OUT2201/29.10.2025	Baia Sprie	Tudor Vladimirescu ,Dragos Voda_1,Dragos Voda_2
13	Predare amplasament	nr. 12 din 29.10.2025 OUT2262/04.11.2025	Recea	Str. Unirii

Derularea Contractului

Ordin Incepere : 08.01.2025

- Autorizatie de Construire nr.4 din 21.02.2025 – primita in 26.02.2025
- FAM-uri depuse pentru aprobare

Aprobate : 44

Respinse:11

In lucru : 2

Drept Acces Santier : 19.03.2025

Incepere Lucrari : 05.05.2025

Situatia Financiara

In data de 25.10.2024 prin Adresa MM01-VTL24-XLVII-05 din 25.10.2024 s-a Inaintat Garantia de Buna Executie cu nr de inregistrare si transmitere email.


Sumarul Progresului Financiar (%) – estimat valoric si actualizat conform Fluxului de numerar din data de 28.02.2026

Progres [%] si [Lei]			Timp trecut	
Prevazut	Actual	Nerealizat (-) Depasiri (+) (+)	Luni	[%]
Anterior				
0.00	0.00	0.00	13	43%
0.00%	0.00%	0.00%		
In perioada de raportare				
5.514.572,47	5.388.499,41	-126.073,06	1	3.33%
4.52%	4.41%	0.11%		
Cumulat				
5.514.572,47	5.388.499,41	-126.073,06	14	46.33%
4.52%	4.41%	0.11%		

Curba "S"



Valoare estimata

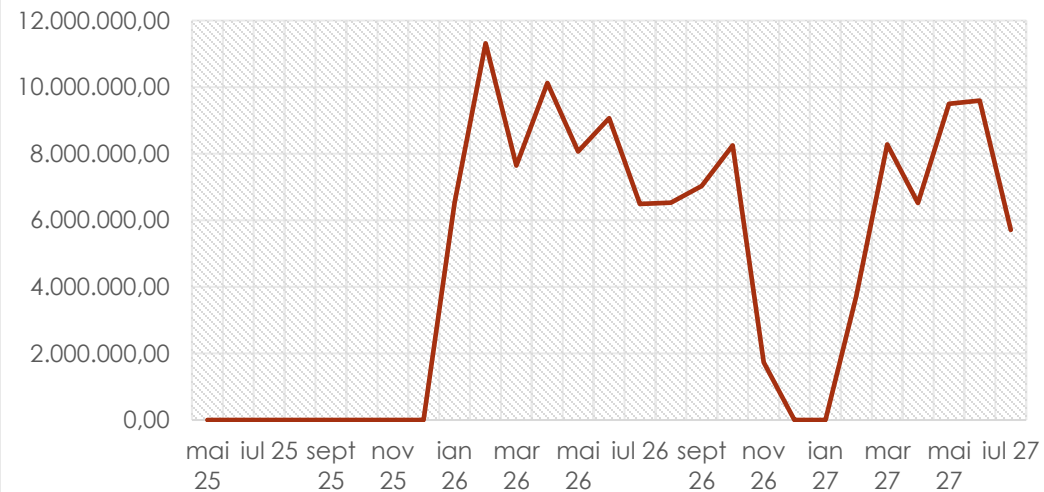



Organizarea Santierului

➤ Obținerea terenului:

Hotărârea Consiliului Local Recea – HCL nr.13 din 27.02.2025

➤ Proiectarea organizării santier:

Aprobarea DTOE prin adresa OUT 505/04.04.2025

➤ Obținerea Autorizației de Construire

Certificat de Urbanism nr.312 din 10.03.2025

Autorizația de Construire nr. 99 din 14.04.2025

➤ Recepția Organizării de Santier

La data de 20.05.2025, s-a întocmit Procesul verbal de recepție calitativă lucrări nr. 181, cu ocazia verificărilor efectuate la organizarea de santier Recea. Acesta a fost înregistrat la Antreprenor cu nr. MM01/VTL24-XLVII-188 din 21.05.2025.

Detalii si activitati in luna de raportare : FEBRUARIE 2026



In luna februarie nu s-au desfasurat activitati in teren, ca urmare a suspendarii temporare a lucrarilor, situatie care a fost comunicata anterior prin adresele oficiale MM01VTL24-XLVII-557 din 16.12.2025- Informare privind intreruperea temporara a activitatii in perioada 19.12.2025 – 12.01.2026 si MM01VTL24-XLVII-584 din 28.01.2026-Raspuns adresa RCE-MM-CL07-003 din 27.01.2026 -reluarea executiei lucrarilor pe santier transmise Beneficiarului si Supervizorului. Reluarea activitatilor a fost anuntata prin adresa MM01VTL24-XLVII-625 din 24.02.2026-Informare reluare activitate inaintata catre Supervizor cu data de reluare activitate 02.03.2026.



Utilaje pe santier

- Autocamion UMT AMT 125
- Buldoexcavatoare JCB 3CX
- Excavatoare Takeuchi 5T, 9T, 10T
- Bobcat, Dumpere, Camioane 8x4

Total: 32 utilaje asigurate și asigurate conform clauzei 16.2B

Personal pe santier

Nr. Crt	Denumire	Numar
1	Sef Santier	1
2	Ingineri Santier	2
3	Ingineri Topografi	2
4	Sef Echipa	6
5	Muncitori Calificati - Instalatori	6
6	Muncitori Necalificati	36

- Interval orar: 07:30 – 17:30
- Zilele de weekend: fără activitate



Aspecte de protectia mediului.

In perioada raportata nu s-au inregistrat incidente de mediu sau reclamatii, iar toate masurile de prevenire si monitorizare au fost implementate conform Planului de Management al Mediului.

Monitorizarea mediului a fost realizata in mod corespunzator, fara a identifica neconformitati.

Alte aspecte

Probleme constatate (27 note)

Nr.Crt	Data Document	Denumire Document	Strada Vizata	Raspuns
1	15.05.2025	01/ Nota Constatatare	22 - Tautii Magheraus	OUT1230/08.07.2025
2	15.05.2025	02/ Nota Constatatare	23 - Tautii Magheraus	OUT 1100/24.06.2025
3	15.05.2025	03/ Nota Constatatare	Unirii - Recea	nu
4	15.05.2025	04/ Nota Constatatare	Stadionului -Recea	OUT 1101/24.06.2025
5	15.05.2025	05/ Nota Constatatare	Crinilor -Recea	Out 1184/03.07.2025
6	15.05.2025	06/ Nota Constatatare	Daliei - Recea	OUT 1119/25.06.2025
7	02.06.2025	07/ Nota Constatatare	Islazului - Baia Sprie	nu
8	03.06.2025	08/ Nota Constatatare	1 Decembrie - Mocira	OUT 1185/03.07.2025
9	03.06.2025	09/ Nota Constatatare	Stadionului - Mocira	nu
10	03.06.2025	10/ Nota Constatatare	Ghiocailor - Mocira	OUT 1190/03.07.2025
11	03.06.2025	11/ Nota Constatatare	Scolii - Mocira	OUT1185/03.07.2025
12	03.06.2025	12/ Nota Constatatare	67 - Tautii Magheraus	nu
13	03.06.2025	13/ Nota Constatatare	113 - Tautii Magheraus	OUT1268/11.07.2025
14	03.06.2025	14/ Nota Constatatare	114 - Tautii Magheraus	OUT1232/08.07.2025
15	03.06.2025	15/ Nota Constatatare	133A - Tautii Magheraus	OUT1233/08.07.2025
16	03.06.2025	16/ Nota Constatatare	133B - Tautii Magheraus	OUT1234/08.07.2025
17	03.06.2025	17/ Nota Constatatare	57 - Tautii Magheraus	OUT1269/11.07.2025
18	03.06.2025	18/ Nota Constatatare	58 - Tautii Magheraus	OUT1270/11.07.2025
19	03.06.2025	19/ Nota Constatatare	26 - Tautii Magheraus	OUT1271/11.07.2025
20	04.08.2025	20/Nota Constatatare	Aleea Minerilor -Baia Sprie	OUT1911/02.10.2025
21	05.08.2025	21/Nota Constatatare	str. Decebal - Baia Sprie	OUT1911/02.10.2025
22	14.08.2025	22/Nota Constatatare	str. Mihai Eminescu	
23	14.08.2025	23/Nota Constatatare	str. Gordanului - Baia Sprie	
24	21.08.2025	24/Nota Constatatare	str. Pietrarului - Baia Sprie	
25	21.08.2025	25/Nota Constatatare	str. Garii - Baia Sprie	
26	22.08.2025	26/Nota Constatatare	str. Magnoliei - ext apa Baia Sprie	
27	22.08.2025	27/Nota Constatatare	str. Magnoliei - ext canal Baia Sprie	

Revendicari

NR. CRT	Adresa	Subiect	Raspuns
1	MM01VTL24-XLVII-370 din 05.09.2025	Notificare de revendicare nr. 1 - Aleea Minerilor si Decebal - Baia Sprie.	OUT1927/03.10.2025 - Respingere Notificare de revendicare nr.1 Aleea Minerilor si Decebal
2	MM01VTL24-XLVII-416 din 14.10.2025	Dezacord și solicitare reanalizare adresă OUT 1927 din 03.10.2025-Respingere Notificare de revendicare nr. 1.	
3	MM01VTL24-XLVII-437 din 31.10.2025	Notificare de revendicare nr 2 - Aleea Minerilor si Decebal - Baia Sprie	
4	MM01VTL24-XLVII-497 din 28.11.2025	Revendicare nr.2 – interimară I – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie, lista D-2.2-1 - Reabilitare rețea canalizare Aleea Minerilor și D-2.2-3 – Reabilitare rețea canalizare strada Decebal.	
5	MM01VTL24-XLVII-566 din 29.12.2025	Revendicare nr.2 – interimară II – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie.	
6	MM01VTL24-XLVII-586 din 29.01.2026	Revendicare nr.2 – interimară III – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie, lista D-2.2-1 - Reabilitare rețea canalizare Aleea Minerilor și D-2.2-3 – Reabilitare rețea canalizare strada Decebal.	
7	MM01VTL24-XLVII-634 din 27.02.2026	Revendicare nr.2 – interimară IV – Lipsă soluții de execuție în UAT Baia Sprie.	
